

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2021

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2025

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de Agosto de 2021 del Contrato de Obra SDM 2021-2025 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL BOGOTÁ y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto ***“REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”*** LOTE 7 - ZONA SUR-OCCIDENTE.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de agosto del año 2021 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con Interventoría SDM-2021-2018 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.


Objetivos Específicos Del Informe

- Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con corte al 30 de agosto de 2021, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.
- Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de agosto de 2021 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2025

A continuación, se muestran la localización y los principales datos del contrato y las modificaciones y ajustes realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de agosto de 2021.

Figura 1. Localización y localidades zona 7 - Sur-occidente

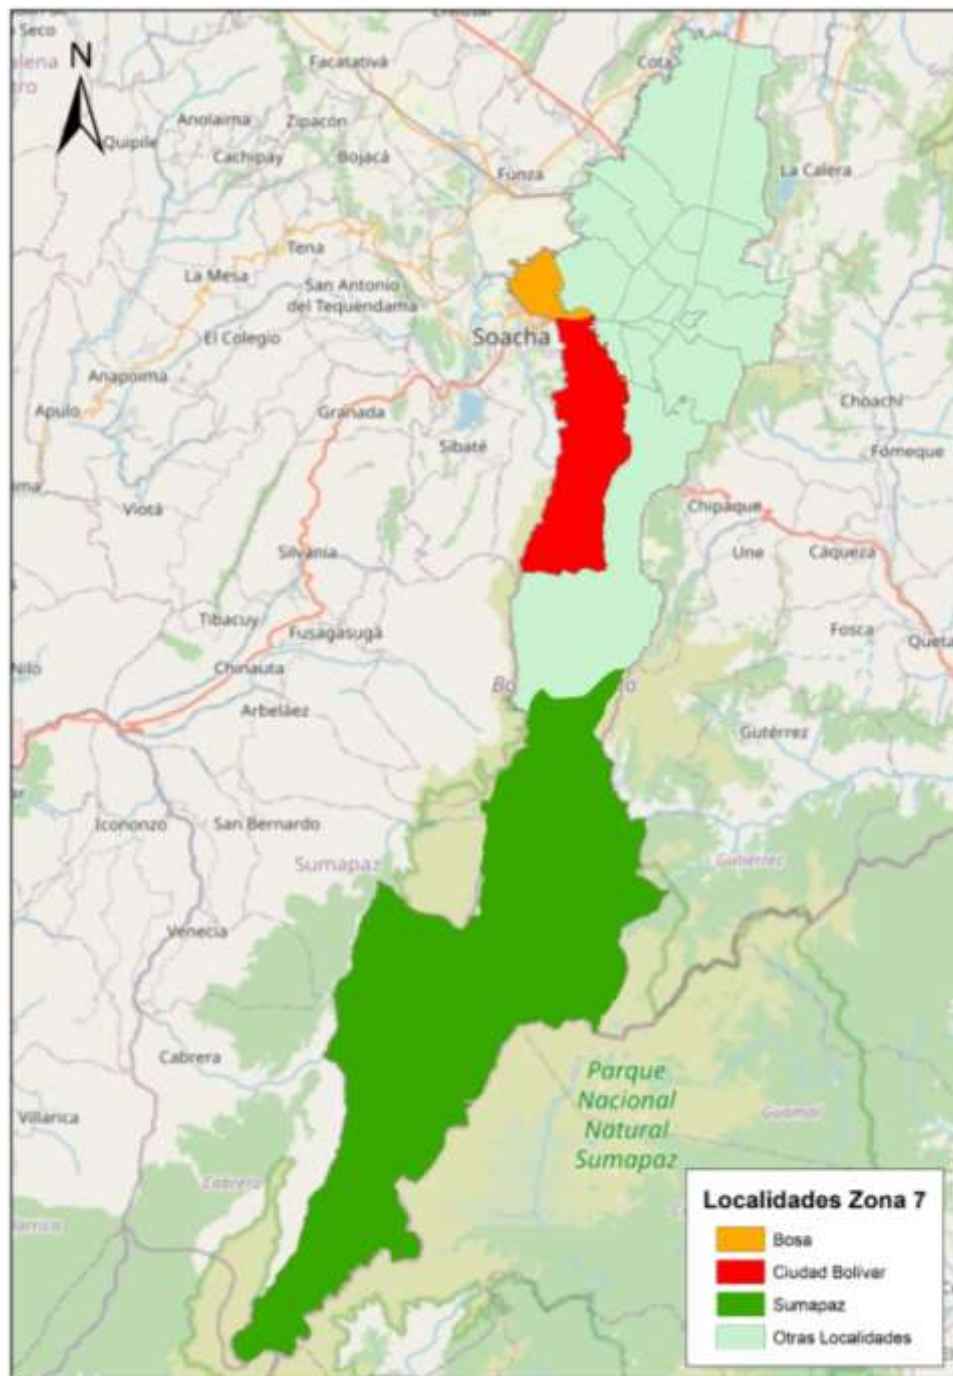

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATO No.	SDM-2021-2025			
OBJETO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 7- ZONA SUR-OCCIDENTE.			
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDPs			
	No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA
	1224	23/02/2021	\$ 19.810.000.000,00	2021
	12	12/03/2021	\$ 26.248.317.500,00	2022
	13	12/03/2021	\$ 26.248.317.500,00	2022
	12	12/03/2021	\$ 26.248.317.500,00	2023
	13	12/03/2021	\$ 26.248.317.500,00	2023
CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	RPs			
	No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA
	1921	28/07/2021	\$ 2.829.999.937	2021
	20	28/07/2021	\$ 7.499.519.218	2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	20	28/07/2021	\$ 7.499.519.195	2023
	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.			
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2025.			
FECHA DE INICIACIÓN:	12 de Agosto de 2021			
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de enero de 2024			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL BOGOTÁ			
IDENTIFICACION:	NIT: 901.500.183-3			
INTERVENTORIA	CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021 CONTRATO SDM-2021-2018			

Fuente: Elaboración propia

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): **LOTE 7 - ZONA SUR-OCCIDENTE.**

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Página 3 de 6

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2025 corresponde al 12 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de agosto de 2021; desde la SDM-DTI-SS se asignó a través del Contrato de Interventoría SDM-2021-2018 la implementación de los ID relacionados en la **Tabla 2** y el Corredor vial de la Autopista Sur desde KR 77C Sur hasta KR 52 Sur que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre las vías de estos proyectos.

Tabla 2. Relación ID diseños asignados para implementación el 12 de agosto de 2021

ÍTEM	ID	NOMBRE COLEGIO	DIRECCION	LOCALIDAD
1	EX_07_205_1244_11	Liceo Moderno Betania	KR 87 con CL 51B-36 Sur	Bosa
		Jardín Infantil Universo Mágico delos Exploradores	KR 86F No. 51B-04 Sur	
2	EX_07_038_1561_10	Colegio Carlos Pizarro	CL 73 Sur entre KR 100 y KR 104	Bosa
		Jardín Infantil Pasitos de Gigante	KR 99 A N° 71 Sur - 39	
3	EX_07_207_1244_11	Colegio Liceo Mixto Los Centauros	KR 87M N° 61A – 84 Sur	Bosa
4	EX_19_219_1867_12	Colegio Distrital Ismael Perdomo, Instituto Orestes Sindici	KR 71 F entre DG 62G S hasta CL 64A S	Ciudad Bolívar
5	EX_19_386_1561_10	Colegio Rogelio Salmona	CL 66 Sur con CL 59	Ciudad Bolívar
6	MV_19_080_1561_10_V7	Colegio Rural Pasquilla IED Sede Bachillerato	TV3 3-19	Sumapaz
		Colegio Rural Pasquilla Sede Primaria	CL 4 # 2 - 18	Sumapaz
		Colegio Rural Pasquilla IED Sede C - Km 13 vía Pasquilla	Km 13 Vía Pasquilla	Sumapaz

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista corresponden con inspecciones, diagnósticos e implementación parcial de los ID EX_07_038_1561_10_V4 (Colegio Carlos Pizarro) y EX_19_219_1867_12 (Colegio Distrital Ismael Perdomo) de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-LP-033-2021 donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, aclarando que al 30 de agosto de 2021 aún no se han realizado pagos teniendo en cuenta que se dio inicio contractual el día 12 de agosto de 2021.

En razón de lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla 3. Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP
1224	23/02/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2021
12	12/03/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2022
13	12/03/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2022
12	12/03/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2023
13	12/03/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2023

CRP	FECHA	VALOR APROBADO POR VIGENCIA	VALOR TOTAL
1921	28/07/2021	\$ 2,829,999,937.00	\$ 2,829,999,937.00
20	28/07/2021	\$ 7,499,519,218.00	\$ 7,499,519,218.00
20	28/07/2021	\$ 7,499,519,195.00	\$ 7,499,519,195.00

Fuente: Elaboración propia

A continuación, y con corte al 30 de agosto de 2021, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 4. Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR CANCELADO	SALDO CRP
2021	1921	28/07/2021	\$2,829,999,937.00	\$0.00	\$ 2,829,999,937.00
2022	20	28/07/2021	\$7,499,519,218.00	\$0.00	\$ 7,499,519,218.00
2023	20	28/07/2021	\$7,499,519,195.00	\$0.00	\$ 7,499,519,195.00

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con lo anterior, en la **Tabla 5** se muestra el análisis financiero a corte del 30 de agosto de 2021 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla 5. Estado del Contrato con corte al 31 de agosto de 2021

ÍTEM	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	\$ 17,829,038,350.00
2	Valor Ejecutado	\$0.00
3	Saldo por Ejecutar	\$ 17,829,038,350.00
4	Valor pagado	\$0.00
5	Saldo CRP 1921	\$ 2,829,999,937.00
6	Saldo CRP 20	\$ 7,499,519,218.00
7	Saldo CRP 20	\$ 7,499,519,195.00

Fuente: Elaboración propia

6. CONCLUSIONES

Al corte del 30 de agosto de 2021, se realizó conjuntamente entre la Interventoría y el contratista la inspección, visita de obra y diagnóstico de los ID relacionados en la **Tabla 2** y el Corredor de la Autopista Sur desde KR 77C Sur hasta KR 52 Sur, con el fin de determinar las condiciones operativas, de infraestructura, geométricas, ambientales y todos aquellos factores que puedan afectar la correcta implementación y permanencia de la señalización en vía y la implementación parcial de los ID EX_07_038_1561_10_V4 (Colegio Carlos Pizarro) y EX_19_219_1867_12 (Colegio Distrital Ismael Perdomo), razón por la cual aún no se indican los avances correspondientes de obra, los cuales deberán ser reportados en los siguientes cortes mensuales.
