

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023

CONTRATO DE CONSULTORÍA SDM 2021-2486

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de junio de 2023 del Contrato de Consultoría SDM 2021-2486 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre HMV SERVICIOS SAS y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto "CONSULTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS INTEGRALES DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA 3 - ZONA SUR-OCCIDENTE.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de junio del año 2023 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Consultoría SDM-2021-2486 para realizar los diseños integrales de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial para la ciudad de Bogotá D.C.

Objetivos Específicos Del Informe

- Relacionar el avance del Contrato de Consultoría SDM-2021-2486 con corte al 30 de junio de 2023, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de consultoría técnica y administrativa para realizar los diseños integrales de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial para la ciudad de Bogotá D.C.
- Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de junio de 2023 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2486

A continuación, se muestran la localización y los principales datos del contrato y las modificaciones y ajustes realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de junio de 2023.

PA01-PR01-MD02 V.2.0



Página 1 de 15




El contrato de Consultoría 2021-2486 se desarrolla en la zona tres (03) Suroccidente, la cual se encuentra conformada por las localidades de Fontibón, Kennedy y Tunjuelito, tal como se observa en la **Tabla 1** y la **Figura 1**.

Tabla 1. Localidades de la zona 3 - Sur-occidente

ZONA		LOCALIDADES
3	Sur-Occidente	Tunjuelito, Kennedy, Fontibón

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Localización de las localidades zona 3 - Sur-occidente

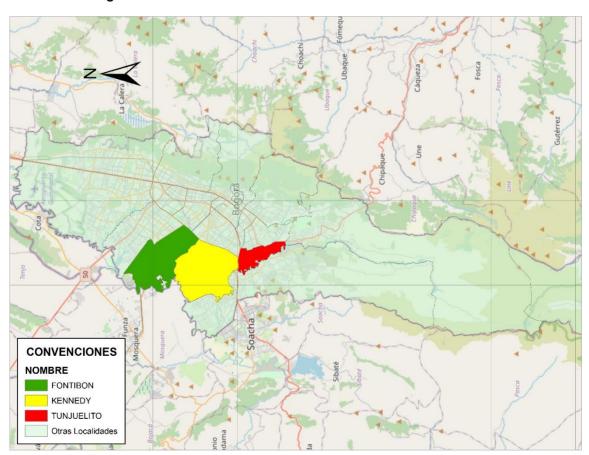

Fuente: Elaboración propia

PA01-PR01-MD01 V.2.0

ALCALDÍA MAYOR

Página 2 de15



Tabla 2. Datos del Contrato

CONTRATO No.	SDM-202	21-2486				
OBJETO	DISEÑO	S INTEGRALES	DE	ADMINISTRATIVA PARA E ELEMENTOS DE SEI DAD VIAL PARA LA CIUD <i>A</i>	ÑALIZACIÓN Y	
		CDPs				
CERTIFICADOS DE	No.	FECHA		VALOR	VIGENCIA	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2283	28/07/2021		\$ 849.530.885,00	2021	
PRESUPUESTAL.	23	30/07/2021		\$ 5.045.657.765,00	2022	
	23	30/07/2021		\$ 5.045.678.075,00	2023	
CERTIFICADOS DE		CI	OP A	CTUALIZADO 2022		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2022:	No.	FECHA		VALOR	VIGENCIA	
PRESUPUESTAL 2022.	7	04/01/2022		\$ 5.045.230.262.00	2022	
CERTIFICADOS DE		CI	OP A	CTUALIZADO 2023		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2023	No.	FECHA		VALOR	VIGENCIA	
PRESUPUESTAL 2023	22	01/01/2023		\$ 5.044.786.416.00	2023	
	RPs					
CERTIFICADOS DE REGISTRO	No.	FECHA		VALOR	VIGENCIA	
PRESUPUESTAL:	2457	17/11/2021		\$ 169.905.344	2021	
	35	17/11/2021		\$ 1.009.126.748	2022	
	35	17/11/2021		\$ 1.009.132.817	2023	
CERTIFICADOS DE REGISTRO	RP ACTUALIZADO 2022					
PRESUPUESTAL 2022:	No.	FECHA		VALOR	VIGENCIA	
	17	10/01/2022		\$ 1.009.126.748	2022	
CERTIFICADOS DE REGISTRO		R	PAC	CTUALIZADO 2023		
PRESUPUESTAL 2023:	No.	FECHA		VALOR	VIGENCIA	
	17	01/01/2023		\$ 1.009.132.817	2023	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	El valor del contrato es hasta por la suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS					
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTISEIS (26) MESES, contados a partir del acta de inicio. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2486.					
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de dio	ciembre de 2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de febrero de 2024					

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195



Página 3 de15



CONTRATISTA:	HMV SERVICIOS S.A.S.
IDENTIFICACION:	NIT: 901413091-1
MODIFICACIÓN No. 1	El 23 de diciembre de 2021 se realizó la suscripción de la Modificación No. 1 al contrato de Consultoría 2021-2486, dado que través de la Resolución 107858 del 25 de noviembre de 2021 la Entidad adjudicó el Contrato al oferente HMV PROYECTOS S.A.S. (Lote 3), sociedad absorbida con posterioridad por HMV SERVICIOS S.A.S., en adelante el "Consultor".

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-CMA-094-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s): **ZONA 3 - ZONA SUR-OCCIDENTE.**

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, al precio cotizado en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.

El Consultor se obliga a Elaborar diseños integrales de señalización en áreas o zonas de influencia correspondientes a la zona o lote TRES (3) SUR-OCCIDENTE, en los cuales se identifiquen, analicen y propongan dispositivos para la regulación del tránsito enfocados en mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial, prevenir incidentes viales y proteger a los usuarios más vulnerables en puntos críticos considerados de alta siniestralidad vial.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Consultoría SDM-2021-2486 corresponde al 23 de diciembre de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de junio de 2023; desde la SDM-DTI-SS se asignó a través del Supervisor Delegado por la SDM la actualización de los IDs relacionados en la *Tabla 3* que hacen parte de los IDs de diseño de las localidades que conforman la zona 3 Suroccidente.

Tabla 3. Relación IDs de diseños asignados para actualización al 30 de junio de 2023

FECHA DE ASIGNACIÓN	ID DISEÑO	HECTÁREAS
23/12/2021	EX_06_101_1244_11	30.31
23/12/2021	ZE_06_522_943_10	8.07
23/12/2021	EX_09_201_1881_12	5.36
23/12/2021	EX_09_195_1881_12	9.29

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Página 4 de15



FECHA DE ASIGNACIÓN	ID DISEÑO	HECTÁREAS
23/12/2021	EX_06_404_1561_10	13.7
23/12/2021	EX_08_304_1867_12	11.29
23/12/2021	EX_08_088_670_11	18.5
12/01/2022	EX 09 184 1249 11	83.23
12/01/2022	ZE 09 002 1214 15	8.22
12/01/2022	EX_08_287_1244_11	25.21
12/01/2022	EX_08_043_1556_10	43.62
21/01/2022	MV AV BOYACA 941 09 T2	97.96
03/03/2022	EX_09_035_1556_10	29.04
03/03/2022	EX_06_108_1867_12	7.54
29/03/2022	ZE 06 027 1561 10	10.13
29/03/2022	EX_06_015_1561_10	6.15
22/04/2022	EX 09 221 1881 12	28.3
22/04/2022	EX 08 323 943 10	20.12
22/04/2022	EX_08_303_1867_12	11.39
22/04/2022	EX 08 256 1244 11	28.49
22/04/2022	MV 08 270 1244 11	2
22/04/2022	EX_08_309_1867_12	10.85
22/04/2022	ZE_08_056_1556_10	14.6
22/04/2022	ZE 08 251 1744 10	3.3
22/04/2022	EX_06_115_1867_12	3.71
09/05/2022	MV_06_054_1561_10	17.76
03/06/2022	EX_08_334_1867_12	17.6
28/06/2022	MV_08_257_1244_11	72.37
18/07/2022	EX_08_343_1867_12	82.21
08/08/2022	EX_09_034_1556_10	26.05
08/08/2022	EX_08_310_1867_12	10.56
08/08/2022	EX_06_110_1867_12	58.25
08/08/2022	CPS_941_EM_19_111	21.17
25/08/2022	ZE_08_032	2
01/09/2022	SC_09_078	9.39
01/09/2022	EX_08_335_1867_12	8.35
01/09/2022	EX_08_295_943_10	4.83
01/09/2022	EX_08_455_943_10	12.59
26/09/2022	EX_09_017_1249_11	25.15
26/09/2022	TPD_PL_1383	25.79
26/09/2022	MV_08_260_1244_11	13.4
26/09/2022	EX_08_395_943_10	6.93
26/09/2022	MV_08_102_670_11	3.5
26/09/2022	MV_08_174_1703_10	13.73
20/12/2022	EX_09_185_1249_11	30.55
20/12/2022	EX_09_186_1249_11	9.4
20/12/2022	EX_09_219_1881_12	24.38
20/12/2022	EX_09_036_1556_10	12.61
20/12/2022	MV_08_039_1747_10	5.54
20/12/2022	EX_08_293_1244_11	3.57
20/12/2022	EX_06_097_1561_10	17.66
01/03/2023	EX_09_001_1214_15	7.44
01/03/2023	EX_08_339_1867_12	5.86
01/03/2023	CPS_937_MV_08_177	4.73
01/03/2023	EX_08_307_1867_12	5.74
01/03/2023	EX_08_299_943_10	10.1
01/03/2023	EX 08 279 1244 11	39.09
01/03/2023	EX 06 385 1561 10	18.39
01/00/2020		10.00

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195





FECHA DE ASIGNACIÓN	ID DISEÑO	HECTÁREAS
01/03/2023	MV_06_499_937_09	5.56
01/03/2023	MV_06_364_1561_10	3.46
01/03/2023	ZE_06_194_1561_10	2
16/03/2023	EX_08_301_1867_12	11.26
16/03/2023	EX_08_256_1744_10	11.86
16/03/2023	EX_08_348_1867_12	18.47
19/04/2023	ZE_06_150_1561_10	4.7
24/04/2023	EX_09_220_1881_12	9.89
24/04/2023	EX_09_187_1249_11	28.7
24/04/2023	EX_08_346_1867_12	10.14
24/04/2023	EX_08_313_1867_12	9.22
24/04/2023	ZE_08_050_670_11	2
24/04/2023	ZE_06_151_1561_10	2
16/05/2023	EX_08_302_1867_12	15.82
16/05/2023	MV_08_263_1244_11	17.36
02/06/2023	EX_09_032_1556_10	80.58
02/06/2023	MV_09_001_1214_15	16
02/06/2023	EX_08_314_1867_12	5.83
02/06/2023	CPS_937_ZE_08_160	17.27
02/06/2023	EX_08_318_1867_12	6.3
02/06/2023	EX_06_105_1867_12	7.24
02/06/2023	EX_06_93_1244_11	12.41
02/06/2023	MV_08_255_1244_11	20.84
	TOTAL	1478.86

Para la fecha de corte del periodo No. 18, los trabajos adelantados por el Contratista para la etapa 1 Inventario, la cual es la base requerida para la elaboración del diseño (etapa 2) de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-CMA-094-2021 donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes diseños de señalización vial, corresponden a la información relacionada en la *Tabla 4*.

Tabla 4. Relación IDs con Inventario aprobado por la SDM

FECHA DE ASIGNACIÓN	ID DISEÑO	HECTÁREAS	FECHA APROBACIÓN INVENTARIO	No. DE PLANOS	CUENTA
23/12/2021	EX_06_101_1244_11	30.31	01/03/2022	7	1
23/12/2021	EX_06_404_1561_10	13.7	22/02/2022	3	1
23/12/2021	EX_08_304_1867_12	11.29	01/03/2022	2	1
23/12/2021	ZE_06_522_943_10	8.07	22/04/2022	2	2
23/12/2021	EX_09_201_1881_12	5.36	12/04/2021	2	2
23/12/2021	EX_08_088_670_11	18.5	22/04/2022	4	2
12/01/2022	ZE_09_002_1214_15	8.22	21/04/2022	3	2
21/01/2022	MV_AV_BOYACA_941_09_T2	97.96	22/04/2021	16	2
29/03/2022	ZE_06_027_1561_10	10.13	20/04/2022	2	2
29/03/2022	EX_06_015_1561_10	6.15	12/04/2022	1	2
23/12/2021	EX_09_195_1881_12	9.29	04/05/2022	3	3
12/01/2022	EX_08_287_1244_11	25.21	25/04/2022	5	3
03/03/2022	EX_09_035_1556_10	29.04	11/05/2022	6	3
03/03/2022	EX_06_108_1867_12	7.54	18/05/2022	3	3
12/01/2022	EX_09_184_1249_11	83.23	03/06/2022	12	4
12/01/2022	EX_08_043_1556_10	43.62	27/05/2022	7	4

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400

Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195







FECHA DE ASIGNACIÓN	ID DISEÑO	HECTÁREAS	FECHA APROBACIÓN INVENTARIO	No. DE PLANOS	CUENTA
22/04/2022	EX_08_323_943_10	20.12	02/06/2022	4	4
22/04/2022	EX 08 303 1867 12	11.39	08/06/2022	2	4
22/04/2022	MV_08_270_1244_11	2	21/06/2022	1	4
22/04/2022	ZE_08_251_1744_10	3.3	09/06/2022	2	4
09/05/2022	MV 06 054 1561 10	17.76	26/05/2022	3	4
12/01/2022	EX_08_043_1556_10	1.74	12/07/2022	7	5
22/04/2022	EX_09_221_1881_12	28.37	07/07/2022	4	5
22/04/2022	EX_08_323_943_10	1.07	13/07/2022	4	5
22/04/2022	EX_08_309_1867_12	10.85	24/06/2022	2	5
22/04/2022	ZE_08_056_1556_10	14.06	28/06/2022	2	5
22/04/2022	EX_06_115_1867_12	3.71	05/07/2022	2	5
03/06/2022	EX_08_334_1867_12	17.6	07/07/2022	5	5
22/04/2022	EX 08 256 1244 11	28.49	11/08/2022	11	6
28/06/2022	MV 08 257 1244 11	72.37	17/08/2022	10	6
18/07/2022	EX 08 343 1867 12	82.21	08/09/2022	6	7
08/08/2022	EX 08 310 1867 12	10.56	21/09/2022	2	7
08/08/2022	EX 06 110 1867 12	58.25	22/09/2022	10	7
25/08/2022	ZE 08 032	2	07/09/2022	1	7
08/08/2022	EX 09 034 1556 10	26.05	03/10/2022	6	8
08/08/2022	CPS 941 EM 19 111	21.17	14/10/2022	5	8
01/09/2022	SC 09 078	9.39	18/10/2022	2	8
01/09/2022	EX 08 335 1867 12	8.35	22/10/2022	1	8
01/09/2022	EX 08 455 943 10	12.59	21/10/2022	3	8
01/09/2022	EX 08 295 943 10	4.83	31/10/2022	5	9
26/09/2022	EX 09 017 1249 11	25.15	17/11/2022	2	9
26/09/2022	TPD PL 1383	25.79	22/11/2022	3	9
26/09/2022	EX 08 395 943 10	6.93	02/12/2022	1	10
26/09/2022	MV 08 260 1244 11	13.4	14/12/2022	3	10
26/09/2022	MV_08_102_670_11	3.5	05/01/2023	2	11
26/09/2022	MV 08 174 1703 10	13.73	04/01/2023	1	11
20/12/2022	EX 09 185 1249 11	30.55	17/02/2023	6	12
20/12/2022	EX 09 036 1556 10	12.61	22/02/2023	3	12
20/12/2022	EX 08 293 1244 11	3.57	22/02/2023	1	12
20/12/2022	EX 06 097 1561 10	17.66	13/02/2023	4	12
20/12/2022	EX 09 219 1881 12	24.38	21/02/2023	6	13
20/12/2022	MV 08 039 1747 10	5.54	03/03/2023	1	13
01/03/2023	EX 06 385 1561 10	18.39	24/03/2023	3	13
01/03/2023	MV 06 499 937 09	5.56	24/03/2022	2	13
01/03/2023	ZE 06 194 1561 10	2	24/03/2023	1	13
01/03/2023	EX 08 299 943 10	10.1	12/04/2023	2	14
01/03/2023	EX 08 279 1244 11	39.09	19/04/2023	4	14
01/03/2023	MV_06_364_1561_10	3.46	31/03/2023	2	14
16/03/2023	EX_08_348_1867_12	18.47	25/04/2023	4	14
01/03/2023	EX_09_001_1214_15	7.44	15/05/2023	5	15
01/03/2023	EX 08 339 1867 12	5.86	24/05/2023	1	15
01/03/2023	CPS_937_MV_08_177	4.73	24/05/2023	1	15
01/03/2023	EX_08_307_1867_12	5.74	26/04/2023	2	15
16/03/2023	EX_08_301_1867_12	11.26	16/05/2023	2	15
16/03/2023	EX_08_256_1744_10	11.86	05/05/2023	3	15
19/04/2023	ZE_06_150_1561_10	4.7	09/05/2023	2	15
24/04/2023	EX_09_187_1249_11	28.7	20/06/2023	6	16
24/04/2023	EX_08_346_1867_12	10.14	14/06/2023	1	16
24/04/2023	EX_08_313_1867_12	9.22	29/05/2023	3	16
16/05/2023	MV 08 263 1244 11	17.36	14/06/2023	3	16

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195







Para la fecha de corte del periodo No. 18, los trabajos adelantados por el Contratista para la etapa 2 de diseño que cuentan con visto bueno por parte de la Entidad, corresponden a la información relacionada en la *Tabla 5*.

Tabla 5. Relación IDs con diseño aprobado por la SDM

FECHA DE ASIGNACIÓN	ID DISEÑO	HECTÁREAS	FECHA APROBACIÓN DISEÑO	No. DE PLANOS	CUENTA
23/12/2021	EX_06_404_1561_10	13.7	22/04/2022	5	2
23/12/2021	EX_08_304_1867_12	11.29	13/04/2022	4	2
29/03/2022	EX 06 015 1561 10	6.15	22/04/2022	3	2
23/12/2021	EX 06 101 1244 11	30.31	13/05/2022	25	3
23/12/2021	ZE_06_522_943_10	8.07	17/05/2022	4	3
23/12/2021	EX_09_201_1881_12	5.36	11/05/2022	3	3
12/01/2022	ZE_09_002_1214_15	8.22	17/05/2022	6	3
21/01/2022	MV_AV_BOYACA_941_09_T2	97.96	20/05/2022	47	3
29/03/2022	ZE_06_027_1561_10	10.13	19/05/2022	8	3
23/12/2021	EX_09_195_1881_12	9.29	31//05/2022	8	4
23/12/2021	EX_08_088_670_11	18.5	24/05/2022	19	4
12/01/2022	EX_08_287_1244_11	25.21	22/06/2022	13	4
03/03/2022	EX_09_035_1556_10	29.04	10/06/2022	8	4
03/03/2022	EX_06_108_1867_12	7.54	10/06/2022	5	4
22/04/2022	EX_08_303_1867_12	11.39	22/06/2022	7	4
09/05/2022	MV_06_054_1561_10	17.76	14/06/2022	12	4
12/01/2022	EX_09_184_1249_11	83.23	19/07/2022	16	5
22/04/2022	EX_08_323_943_10	21.19	13/07/2022	12	5
22/04/2022	EX_08_309_1867_12	10.85	19/07/2022	4	5
22/04/2022	ZE_08_056_1556_10	14.6	18/07/2022	3	5
22/04/2022	ZE 08 251 1744 10	3.3	23/06/2022	3	5
12/01/2022	EX 08 043 1556 10	45.36	26/07/2022	16	6
22/04/2022	EX_09_221_1881_12	28.37	11/08/2022	7	6
22/04/2022	MV_08_270_1244_11	2	10/08/2022	1	6
22/04/2022	EX_06_115_1867_12	3.71	19/08/2022	4	6
03/06/2022	EX_08_334_1867_12	17.6	29/07/2022	14	6
22/04/2022	EX_08_256_1244_11	28.49	11/08/2022	11	7
25/08/2022	ZE_08_032	2	07/09/2022	2	7
08/08/2022	EX_08_310_1867_12	10.56	05/10/2022	3	8
28/06/2022	MV_08_257_1244_11	72.37	02/11/2022	25	9
18/07/2022	EX_08_343_1867_12	82.21	17/11/2022	46	9
08/08/2022	EX_09_034_1556_10	26.05	15/11/2022	11	9
08/08/2022	EX_06_110_1867_12	58.25	22/11/2022	16	9
01/09/2022	SC_09_078	9.39	02/12/2022	4	10
01/09/2022	EX_08_335_1867_12	8.35	13/12/2022	3	10
01/09/2022	EX_08_455_943_10	12.59	06/12/2022	8	10
08/08/2022	CPS_941_EM_19_111	21.17	13/01/2023	28	11
01/09/2022	EX_08_295_943_10	4.83	18/01/2022	12	11
26/09/2022	TPD_PL_1383	25.79	28/12/2022	10	11
26/09/2022	EX_08_395_943_10	6.93	06/01/2022	8	11
26/09/2022	EX_09_017_1249_11	25.15	06/02/2023	18	12
26/09/2022	MV 08 260 1244 11	13.4	22/02/2023	10	12
26/09/2022	MV 08 102 670 11	3.5	10/02/2023	4	12
26/09/2022	MV_08_174_1703_10	13.73	08/02/2023	4	12
20/12/2022	EX 09 036 1556 10	12.61	21/03/2022	6	13
20/12/2022	MV 08 039 1747 10	5.54	23/03/2023	3	13

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195







FECHA DE ASIGNACIÓN	ID DISEÑO	HECTÁREAS	FECHA APROBACIÓN DISEÑO	No. DE PLANOS	CUENTA
20/12/2022	EX_08_293_1244_11	3.57	09/03/2023	3	13
20/12/2022	EX_06_097_1561_10	17.66	10/03/2023	10	13
20/12/2022	EX_09_185_1249_11	30.55	29/03/2023	16	14
20/12/2022	EX_09_219_1881_12	24.38	20/04/2023	10	14
01/03/2023	EX_06_385_1561_10	18.39	21/04/2023	5	14
01/03/2023	MV_06_499_937_09	5.56	24/04/2022	2	14
01/03/2023	EX_08_307_1867_12	5.74	24/05/2023	5	15
01/03/2023	EX_08_299_943_10	10.1	15/05/2023	8	15
01/03/2023	MV_06_364_1561_10	3.46	03/05/2023	2	15
01/03/2023	ZE_06_194_1561_10	2	03/05/2023	2	15
01/03/2023	EX_08_339_1867_12	5.86	15/06/2023	3	16
01/03/2023	EX_08_279_1244_11	39.09	13/06/2023	12	16
16/03/2023	EX_08_301_1867_12	11.26	22/06/2023	6	16
16/03/2023	EX_08_256_1744_10	11.86	14/06/2023	6	16
16/03/2023	EX_08_348_1867_12	18.47	16/06/2023	6	16
19/04/2023	ZE_06_150_1561_10	4.7	26/05/2023	5	16
	TOTAL	1220.97			

Para la fecha de corte del periodo No. 18, los trabajos adelantados por el Contratista para la etapa 3 de Informe ejecutivo que cuentan con visto bueno por parte de la Entidad, corresponden a la información relacionada en la *Tabla 6*.

Tabla 6. Relación IDs con Informe ejecutivo aprobado por la SDM

FECHA DE ASIGNACIÓN	ID DISEÑO	HECTÁREAS	FECHA APROBACIÓN INFORME EJECUTIVO	CUENTA
23/12/2021	EX_06_404_1561_10	13.7	12/04/2022	2
23/12/2021	EX_09_201_1881_12	5.36	17/05/2022	3
23/12/2021	EX_08_304_1867_12	11.29	27/04/2022	3
29/03/2022	EX_06_015_1561_10	6.15	04/05/2022	3
23/12/2021	EX_06_101_1244_11	30.31	07/06/2022	4
23/12/2021	ZE_06_522_943_10	8.07	31/05/2022	4
23/12/2021	EX_09_195_1881_12	9.29	07/06/2022	4
23/12/2021	EX_08_088_670_11	18.5	16/06/2022	4
12/01/2022	ZE_09_002_1214_15	8.22	23/05/2022	4
21/01/2022	MV_AV_BOYACA_941_09_T2	97.96	15/06/2022	4
03/03/2022	EX_09_035_1556_10	29.04	17/06/2022	4
03/03/2022	EX_06_108_1867_12	7.54	13/06/2022	4
29/03/2022	ZE_06_027_1561_10	10.13	26/05/2022	4
09/05/2022	MV_06_054_1561_10	17.76	22/06/2022	4
12/01/2022	EX_08_287_1244_11	25.21	01/07/2022	5
22/04/2022	EX_08_303_1867_12	11.39	28/06/2022	5
22/04/2022	ZE_08_251_1744_10	3.3	01/07/2022	5
12/01/2022	EX_09_184_1249_11	83.23	26/07/2022	6
12/01/2022	EX_08_043_1556_10	45.36	19/08/2022	6
22/04/2022	EX_09_221_1881_12	28.37	17/08/2022	6
22/04/2022	EX_08_323_943_10	21.19	28/07/2022	6
22/04/2022	MV_08_270_1244_11	2	17/08/2022	6
22/04/2022	EX_08_309_1867_12	10.85	27/07/2022	6
22/04/2022	ZE_08_056_1556_10	14.6	25/07/2022	6
03/06/2022	EX_08_334_1867_12	17.6	05/08/2022	6

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195







FECHA DE ASIGNACIÓN	ID DISEÑO	HECTÁREAS	FECHA APROBACIÓN INFORME EJECUTIVO	CUENTA
22/04/2022	EX_06_115_1867_12	3.71	26/08/2022	7
25/08/2022	ZE_08_032	2	22/09/2022	7
22/04/2022	EX_08_256_1244_11	28.49	04/10/2022	8
08/08/2022	EX_08_310_1867_12	10.56	11/10/2022	8
28/06/2022	MV_08_257_1244_11	72.37	09/11/2022	9
18/07/2022	EX_08_343_1867_12	82.21	22/11/2022	9
08/08/2022	EX_09_034_1556_10	26.05	21/11/2022	9
08/08/2022	EX_06_110_1867_12	58.25	02/12/2022	10
01/09/2022	SC_09_078	9.39	09/12/2022	10
01/09/2022	EX_08_335_1867_12	8.35	16/12/2022	10
01/09/2022	EX_08_455_943_10	12.59	14/12/2022	10
08/08/2022	CPS_941_EM_19_111	21.17	20/01/2023	11
01/09/2022	EX_08_295_943_10	4.83	24/01/2022	11
26/09/2022	TPD_PL_1383	25.79	06/01/2022	11
26/09/2022	EX_08_395_943_10	6.93	17/01/2022	11
26/09/2022	EX_09_017_1249_11	25.15	13/02/2023	12
26/09/2022	MV_08_102_670_11	3.5	23/02/2023	12
26/09/2022	MV_08_174_1703_10	13.73	17/02/2023	12
26/09/2022	MV_08_260_1244_11	13.4	08/03/2023	13
20/12/2022	EX_09_036_1556_10	12.61	24/03/2023	13
20/12/2022	EX_08_293_1244_11	3.57	17/03/2023	13
20/12/2022	EX_06_097_1561_10	17.66	17/03/2023	13
20/12/2022	EX_09_185_1249_11	30.55	13/04/2023	14
20/12/2022	EX_09_219_1881_12	24.38	24/04/2023	14
20/12/2022	MV_08_039_1747_10	5.54	30/03/2023	14
01/03/2023	EX_08_299_943_10	10.1	19/05/2023	15
01/03/2023	EX_06_385_1561_10	18.39	27/04/2023	15
01/03/2023	MV_06_499_937_09	5.56	05/05/2023	15
01/03/2023	MV_06_364_1561_10	3.46	12/05/2023	15
01/03/2023	ZE_06_194_1561_10	2	09/05/2023	15
01/03/2023	EX_08_339_1867_12	5.86	21/06/2023	16
01/03/2023	EX_08_307_1867_12	5.74	31/05/2023	16
16/03/2023	EX_08_256_1744_10	11.86	21/06/2023	16
19/04/2023	ZE_06_150_1561_10	4.7	02/06/2023	16
	TOTAL	1126.87		<u> </u>

Para la fecha de corte del periodo No. 18, los trabajos adelantados por el Contratista para la etapa 4 de dibujo y georreferenciación de diseños que cuentan con visto bueno por parte de la Entidad, corresponden a la información relacionada en la **Tabla 7**.

Tabla 7. Relación IDs con dibujo y georreferenciación aprobado por la SDM

FECHA DE ASIGNACIÓN	ID DISEÑO	HECTÁREAS	FECHA APROBACIÓN DIBUJO Y VINCULACIÓN	CUENTA
23/12/2021	EX_06_404_1561_10	13.7	06/05/2022	3
23/12/2021	EX_08_304_1867_12	11.29	06/05/2022	3
23/12/2021	EX_09_201_1881_12	5.36	03/06/2022	4
12/01/2022	ZE_09_002_1214_15	8.22	13/06/2022	4
29/03/2022	ZE_06_027_1561_10	10.13	13/06/2022	4
29/03/2022	EX_06_015_1561_10	6.15	26/05/2022	4

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Página 10 de15



22/04/2022	EX 08 303 1867 12	11.39	21/07/2022	5
22/04/2022	ZE 08 251 1744 10	3.3	19/07/2022	5
09/05/2022	MV 06 054 1561 10	17.76	08/07/2022	5
23/12/2021	EX_06_101_1244_11	30.31	09/08/2022	6
23/12/2021	EX 09 195 1881 12	9.29	09/08/2022	6
23/12/2021	EX 08 088 670 11	18.5	16/08/2022	6
03/03/2022	EX_09_035_1556_10	29.04	29/07/2022	6
22/04/2022	EX_08_309_1867_12	10.85	12/08/2022	6
23/12/2021	ZE 06 522 943 10	8.07	05/09/2022	7
03/03/2022	EX 06 108 1867 12	7.54	09/09/2022	7
22/04/2022	EX 09 221 1881 12	28.37	20/09/2022	7
22/04/2022	EX 06 115 1867 12	3.71	20/09/2022	7
22/04/2022	MV 08 270 1244 11	2	28/09/2028	8
22/04/2022	ZE 08 056 1556 10	14.6	28/09/2022	8
25/08/2022	ZE 08 032	2	18/10/2022	8
12/01/2022	EX 08 287 1244 11	25.21	24/10/2022	9
12/01/2022	EX_08_043_1556_10	45.36	11/11/2022	9
22/04/2022	EX_08_323_943_10	21.19	04/11/2022	9
08/08/2022	EX 08 310 1867 12	10.56	24/10/2022	9
12/01/2022	EX 09 184 1249 11	83.23	09/12/2022	10
03/06/2022	EX_08_334_1867_12	17.6	07/12/2022	10
21/01/2022	MV_AV_BOYACA_941_09_T2	97.96	29/12/2022	11
08/08/2022	EX_06_110_1867_12	58.25	18/01/2022	11
01/09/2022	EX_08_335_1867_12	8.35	11/01/2023	11
01/09/2022	EX_08_455_943_10	12.59	19/01/2022	11
08/08/2022	EX_09_034_1556_10	26.05	16/02/2022	12
01/09/2022	SC_09_078	9.39	25/01/2023	12
22/04/2022	EX_08_256_1244_11	28.49	16/03/2022	13
28/06/2022	MV_08_257_1244_11	72.37	16/03/2023	13
26/09/2022	TPD_PL_1383	25.79	07/03/2023	13
26/09/2022	MV_08_102_670_11	3.50	16/03/2023	13
26/09/2022	MV_08_174_1703_10	13.73	16/03/2023	13
26/09/2022	EX_08_395_943_10	6.93	28/03/2023	14
26/09/2022	EX_09_017_1249_11	25.15	09/05/2023	15
20/12/2022	EX_08_293_1244_11	3.57	12/05/2023	15
01/03/2023	EX_06_385_1561_10	18.39	16/05/2023	15
01/09/2022	EX_08_295_943_10	4.83	08/06/2023	16
26/09/2022	MV_08_260_1244_11	13.4	08/06/2023	16
20/12/2022	EX_09_219_1881_12	24.38	25/05/2023	16
20/12/2022	EX_09_036_1556_10	12.61	08/06/2023	16
01/03/2023	MV_06_364_1561_10	3.46	02/06/2023	16
	TOTAL	923.92		

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2486, en donde se registran los valores ejecutados durante el desarrollo del proyecto en el periodo del 23 de diciembre de 2022 al 22 de junio de 2023 con corte mensual a 30 de junio de 2023.

En razón de lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la relación de recursos asignados:

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Secretaría Distrital de Movilidad Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400 www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195 Página 11 de15





Tabla 8. Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP
2283	28/07/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2021
23	30/07/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2022
23	30/07/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2023

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP
7	04/01/2022	O23011604490000007587	Servicios de consultoría en gestión financiera	2022

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP
22	01/01/2023	O23011604490000007587	Servicios de consultoría en gestión financiera	2023

CRP	FECHA	VALOR APROBADO POR VIGENCIA	VALOR TOTAL
2457	17/11/2021	\$ 169.905.344.00	\$ 169.905.344.00
35	17/11/2021	\$ 1.009.126.748.00	\$ 1.009.126.748.00
35	17/11/2021	\$ 1.009.132.817.00	\$ 1.009.132.817.00

CRP	FECHA	VALOR APROBADO POR VIGENCIA	VALOR TOTAL
17	10/01/2022	\$ 1.009.126.748.00	\$ 1.009.126.748.00

CRP	FECHA	VALOR APROBADO POR VIGENCIA	VALOR TOTAL
17	01/01/2023	\$ 1.009.132.817.00	\$ 1.009.132.817.00

Fuente: Elaboración propia

A continuación, y con corte al 30 de junio de 2023, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Página 12 de15



Tabla 9. Pagos realizados Vs Recursos asignados

CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR CANCELADO	CUENTA No.	ESTADO	SALDO CRP	ACUMULADO RP	ACUMULADO TOTAL
			\$26,845,044.00	1	CANCELADO	\$143,060,300.00	\$26,845,044.00	\$26,845,044.00
			\$56,838,192.01	2	CANCELADO	\$86,222,107.99	\$83,683,236.01	\$83,683,236.01
0457	47/44/2024	\$400,00F,244,00	\$ 53,423,094.59	3	CANCELADO	\$32,799,013.40	\$137,106,330.60	\$137,106,330.60
2457	17/11/2021	\$169,905,344.00	\$22,465,127.00	4	CANCELADO	\$10,333,886.40	\$159,571,457.60	\$159,571,457.60
			\$3,938,163.00	5	CANCELADO	\$6,395,723.40	\$163,509,620.60	\$163,509,620.60
			\$6,395,723.40	6	CANCELADO	\$0.00	\$169,905,344.00	\$169,905,344.00
			\$34,845,492.01	2	CANCELADO	\$974,281,255.99	\$34,845,492.01	\$204,750,836.01
			\$57,936,443.05	3	CANCELADO	\$916,344,812.94	\$92,781,935.06	\$262,687,279.06
			\$167,654,243.00	4	CANCELADO	\$748,690,569.94	\$260,436,178.06	\$430,341,522.06
			\$104,714,604.00	5	CANCELADO	\$643,975,965.94	\$365,150,782.06	\$535,056,126.06
			\$140,398,233.00	6	CANCELADO	\$503,577,732.94	\$505,549,015.06	\$675,454,359.06
			\$96,882,618.00	7	CANCELADO	\$406,695,114.94	\$602,431,633.06	\$772,336,977.06
			\$53,042,624.00	8	CANCELADO	\$353,652,490.94	\$655,474,257.06	\$825,379,601.06
17	10/01/2022	\$1,009,126,748.00	\$179,055,653.00	9	CANCELADO	\$174,596,837.94	\$834,529,910.06	\$1,004,435,254.06
			\$52,647,618.00	10	CANCELADO	\$121,949,219.94	\$887,177,528.06	\$1,057,082,872.06
			\$58,844,581.00	11	CANCELADO	\$63,104,638.94	\$946,022,109.06	\$1,115,927,453.06
			\$28,292,899.00	12	CANCELADO	\$34,811,739.94	\$974,315,008.06	\$1,144,220,352.06
			\$17,985,254.00	13	CANCELADO	\$16,826,485.94	\$992,300,262.06	\$1,162,205,606.06
			\$866,262.00	14	CANCELADO	\$15,960,223.94	\$993,166,524.06	\$1,163,071,868.06
			\$5.888.833.00	15	CANCELADO	\$10.071.390.94	\$999.055.357.06	\$1.168.960.701.06
			\$7.335.104.00	16	EN TRÁMITE	\$2.736.286.94	\$1.006.390.461.06	\$1.176.295.805.06
			\$8,873,588.00	11	CANCELADO	\$1,000,259,229.00	\$8,873,588.00	\$1.185.169.393.06
			\$41,909,176.00	12	CANCELADO	\$958,350,053.00	\$50,782,764.00	\$1.227.078.569.06
47	04/04/0000	#4 000 400 047 00	\$55,642,752.00	13	CANCELADO	\$902,707,301.00	\$106,425,516.00	\$1.282.721.321.06
17	01/01/2023	\$1,009,132,817.00	\$83,851,671.00	14	CANCELADO	\$818,855,630.00	\$190,277,187.00	\$1.366.572.992.06
			\$43.798.121.00	15	CANCELADO	\$775.057.418.00	\$234.075.399.00	\$1.410.371.113.06
			\$80.245.971.00	16	EN TRÁMITE	\$694.811.447.00	\$314.321.361.00	\$1.490.617.084.06

De acuerdo con lo anterior, en la *Tabla 10* se muestra el análisis financiero a corte del 30 de junio de 2023 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla 10. Estado del Contrato con corte al 30 de junio de 2023

ÍTEM	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	\$ 2,188,164,909.00

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Página 13 de15



ÍTEM	ITEMS	VALORES
2	Valor Ejecutado	\$ 1.490.617.084.06
3	Saldo por Ejecutar	\$ 697.547.733.94
4	Valor pagado	\$ 1.403.036.100.06
5	Saldo CRP 2457	\$0.00
6	Saldo CRP 17	\$2.736.286.94
7	Saldo CRP 17	\$694.811.447.00

La cuenta del periodo comprendido entre 23 mayo al 22 de junio de 2023 se encuentra en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Al corte del 30 de junio de 2023, el consultor se encuentra adelantando la inspección y el inventario de los IDs relacionados en la **Tabla 3**, la visita técnica de inspección se realiza con el fin de consolidar y obtener, mediante observación directa para cada tramo vial o intersección del área o zona de influencia asignada por la Entidad, toda la información que se pueda evidenciar en relación con: características y condiciones existentes de la infraestructura y del tránsito, equipamientos atractores y/o generadores de viaje, movimientos posibles del tránsito en las intersecciones, existencia de transporte público y de carga, señalización vial existente, su estado y pertinencia, riesgos de seguridad vial para todos los usuarios, tales como peligros, deficiencias y aspectos susceptibles de ocasionar un siniestro, entre otros aspectos.

Con corte al 30 de junio de 2023 el consultor cuenta con el inventario aprobado por parte de la SDM de los IDs relacionados en la **Tabla 4**.

Con corte al 30 de junio de 2023 el consultor cuenta con el diseño aprobado por parte de la SDM de los IDs relacionados en la *Tabla 5*.

Con corte al 30 de junio de 2023 el consultor cuenta con el informe ejecutivo de señalización aprobado por parte de la SDM de los IDs relacionados en la *Tabla 6*.

Con corte al 30 de junio de 2023 el consultor cuenta con el dibujo y georreferenciación de señalización aprobado por parte de la SDM de los IDs relacionados en la **Tabla 7**.

Al corte del 30 de junio de 2023, se han realizado quince (15) pagos del contrato de consultoría 2021-2486 por valor de \$1.403.036.100.06 y se encuentra en trámite según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad el pago No. 16 por valor de \$87.581.075.00.

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Página 14 de15

ALCALDÍA MAYOR
DE POGOTÁ DO



Con el pago de la cuenta No. 6 se agotaron los recursos del Registro presupuestal No. 2457 de la vigencia 2021 por valor de \$169.905.344.

Al corte del 30 de junio de 2023 se han ejecutado \$1.006.390.461.06 del Registro presupuestal No. 17 de la vigencia 2022, quedando un saldo de \$2.736.286.94

Al corte del 30 de junio de 2023 se han ejecutado \$314.321.361 del Registro presupuestal No. 17 de la vigencia 2023, quedando un saldo de \$694.811.447.

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Página 15 de15
