

Rendición de cuentas Localidad de Kennedy

Rendición de cuentas nodo Movilidad
31 de Agosto de 2024



INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO




PROPÓSITO CENTRAL (MISIÓN)

Estructuramos y desarrollamos proyectos de infraestructura vial y movilidad multimodal, de forma sostenible, incluyente, innovadora y eficiente, para contribuir al desarrollo urbano de Bogotá Región y mejorar la calidad de vida de su g




Estado de la malla vial troncal por localidad

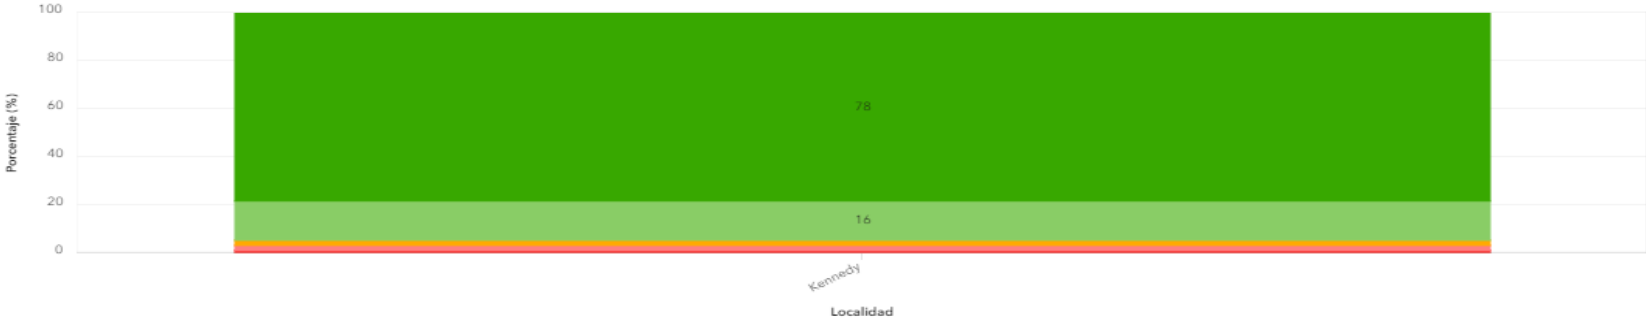


BUENO	SATISFACTORIO	JUSTO	POBRE	MUY POBRE	GRAVE		TOTAL
66,65	13,91	1,84	1,88	0,81	0,05	0	85,15
KM-CARRIL	KM-CARRIL	KM-CARRIL	KM-CARRIL	KM-CARRIL	KM-CARRIL		KM-CARRIL

Estado malla vial troncal Bogotá




La gráfica muestra el porcentaje (%) del estado de la malla vial con respecto al total de la extensión relacionada con diagnóstico de la ciudad de Bogotá

KM-CARRIL BUENO vs TOTAL

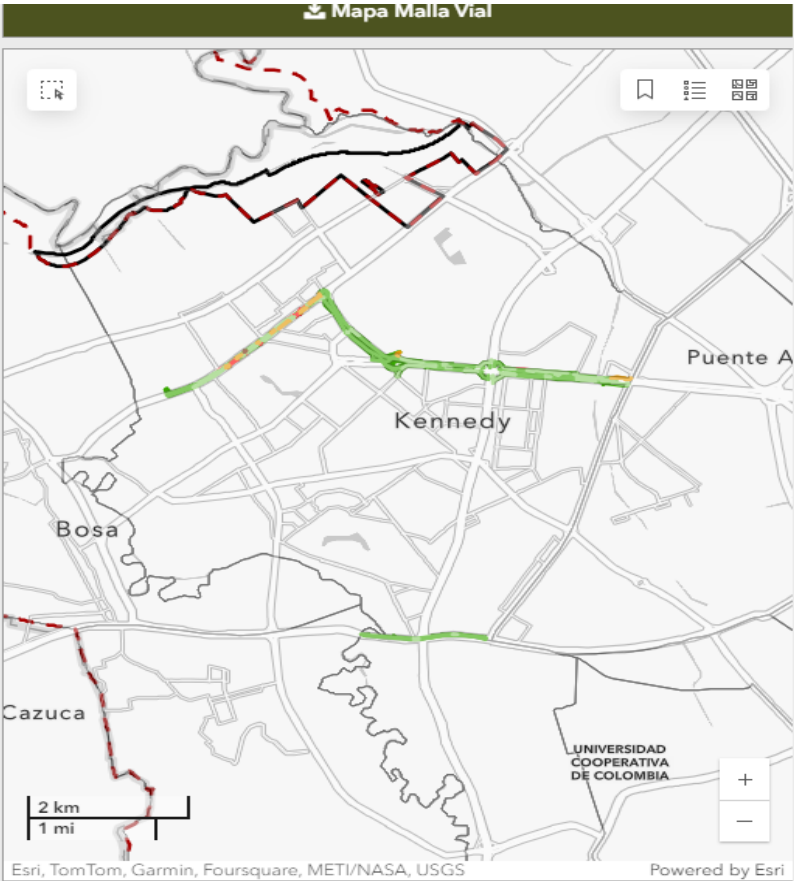


Estado de la malla vial arterial por localidad

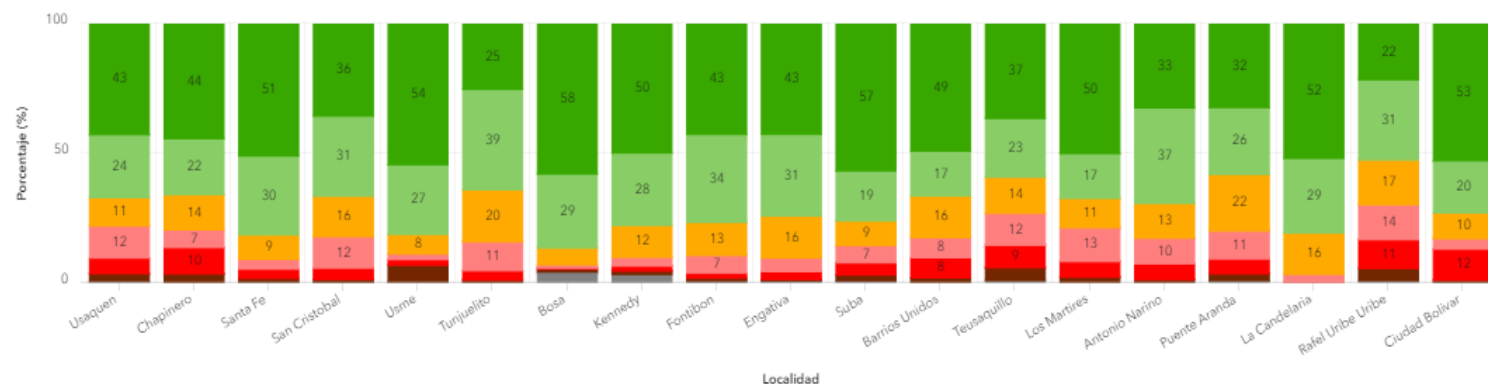


BUENO 1208,24 KM-CARRIL	SATISFACTORIO 710,28 KM-CARRIL	JUSTO 351,73 KM-CARRIL	POBRE 204,8 KM-CARRIL	MUY POBRE 134,8 KM-CARRIL	GRAVE 59,96 KM-CARRIL	FALLADO 26,35 KM-CARRIL	TOTAL 2696,16 KM-CARRIL
--------------------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Estado malla vial arterial Bogotá

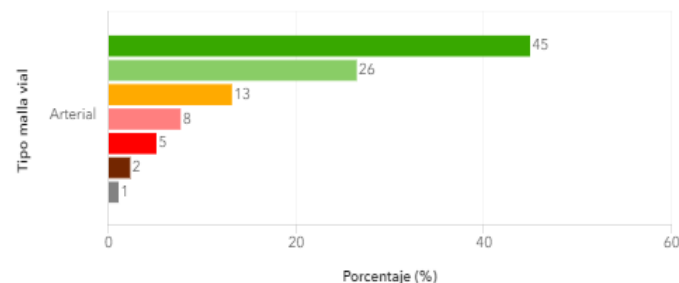



La gráfica muestra el porcentaje (%) del estado de la malla vial con respecto al total de la extensión relacionada con diagnóstico de la ciudad de Bogotá

KM-CARRIL BUENO vs TOTAL



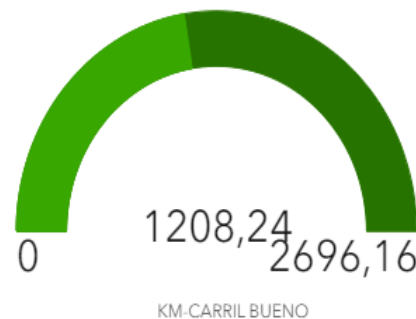


Mapa Malla Vial

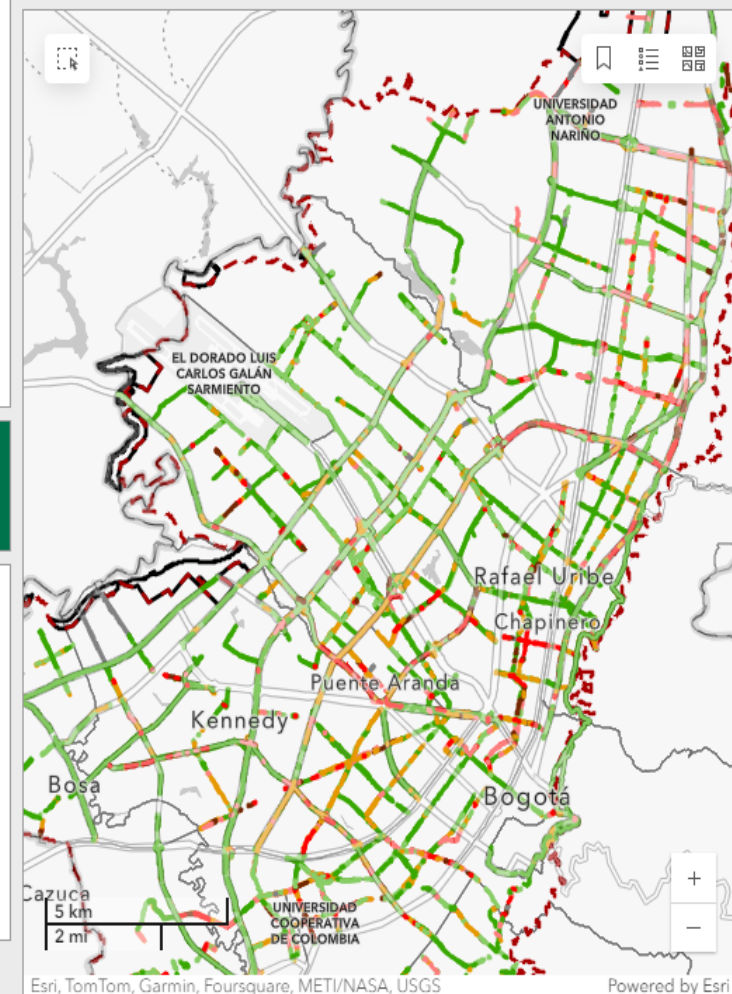


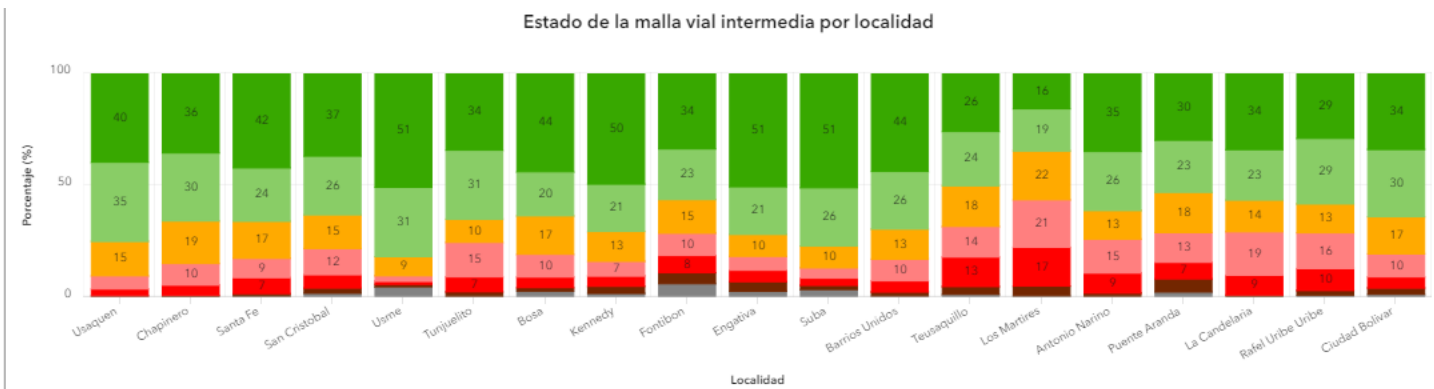




BUENO 1283,63 KM-CARRIL	SATISFACTORIO 819,52 KM-CARRIL	JUSTO 455,32 KM-CARRIL	POBRE 308,55 KM-CARRIL	MUY POBRE 199,42 KM-CARRIL	GRAVE 88,01 KM-CARRIL	FALLADO 62,37 KM-CARRIL	TOTAL 3216,82 KM-CARRIL
---	--	--	--	--	---	---	---

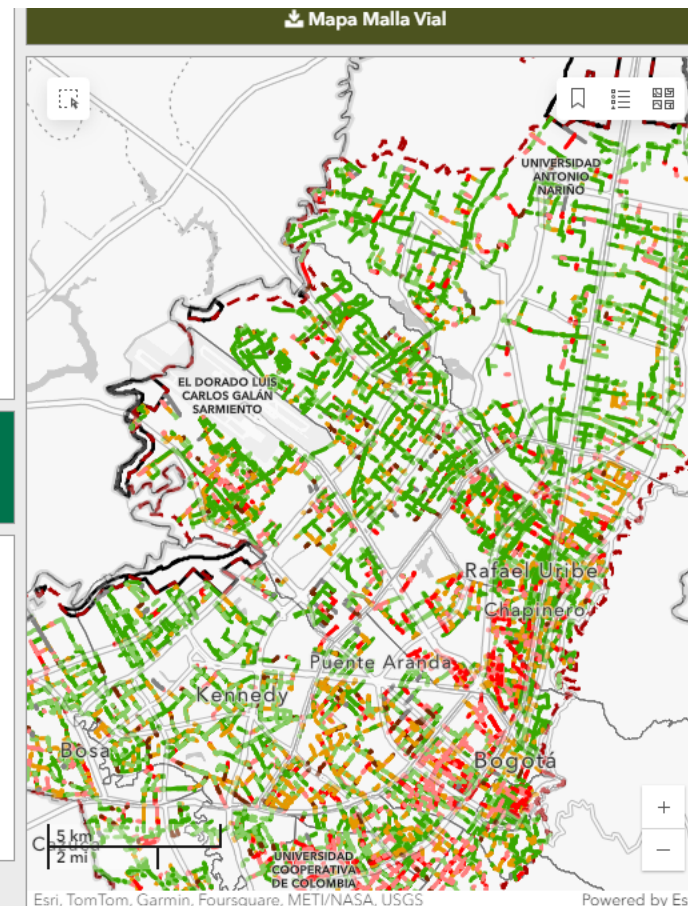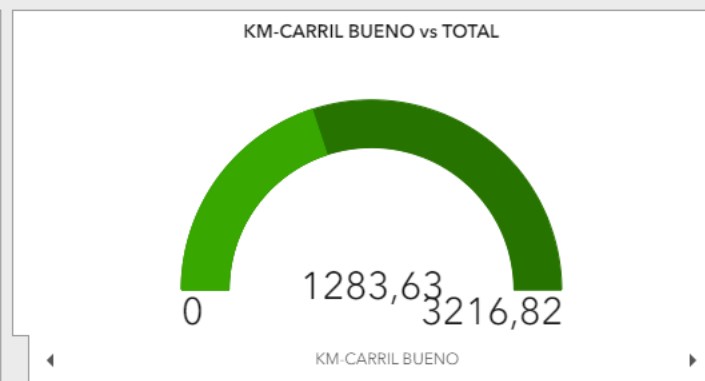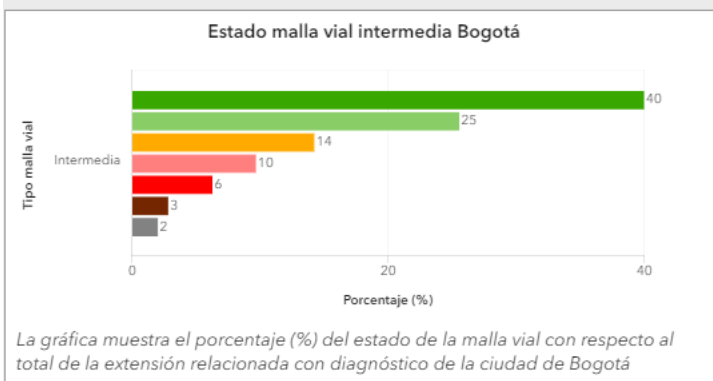

Estado de la malla vial local por localidad

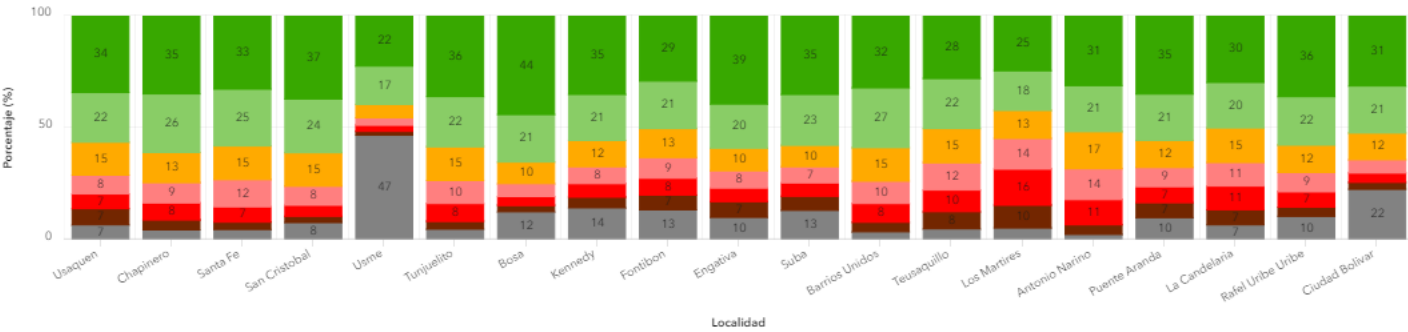

BUENO 2130,7 KM-CARRIL	SATISFACTORIO 1331,04 KM-CARRIL	JUSTO 731,72 KM-CARRIL	POBRE 492,56 KM-CARRIL	MUY POBRE 390,35 KM-CARRIL	GRAVE 316,78 KM-CARRIL	FALLADO 796,48 KM-CARRIL	TOTAL 6189,64 KM-CARRIL
------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

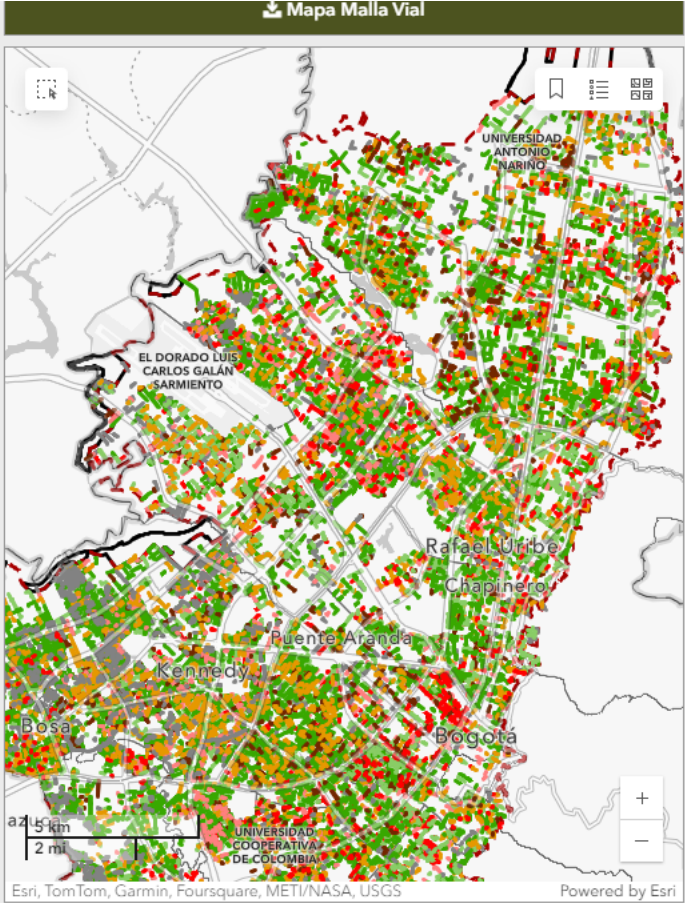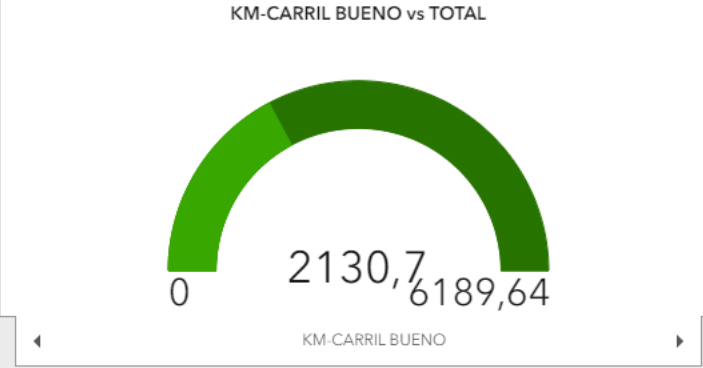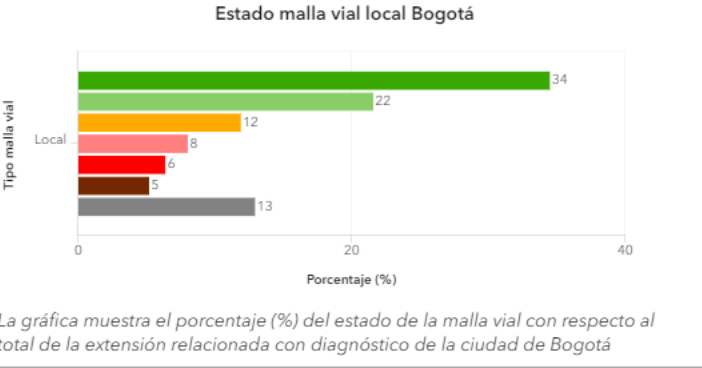



Total Puentes

0

30

Total Puentes

0

30

Listado general del número total de Puentes por localidad

01 Usaquen

Total puentes: 122

Puentes vehiculares: 67

Puentes peatonales: 55

02 Chapinero

Total puentes: 57

Puentes vehiculares: 35

Puentes peatonales: 22


03 Santa Fe

Total puentes: 30

Puentes vehiculares: 30

Puentes peatonales: 0

Dar clic nuevamente en la lista para borrar selección.

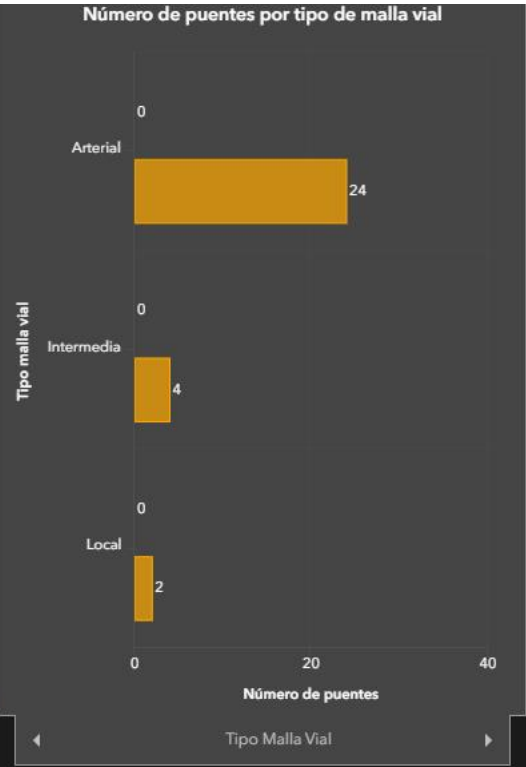

Ver datos abiertos

Ver Mapas

Total - m2 Andén

28.227.006,8

m2 Andén

26.826.217,8

Con estado

m2 Andén



634.680,3

No aplica metodología

m2 Andén

766.108,7

Sin estado

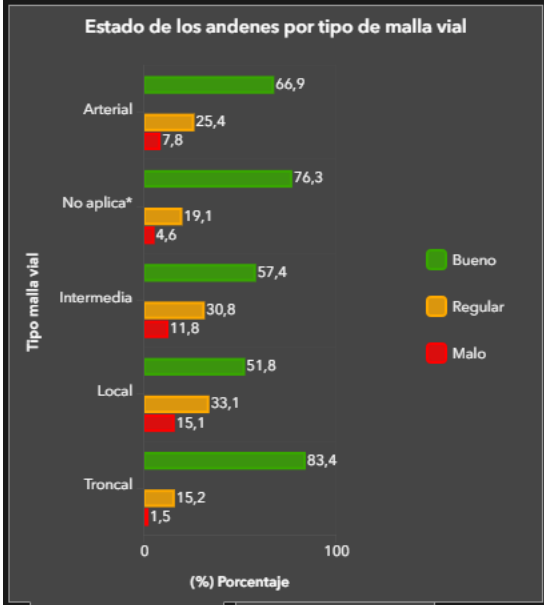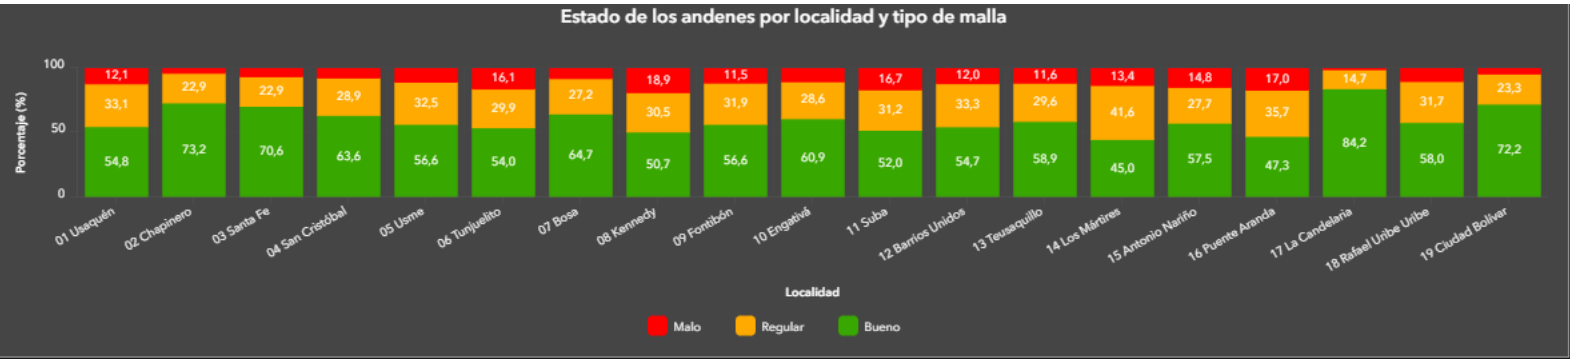

Bueno


15.373.902,1 m2

Regular

8.139.439,9 m2

Malo

3.312.875,8 m2

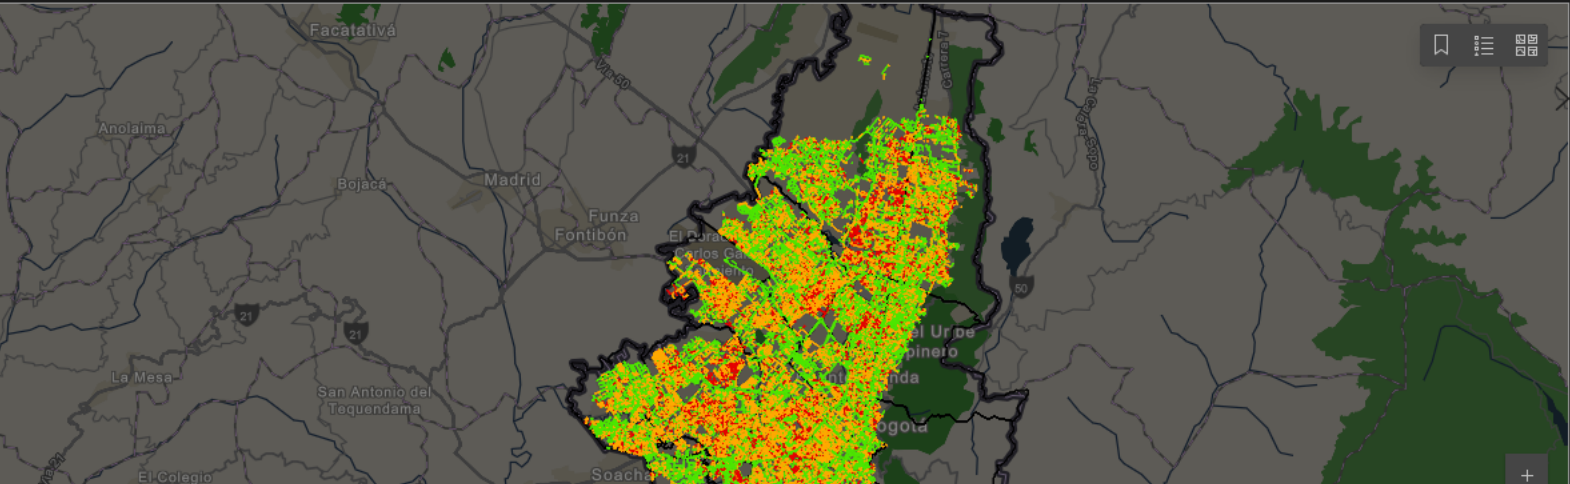

Extensión ciclorruta

🚲 **94,6 km**


Aplica metodología de diagnóstico

🚲 **70,2 km**

No aplica metodología

🚲 **24,5 km**

Estado ciclorruta por tipo de malla vial



*El resultado porcentual de la información filtrada es relativo al total general de los km de ciclorruta a los que aplica la metodología de diagnóstico para cada tipo de malla vial.


Km BUENO vs TOTAL



🗺️ Mapa Ciclorrutas

📄 Ver datos abiertos

Estado de la red de ciclorruta por localidad

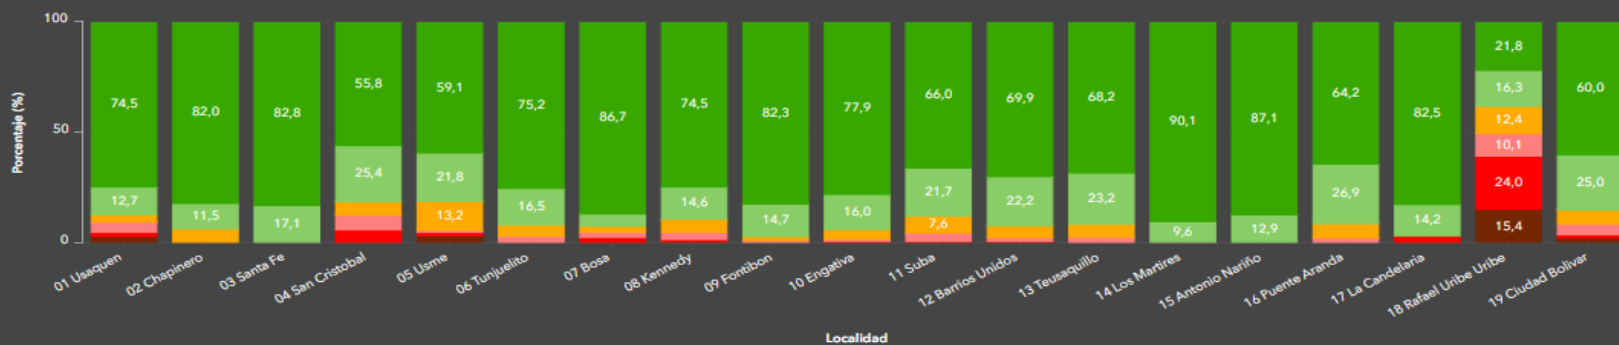

BUENO

52,3
Km

SATISFACTORIO

10,2
Km

JUSTO

4,1
Km

POBRE

2,3
Km

MUY POBRE


0,7
Km

GRAVE

0,2
Km

FALLADO

0,3
Km

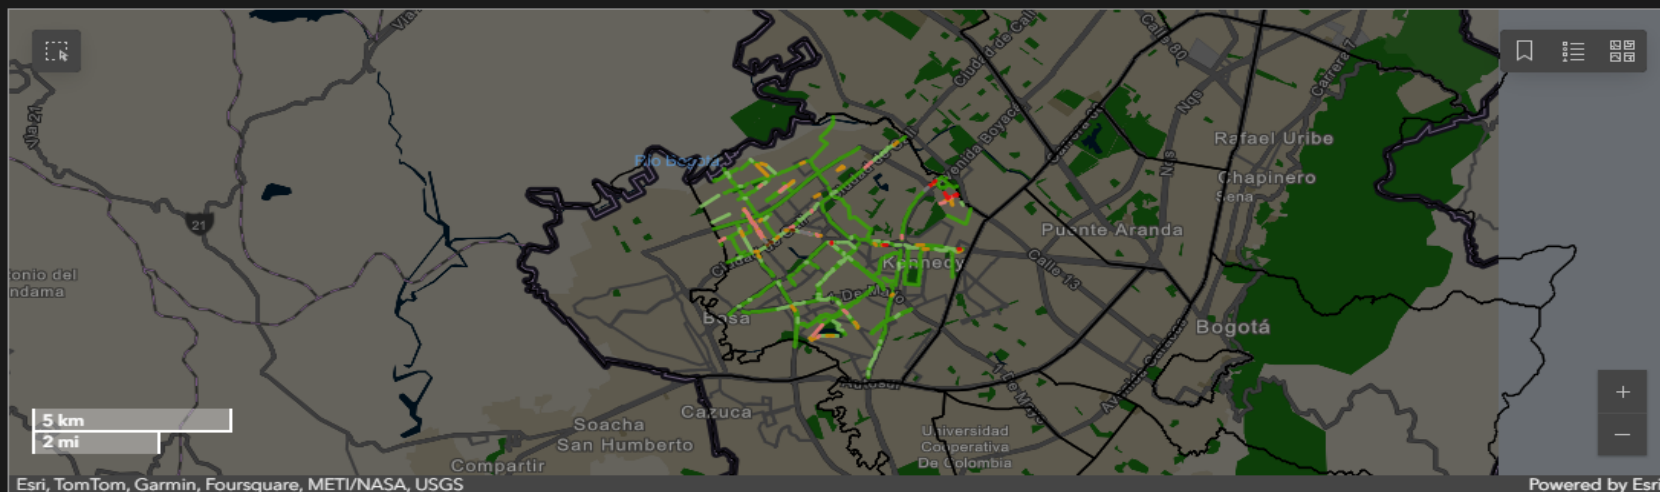

OBRA POR TU LUGAR - OPTL



- + El programa **OPTL** permite **cofinanciar** (*estado y comunidad*) proyectos de **obra pública** (*andenes, vías, otros*).
- + Está liderado por el *Instituto de Desarrollo Urbano - IDU* y permite la **intervención y mejoramiento del espacio público e infraestructura vial**.
- + Los proyectos **OPTL** se desarrollan a partir de **solicitudes directas de la comunidad**, que sean propietarios de predios cercanos a las obras postuladas y por ende, se beneficiarán directamente de la intervención.
- + La comunidad que postula se obliga a cofinanciar un porcentaje **mínimo del 25% hasta el 100% del costo total de la obra** (*estudios socioeconómicos*), decisión que debe someterse a **votación** (*predios zona de influencia*) y que requiere para aprobación **mínimo del 55% de votos favorables**.

MARCO NORMATIVO - OPTL

LEY 388 DE 1997: Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

ARTICULO 126. *Cuando una obra urbanística cuente con la aprobación de la entidad territorial o de desarrollo urbano correspondiente y **sea solicitada por el 55%** de los propietarios de predios o de unidades habitacionales beneficiados por la obra, o sea requerida por la Junta de Acción Comunal, la corporación de barrios o la entidad comunitaria que represente los intereses ciudadanos de quienes puedan beneficiarse, bajo el entendido y con el compromiso de que la comunidad participe en la financiación de la obra en un **25% por lo menos**, la entidad de desarrollo urbano podrá adelantar la obra según el esquema de valorización local que diseñe para tal efecto para financiar la obra. La comunidad podrá organizarse en Veeduría para supervisar la ejecución de la obra que ha promovido.*

¿Qué tipo de obras se pueden postular?



Andenes



Mantenimiento vial



Plazoletas



Ciclorrutas



Nombre del proyecto

Avenida Constitución entre la Avenida de las Américas (AC 6) y la Avenida Alsacia (AC 12) - Estudios y diseños

Fecha de actualización: 10/04/2023

Avance programado: 99,0%

Avance ejecutado: 96,74%

Estado del contrato: TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION

Alcance del proyecto

Estudios y diseños de la Avenida Constitución entre la Avenida de las Américas (AC 6) y la Avenida Alsacia (AC 12) (Incluye AP 2009-00052 - Calle 9C a Av. Alsacia)

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Diseño	1.0 Unidades

Contrato: IDU-1801-2021

Información contractual

Número de contrato:	IDU-1801-2021
Tipo:	Consultoría (Estudios y Diseños Tecnicos)
Contratista:	CONSORCIO SAICON-TERRA
Valor total:	\$ 1.598.346.498,00
Fecha de inicio:	03/02/2022
Fecha de finalización:	11/04/2023
Empleos generados:	44

Número de contrato:	IDU-1793-2021
Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	CIVILTEC INGENIEROS LTDA
Valor total:	\$ 878.711.173,00
Fecha de inicio:	03/02/2022
Fecha de finalización:	11/04/2023
Empleos generados:	24

Información al ciudadano

Dirección:
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Correo electrónico: puntoidu1801@gmail.com
Teléfono: 3053908341

[Contacto virtual clic aquí](#)



Troncal Avenida Ciudad de Cali Tramo 1- Grupo 3 - Av. Villavicencio a Av. Manuel Cepeda Vargas- Construcción

Fecha de actualización: 19/08/2024

Avance programado: 70,14%

Avance ejecutado: 66,63%

Estado del contrato: EN EJECUCION

Alcance del proyecto

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Construir Km de troncal	1.67 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	8.11 Km_Carril

Contrato: IDU-1653-2020



Construir Km de Ciclorruta	2.87 Km
Construir m2 de Espacio Público	31906.5 m2
Construir Km-Carril de carril de Transmilenio	6.65 Km_Carril
Construir m2 de zona verde	5738.34 m2
Construir Estaciones bidireccionales	2.0 Unidades
Construir Taquillas	8.0 Unidades
Construir cicloestaciones	1.0 Unidades
Intersección semaforizada	7.0 Unidades

Información contractual


Número de contrato: IDU-1653-2020
Tipo: Contrato de Obra
Contratista: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL COLOMBIA
Valor total: \$ 128.484.094.540,00


Número de contrato: IDU-1674-2020
Tipo: Consultoría (Interventoría)
Contratista: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Valor total: \$ 17.818.185.672,00

Nombre del proyecto

Troncal Avenida Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 4 - Intersección Av. Manuel Cepeda Vargas - Construcción

Fecha de actualización: 26/08/2024

Avance programado: 48,57% 

Avance ejecutado: 47,74% 

Estado del contrato: EN EJECUCION

Alcance del proyecto

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 □ EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C



CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 □ EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

Metas físicas	
Tipo	Cantidad
Construir Km de troncal	0.4 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	3.49 Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta	1.16 Km
Construir m2 de Espacio Público	1325.0 m2
Construir Puentes vehiculares	1.0 Unidades
Construir Km-Carril de carril de Transmilenio	1.85 Km_Carril
Construir m2 de zona verde	15548.05 m2
Intersección semaforizada	1.0 Unidades
Construir Glorieta a Nivel	1.0 Unidades

Contrato: IDU-1670-2020



Número de contrato:	IDU-1670-2020
Tipo:	Contrato de Obra
Contratista:	CONSORCIO MAHFER
Valor total:	\$ 167.023.565.788,00
Fecha de inicio:	29/01/2021
Fecha de finalización:	28/12/2030
Empleos generados:	278

Número de contrato:	IDU-1697-2020
Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	CONSORCIO AIRUG 2020
Valor total:	\$ 20.463.387.059,00
Fecha de inicio:	29/01/2021
Fecha de finalización:	28/12/2030
Empleos generados:	40


En qué se trabaja


COMPONENTE DE REDES HUMEDAS - Cuadrante Nor-Occidental Inspección con geófono y arreglo de fuga de agua - Cuadrante Sur-Occidental En la vía pacificada se continuó con la excavación manual para el cuarto tubo, y se instaló los 6 m de la tubería sanitaria de 8" PVC Se realizó reunión de empalme del grupo 3 y grupo 4 de la tubería sanitaria de 27" desde el pozo CMP 90637A CMP 90637B COMPONENTE DE REDES SECAS - Cuadrante Nor-Oriental Se realizó la instalación de las redes faltantes de Codensa 9Ø6"+3Ø3", Etb 12Ø4" y Tigo 16Ø4"del cruce de la Avenida Manuel Cepeda Vargas (Sector Castello a Sector María Paz) en el Ramal D COMPONENTE DE URBANISMO - Cuadrante Nor-Oriental Excavación manual para la conformación de la subrasante del espacio público, entre Av. Manuel Cepeda y Av. Ciudad de Cali, Castello. Compactación de la primera capa de la subbase granular C - RCD, espacio público, entre Av. Manuel Cepeda y Av. Ciudad de Cali, Castello. C conformación de la segunda capa de la subbase granular C – RCD, espacio público, entre Av. Manuel Cepeda y Av. Ciudad de Cali, Castello. Instalación de geotextil NT2500 en la subrasante, espacio público, entre Av. Manuel Cepeda y Av. Ciudad de Cali, Castello. Instalación de Bordillo A-80 longitudinal, espacio público, entre Av. Manuel Cepeda y Av. Ciudad de Cali,

Nombre del proyecto

Troncal Avenida Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 2 - Av. Bosa a Av. Villavicencio - Construcción

Fecha de actualización: 26/08/2024

Avance programado: 61,77% 

Avance ejecutado: 52,73% 

Estado del contrato: EN EJECUCION

Alcance del proyecto

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

Contrato: IDU-1647-2020

BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

Metas físicas	
Tipo	Cantidad
Construir Km de troncal	2.5 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	16.05 Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta	4.59 Km
Construir m2 de Espacio Público	84805.05 m2
Construir Puentes peatonales	1.0 Unidades
Construir m2 de zona verde	34707.62 m2
Construir Estaciones bidireccionales	3.0 Unidades
Construir Taquillas	10.0 Unidades
Intersección semaforizada	8.0 Unidades
Construir Km-Carril de carril de Transmilenio	9.47 Km_Carril
Construir cicloestaciones	3.0 Unidades

Contrato: IDU-1647-2020



Información contractual			
Número de contrato:	IDU-1647-2020	Número de contrato:	IDU-1667-2020
Tipo:	Contrato de Obra	Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARÍA 004	Contratista:	CONSORCIO SUPERVISOR A - H
Valor total:	\$ 221.019.965.377,00	Valor total:	\$ 18.604.685.687,00
Fecha de inicio:	26/01/2021	Fecha de inicio:	26/01/2021
Fecha de finalización:	31/10/2029	Fecha de finalización:	31/10/2029
Empleos generados:	338	Empleos generados:	47
En qué se trabaja			
Sub-Tramo 3 - Avda. Cali Cl. 59b Sur - Avda. Cali Cl. 57B Sur: COSTADO ORIENTAL: - Instalación de tubería 8" biaxial conexión a taquilla K3+265 - Excavación manual para bordillo A80 y cereo de material seleccionado para conformación de espacio público entre K3+270 a K3+320 - Construcción de pozos pluviales - Cereo de material seleccionado para conformación de calzada mixta conectante glorieta en K3+020 a K3+030 - Excavación manual e instalación de tubería 10" pluvial de taquilla en K3+055 a K3+064 - Compactación material seleccionado para conformación de calzada mixta en K3+025 - Excavación mecánica e instalación tubería para cruce semafórico en K3+073 - Instalación de cable de cobre desnudo en K3+065 - Instalación de bordillo A-80 y prefabricados para conformación de espacio público entre K3+270 a K3+320 - Instalación de SBG-A para conformación de calzada mixta conectante en K3+020 A k3+080 COSTADO OCCIDENTAL: - Excavación mecánica cajón de vía para conformación de calzada mixta en K3+065 a mayores Sub-Tramo			



Nombre del proyecto

Puentes Vehiculares Av. Américas por Av. 68 y Av. Américas por Av. Boyacá - Factibilidad y diseños

Fecha de actualización: 03/06/2024

Avance programado: 56,43%

Avance ejecutado: 54,88%

Estado del contrato: EN EJECUCION

Alcance del proyecto

Factibilidad y diseños puentes Vehiculares Av. Américas por Av. 68 y Av. Américas por Av. Boyacá

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Factibilidad	1.0 Unidades

Contrato: IDU-529-2022



Tipo	Cantidad
Factibilidad	1.0 Unidades
Diseño	1.0 Unidades

Información contractual

Número de contrato:	IDU-529-2022	Número de contrato:	IDU-531-2022
Tipo:	Consultoría (Estudios y Diseños Tecnicos)	Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	CONSORCIO ARDANUY IVICSA 2	Contratista:	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA
Valor total:	\$ 5.701.532.751,00	Valor total:	\$ 1.523.812.659,00
Fecha de inicio:	25/08/2022	Fecha de inicio:	25/08/2022
Fecha de finalización:	30/09/2024	Fecha de finalización:	30/10/2024
Empleos generados:	45	Empleos generados:	27

Nombre del proyecto

Accesos viales y alamedas María Paz -
Corabastos Tramo 2 - Estudios y Diseños

Fecha de actualización: 19/06/2024

Avance programado: 100,0%

Avance ejecutado: 95,04%

Estado del contrato: EN EJECUCION

Alcance del proyecto

Estudios y Diseños Tramo 2: Espacio público peatonal Calle 40b Sur entre Kra 94C y Av. Agoberto Mejía

Metas físicas

Tipo

Cantidad

Contrato: IDU-1698-2022



Información contractual

Número de contrato:	IDU-1698-2022
Tipo:	Consultoría (Estudios y Diseños Técnicos)
Contratista:	VELNEC SOCIEDAD ANONIMA
Valor total:	\$ 3.091.384.529,00
Fecha de inicio:	08/02/2023
Fecha de finalización:	19/06/2024
Empleos generados:	35

Número de contrato:	IDU-1699-2022
Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.
Valor total:	\$ 1.378.949.626,00
Fecha de inicio:	08/02/2023
Fecha de finalización:	19/07/2024
Empleos generados:	35


Información al ciudadano


Dirección:
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Correo electrónico: puntoidu1698de2022@gmail.com
Teléfono: 3158619353 - 601 2410530 Ext 118

Nombre del proyecto

Accesos viales y alamedas María Paz - Corabastos Tramo 1 - Estudios y Diseños

Fecha de actualización: 21/08/2023

Avance programado: 100,0% 

Avance ejecutado: 94,28% 

Estado del contrato: **TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION**

Alcance del proyecto

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS ACCESOS VIALES MARÍA PAZ – CORABASTOS:AV. DE LOS MUISCAS ENTRE AV. CIUDAD DE CALI Y AV. DE LAS AMÉRICAS, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y LA AV. MANUEL CEPEDA

Metas físicas

Contrato: IDU-1708-2021



Informacion contractual

Número de contrato:	IDU-1708-2021
Tipo:	Consultoría (Estudios y Diseños Tecnicos)
Contratista:	CONSORCIO MARIA PAZ CORABASTOS SS
Valor total:	\$ 3.132.203.161,00
Fecha de inicio:	24/12/2021
Fecha de finalización:	24/08/2023
Empleos generados:	17

Número de contrato:	IDU-1703-2021
Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA
Valor total:	\$ 1.232.651.689,00
Fecha de inicio:	24/12/2021
Fecha de finalización:	24/08/2023
Empleos generados:	22

Información al ciudadano

Dirección: KR 71 11 71
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:00 pm.
Correo electrónico: socialmariapaz1708@gmail.com
Teléfono: 3005250716

Información al ciudadano

Dirección: CL 33 S 85 16
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Correo electrónico: puntoidu.tacgrupo3@ohl.com.co
Teléfono: 4808064

Contacto virtual clic aquí

Registro fotográfico





Nombre del proyecto

Troncal Avenida 68 Grupo 1 - Autop. Sur a Cll. 18 Sur - Construcción

Fecha de actualización: 26/08/2024

Avance programado: 47,34%

Avance ejecutado: 42,83%

Estado del contrato: EN EJECUCION

Alcance del proyecto

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CALLE 18 SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Construir Km de troncal	2.83 Km

Contrato: IDU-345-2020



Tipo	Cantidad
Construir Km de troncal	2.83 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	22.49 Km_Carril
Construir m2 de Espacio Público	63931.38 m2
Construir Km de Ciclorruta	1.83 Km
Construir Puentes vehiculares	1.0 Unidades
Implementar cicloparqueaderos	0.0 Unidades
Construir cicloestaciones	1.0 Unidades
Construir Km-Carril de carril de Transmilenio	10.11 Km_Carril
Construir m2 de zona verde	23604.46 m2
Construir Estaciones bidireccionales	3.0 Unidades
Construir Taquillas	11.0 Unidades
Intersección semaforizada	5.0 Unidades

Contrato: IDU-345-2020



Información contractual

Número de contrato: IDU-345-2020
Tipo: Contrato de Obra
Contratista: CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68
Valor total: \$ 381.312.911.935,00
Fecha de inicio: 25/06/2020
Fecha de finalización: 24/02/2031
Empleos generados: 382

Número de contrato: IDU-599-2020
Tipo: Consultoría (Interventoría)
Contratista: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A
Valor total: \$ 37.724.113.788,00
Fecha de inicio: 25/06/2020
Fecha de finalización: 24/02/2031
Empleos generados: 13

En qué se trabaja

- PAVIMENTOS SECTOR 1 DEL K+000 AL K0+650 COSTADO OCCIDENTAL: * Carriles MIXTOS 1 y 2, K0+090 al K0+100, extendida y compactación de material de fresado para sello de rajón. Carriles MIXTOS, K0+270 a K0+250, excavación mecánica para estructura de calzada. Carril MIXTO, K0+250, K0+300, demolición manual de carpeta asfáltica para nivelación de pozo de inspección. Carril BRT 1, K0+390, se realizan ensayos de "Péndulo británico", sobre losas de pavimento rígido. Carriles MIXTOS, K0+250, K0+263, K0+270, imprimación, sectores con cruces de redes - ESPACIO PUBLICO FRENTE # 1 SECTOR 1 DEL K0+202 AL K0+283 DEL EJE 2 Y DEL K0+000 AL K0+ 650 COSTADO OCCIDENTAL. - K0+330; realiza reparación de sardinel A 10 en calzada mixta. - Realiza trabajo en adecuación de rampa de ingreso a general de aceros k+435. - k+080 remates de paños de adoquín sobre el sendero peatonal. - K0+380 remates de emboquillada de sardinel A 10. - K0+130 llenos con material PEA zona de espacio público frente Nova casa - K0+160 al



Nombre del proyecto

Calles comerciales a cielo abierto - Localidad de K nnedy - Dise os y construcci n

Fecha de actualizaci n: 29/07/2024

Avance programado: 7,12%

Avance ejecutado: 7,35%

Estado del contrato: SUSPENDIDO

Alcance del proyecto

INTERVENCI N DE LA CALLE 45 SUR ENTRE CARRERAS 72 U BIS Y 72 I

Metas f sicas

Tipo	Cantidad
Construir m2 de Espacio P�blico	28453.0 m2
Dise�o	1.0 Unidades

Contrato: IDU-1625-2019



Diseño

1.0 Unidades

Información contractual

Número de contrato: IDU-1625-2019
Tipo: Contrato de Obra
Contratista: CONSORCIO GAMA EP II
Valor total: \$ 22.331.087.612,00
Fecha de inicio: 19/02/2020
Fecha de finalización: 12/04/2026
Empleos generados: 12

Número de contrato: IDU-1645-2019
Tipo: Consultoría (Interventoría)
Contratista: CONSORCIO GEOTERRA G&T
Valor total: \$ 2.670.491.548,00
Fecha de inicio: 19/02/2020
Fecha de finalización: 12/04/2026
Empleos generados: 8

En qué se trabaja

Proceso de trámite de No Objeción Definitiva del Producto Diseño de Redes de Acueducto y Alcantarillado ante el tercero Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y revisión de meta física del Contrato de Obra.

Información Financiera

Contrato: IDU-346-2020



Información contractual

Número de contrato:	IDU-346-2020
Tipo:	Contrato de Obra
Contratista:	CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68
Valor total:	\$ 292.993.429.408,00
Fecha de inicio:	26/06/2020
Fecha de finalización:	25/02/2030
Empleos generados:	213

Número de contrato:	IDU-600-2020
Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	CONSORCIO SUPERVISOR AV 68
Valor total:	\$ 29.495.419.467,00
Fecha de inicio:	26/06/2020
Fecha de finalización:	25/02/2030
Empleos generados:	45

En qué se trabaja

-- En el puente elevado de la intersección de la Calle 3 con Av. Carrera 68. Se realizan actividades en zona de espacio público; Excavación mecánica, instalación de geotextil, instalación de SBG-C reciclada, instalación de prefabricados A-10, instalación de adoquín en concreto, loseta táctil y guía. - - Box culvert canal Fucha Se continua con la construcción de los pilotes pre excavados. - - Box culvert canal Comuneros Se continua con la construcción de los pilotes pre excavados. - - Sector 2 A (Calle 1 – Calle 3) Se continua con la conformación de espacio público; excavación mecánica, instalación de Geotextil instalación de SBG-C reciclada, instalación de adoquín en concreto, loseta táctil y guía. Por último, se continua con la instalación de redes secas. - - Sector 3 (Calle 3 – Av. Americas) Se realiza construcción de cajas eléctricas. - - Sector 4 (Calle 18 sur a Calle 3 Sur). Se realizan actividades redes húmedas;

Contrato: IDU-346-2020



Tipo	Cantidad
Construir Km de troncal	1.78 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	14.3 Km_Carril
Construir m2 de Espacio Público	43083.23 m2
Construir Km de Ciclorruta	1.23 Km
Construir Puentes vehiculares	1.0 Unidades
Construir Puentes peatonales	4.0 Unidades
Implementar cicloparqueaderos	0.0 Unidades
Construir Estaciones bidireccionales	3.0 Unidades
Construir cicloestaciones	3.0 Unidades
Construir Km-Carril de carril de Transmilenio	7.14 Km_Carril
Construir m2 de zona verde	21066.37 m2
Construir Taquillas	11.0 Unidades
Intersección semaforizada	2.0 Unidades



Contrato: IDU-346-2020

Nombre del proyecto

Troncal Avenida 68 Grupo 2 - Cll. 18S a Av. de las Américas - Construcción

Fecha de actualización: 26/08/2024

Avance programado: 68,5%

Avance ejecutado: 51,07%

Estado del contrato: EN EJECUCION

Alcance del proyecto

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE CALLE 18 SUR HASTA LA AVENIDA AMÉRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Construir Km de troncal	1.78 Km

Contrato: IDU-347-2020

Información contractual

Número de contrato:	IDU-347-2020
Tipo:	Contrato de Obra
Contratista:	CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68
Valor total:	\$ 206.413.520.077,00
Fecha de inicio:	25/06/2020
Fecha de finalización:	24/04/2031
Empleos generados:	459

Número de contrato:	IDU-601-2020
Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	CONSORCIO CJ 2020
Valor total:	\$ 32.909.518.838,00
Fecha de inicio:	25/06/2020
Fecha de finalización:	24/04/2031
Empleos generados:	42


En qué se trabaja

- Sector 1: excavación de zanja para tubería de 6" redes Enel, excavación y construcción caja domiciliaria red sanitaria, ensayo densidad capa SBG-PEA para conformación estructura espacio público, instalación de adoquín y tableta, amarre acero refuerzo y fundida rampa acceso a predio Terpel, instalación capa fresado y ensayo de densidad para estructura espacio público. - Sector 3: instalación de rajón reciclado para mejoramiento de subrasante entre abscisas. - Sector 4: amarre acero refuerzo parrillas para fundida losas en MR-45. - Sector 5: excavación y construcción de cárcamo para tubería 12" red pluvial, construcción de cárcamo para tubería de 6" redes Enel, adecuación desvío, instalación capa MD-20 para adecuación desvío vehicular. - Sector 7: emboquillado de bordillo A-80 para conformación estructura espacio público, céreo y compactación capa SBG-PEA, fundida rampa de acceso #2 en

Contrato: IDU-347-2020



Tipo	Cantidad
Construir Km de troncal	1.04 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	7.38 Km_Carril
Construir m2 de Espacio Público	23911.37 m2
Construir Km de Ciclorruta	0.843 Km
Construir Puentes peatonales	1.0 Unidades
Implementar cicloparqueaderos	0.0 Unidades
Construir cicloestaciones	1.0 Unidades
Construir Km-Carril de carril de Transmilenio	5.06 Km_Carril
Construir m2 de zona verde	7228.66 m2
Construir Estaciones bidireccionales	1.0 Unidades
Construir Taquillas	4.0 Unidades
Construir Deprimido	1.0 Unidades
Intersección semaforizada	1.0 Unidades



Nombre del proyecto

Troncal Avenida 68 Grupo 3 - Av. de las Américas a Av. Centenario - Construcción

Fecha de actualización: 26/08/2024

Avance programado: 42,59%

Avance ejecutado: 41,51%

Estado del contrato: EN EJECUCION

Alcance del proyecto

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA AMÉRICAS HASTA LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Construir Km de troncal	1.04 Km

Gracias

