

Instituto de Desarrollo Urbano

Rendición de cuentas localidad Usme

Rendición de cuentas nodo Movilidad

23 / 07 / 25

CONTENIDO

1 Presentación IDU

- Diagnóstico vial de la localidad
- Información general de los proyectos IDU en la localidad
- Etapa de construcción
- Etapa de EyD
- Etapa de conservación
- Preguntas e inquietudes

2 Presentación UMV

- Información general de proyectos UMV en la localidad
- Etapa de conservación
- Etapa de Tapahuecos
- Diagnóstico vial

3 Diálogo con la comunidad



Política Antisoborno



Política Antisoborno

 denuncia.soborno@idu.gov.co

El Instituto de Desarrollo Urbano estableció una estrategia que busca prevenir, detectar y enfrentar el soborno. Por medio de varios lineamientos institucionales se fortalece la cultura de transparencia entre todos los servidores públicos del IDU.

Para garantizar la debida ejecución de los recursos públicos que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, el IDU implementa la política antisoborno. A través de este abecé, usted conocerá en qué consiste esta estrategia y cómo puede tramitar una denuncia en caso de sospechar de una conducta indebida.



Diagnóstico


idu
Instituto de
DESARROLLO URBANO




INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO




INVENTARIO ESTADO CICLORRUTAS

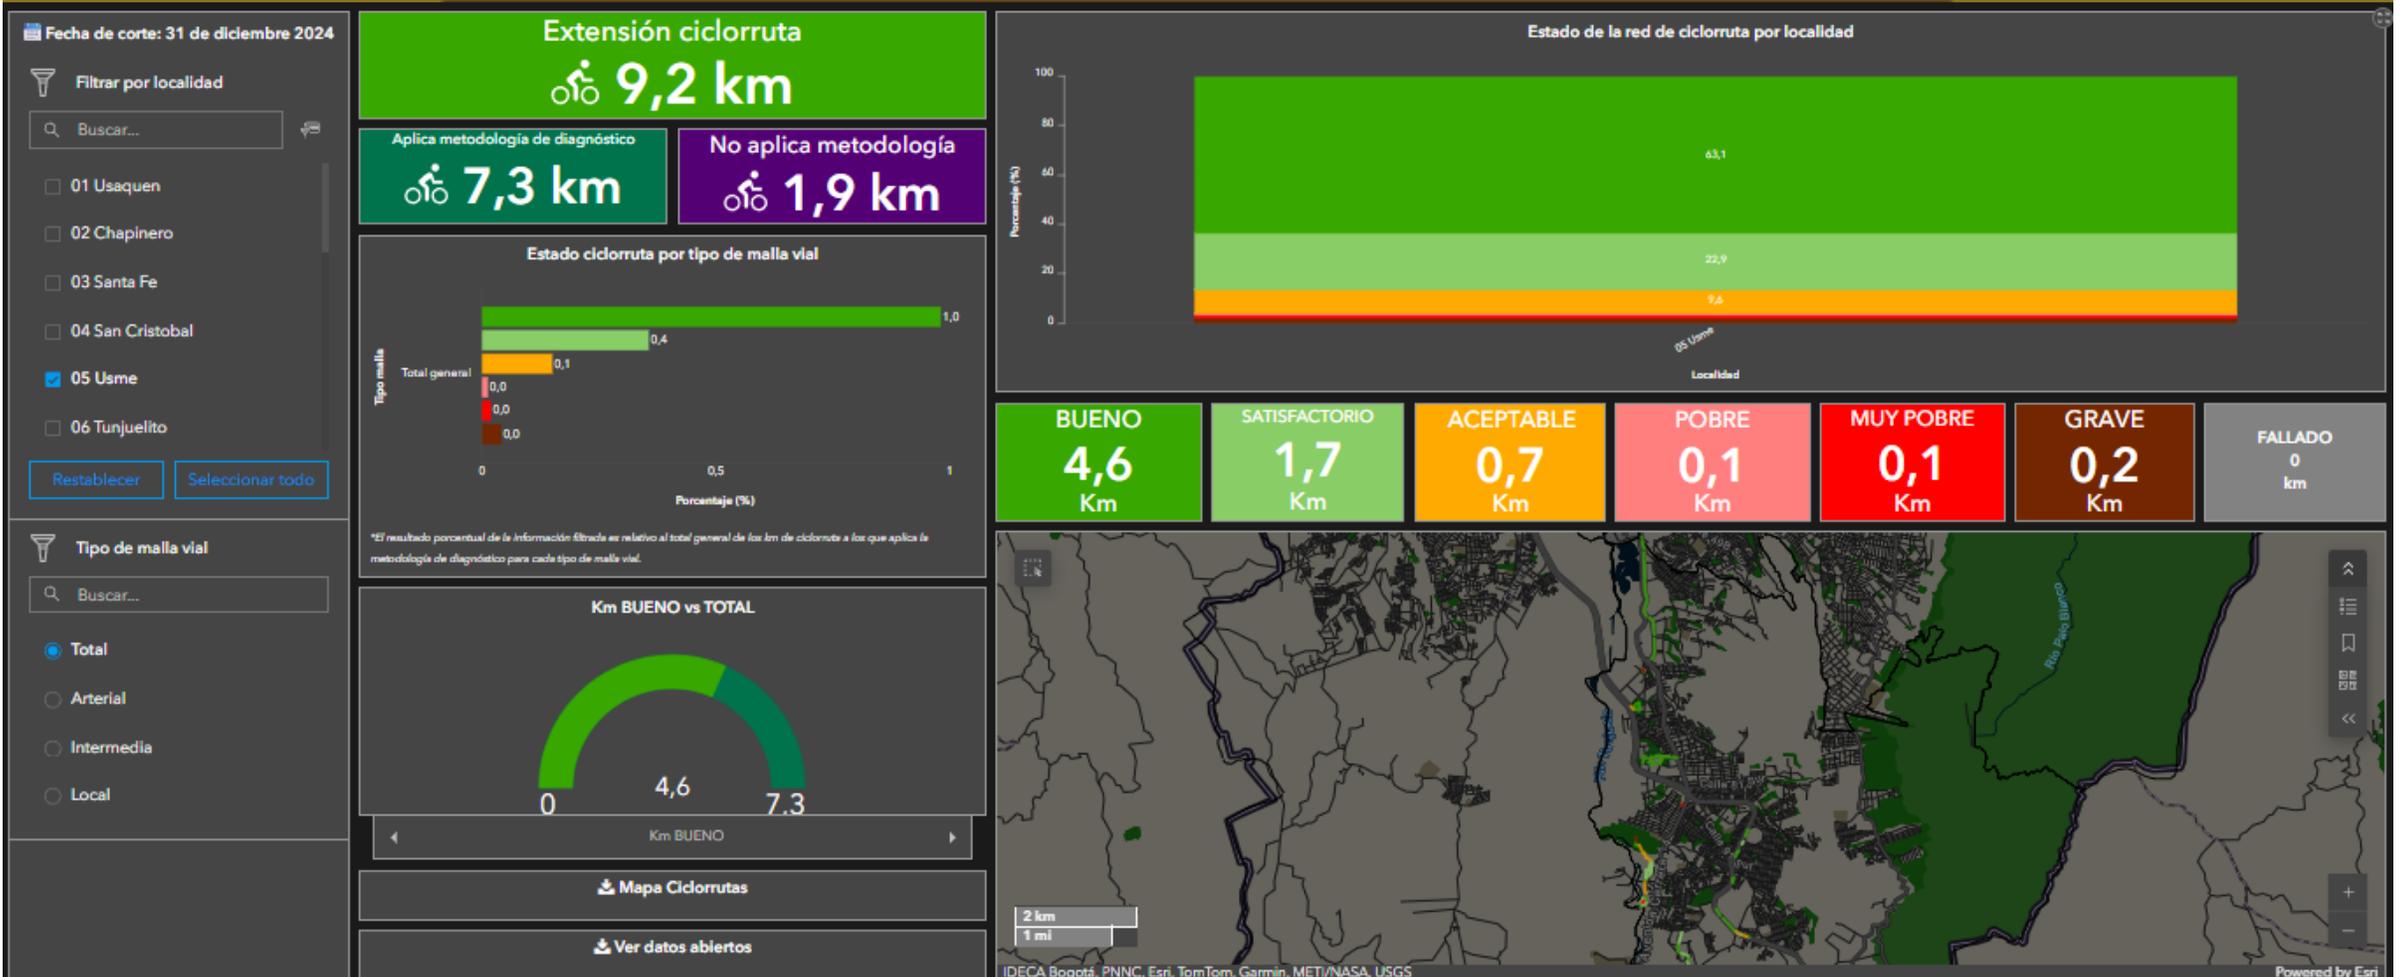


INVENTARIO DE ESTADO ESPACIO PÚBLICO- ANDENES

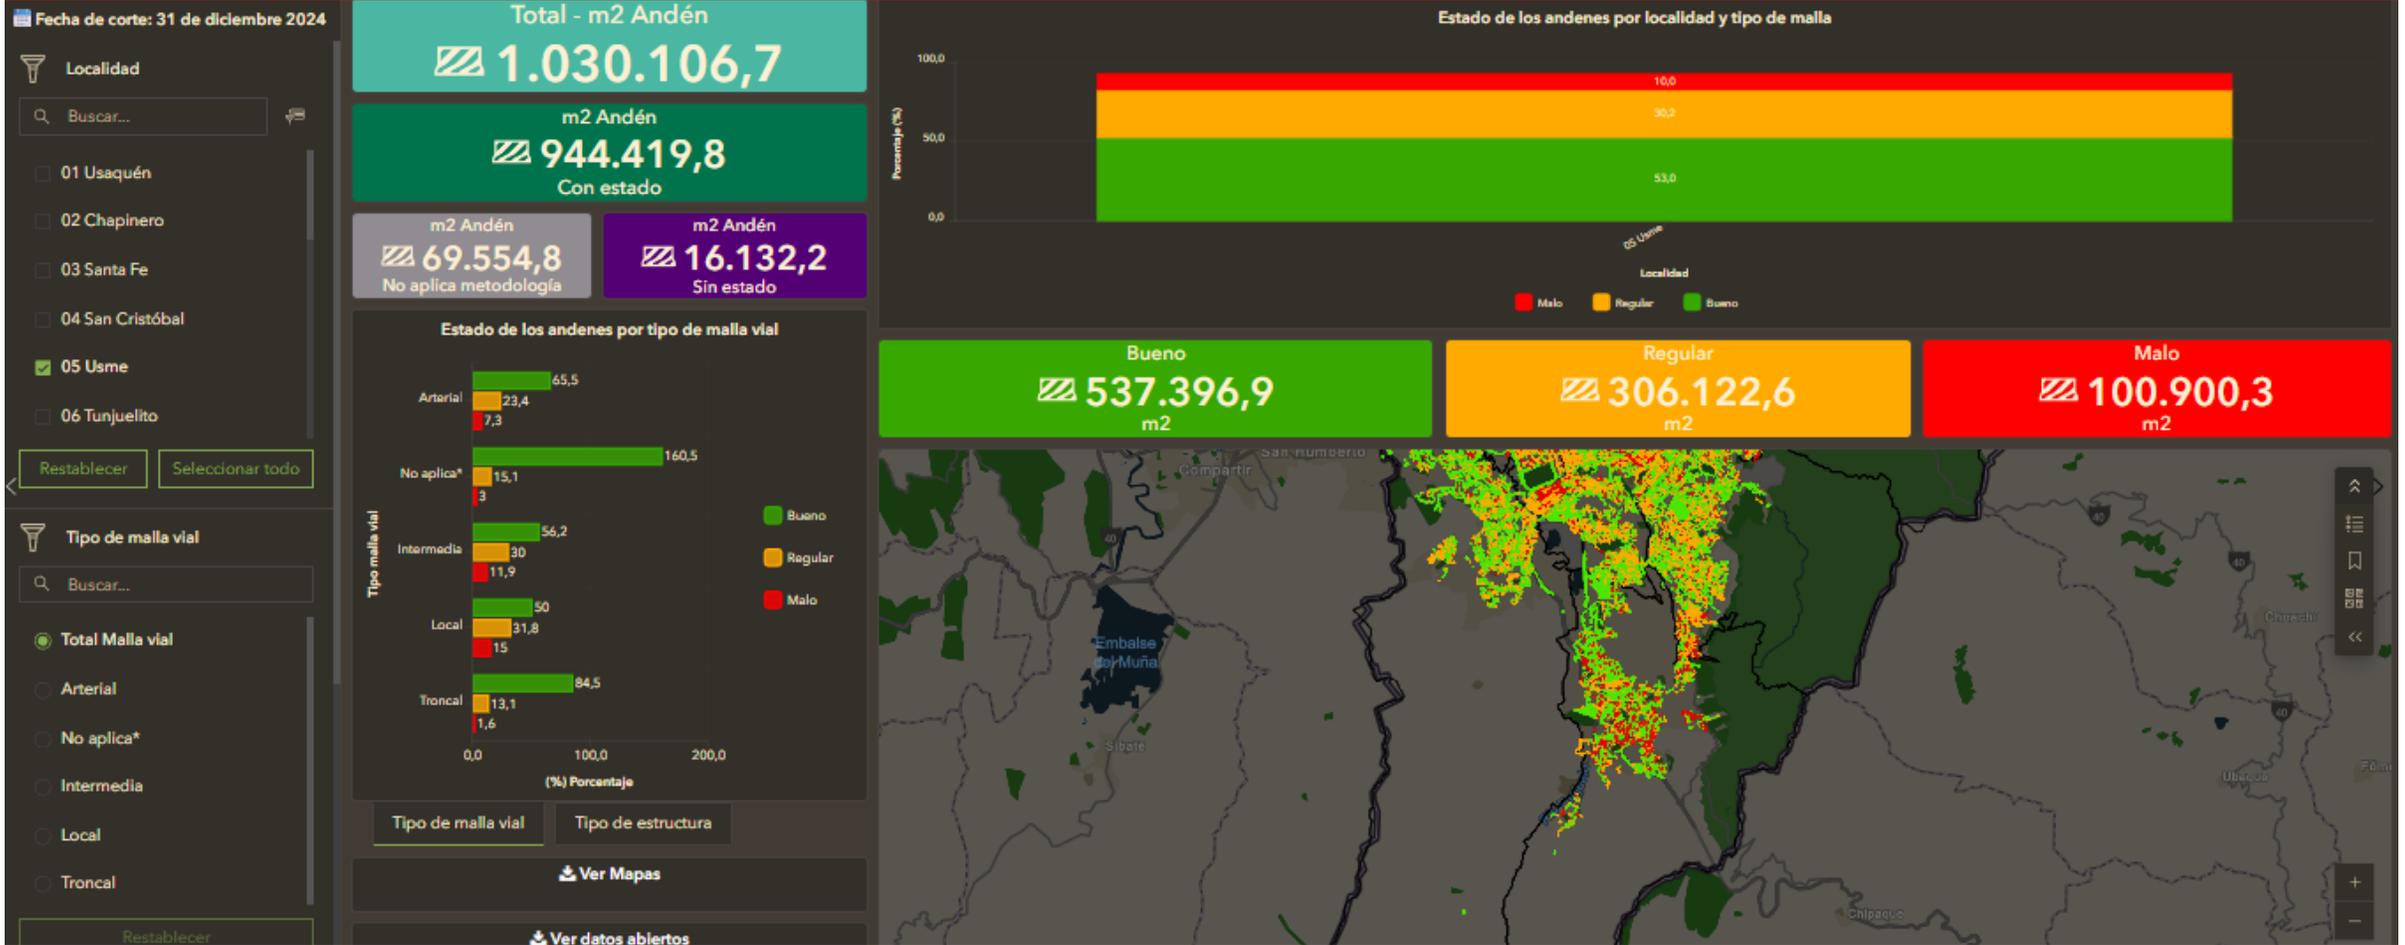



INVENTARIO DE MALLA VIAL RURAL

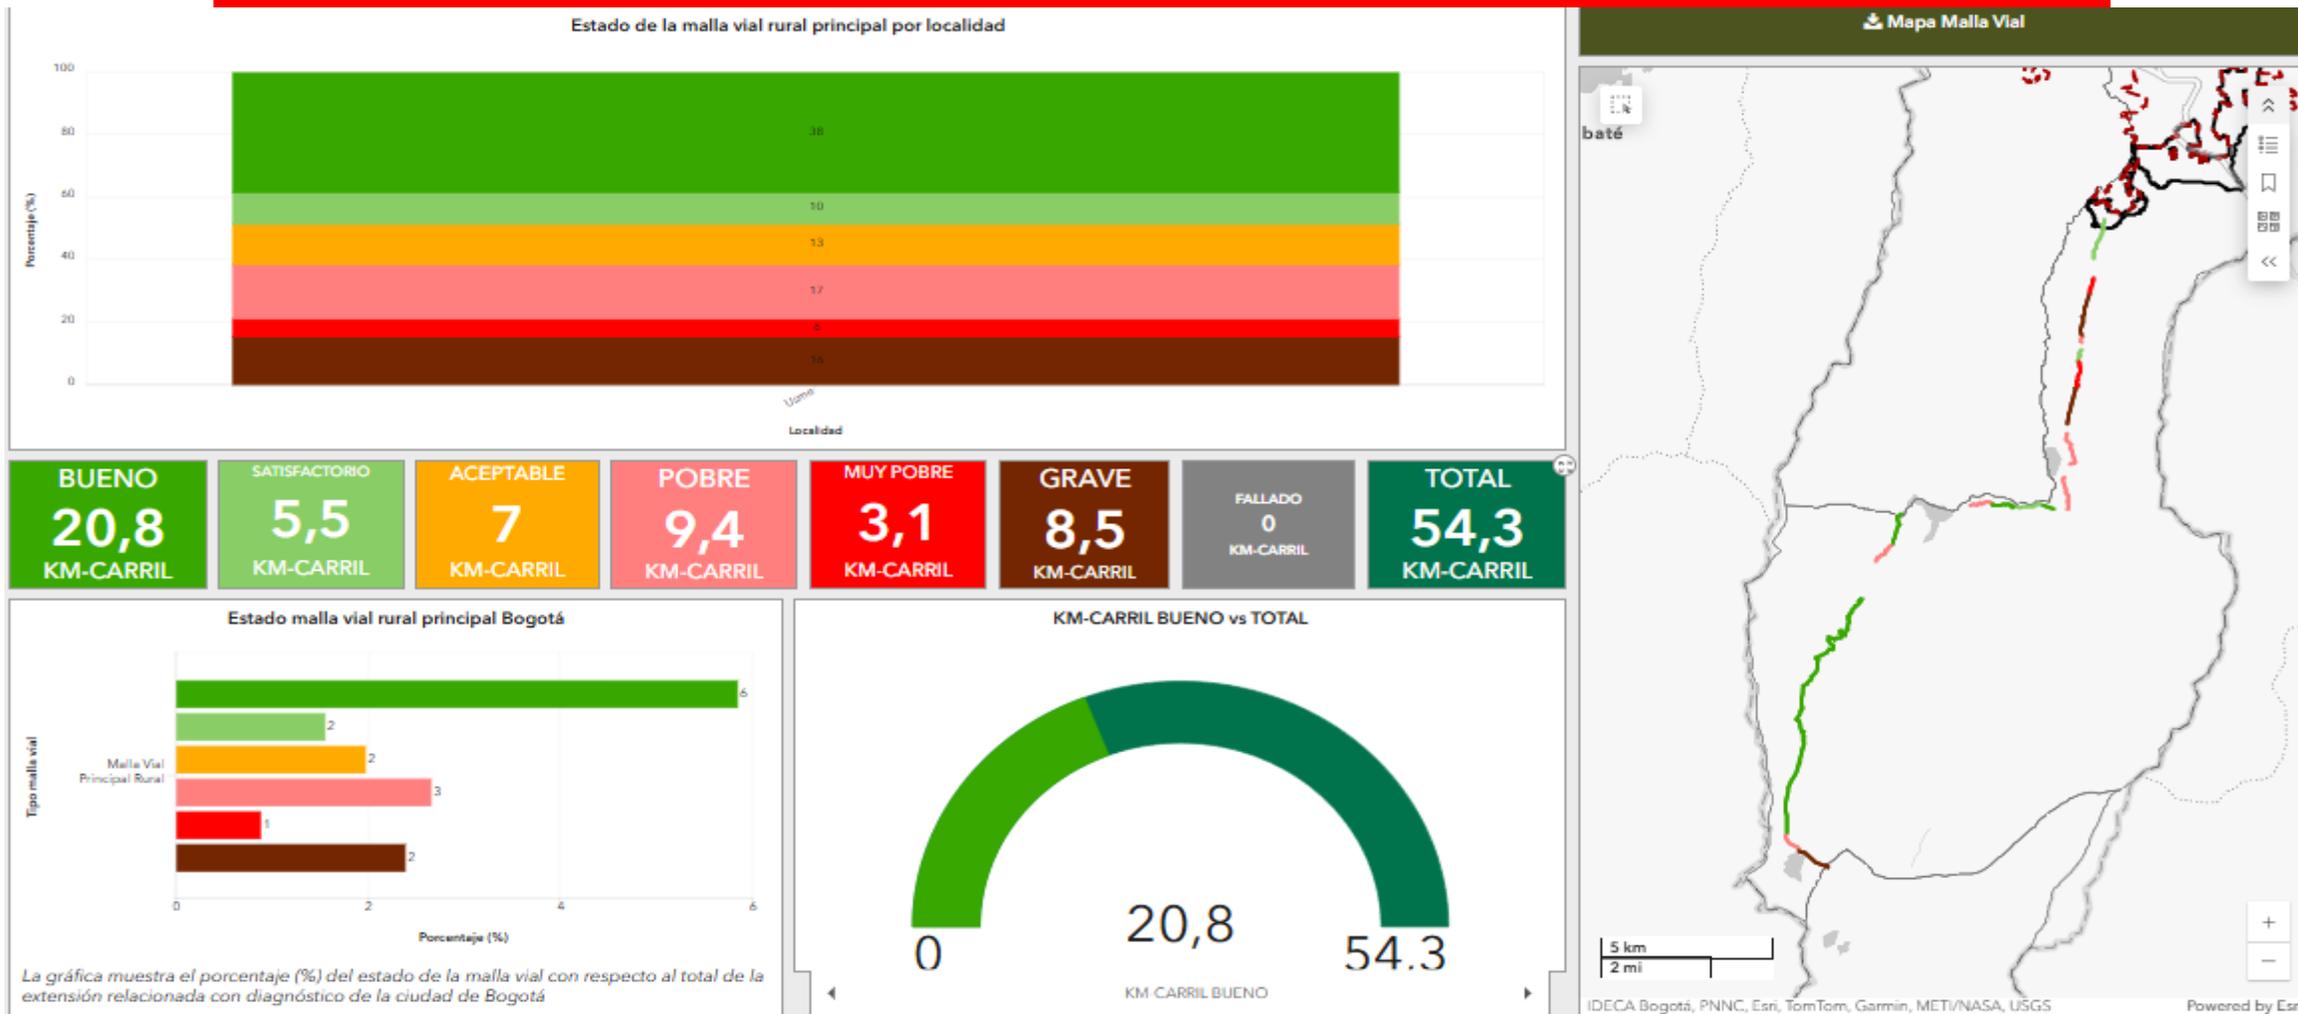

INVENTARIO DE MALLA VIAL TRONCAL

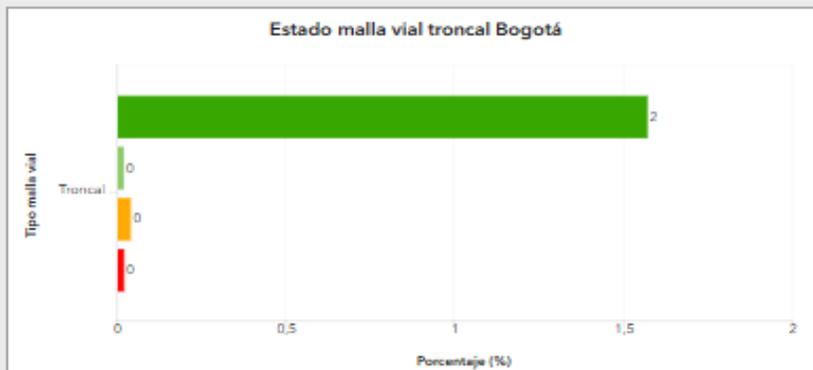

La gráfica muestra el porcentaje (%) del estado de la malla vial con respecto al total de la extensión relacionada con diagnóstico de la ciudad de Bogotá

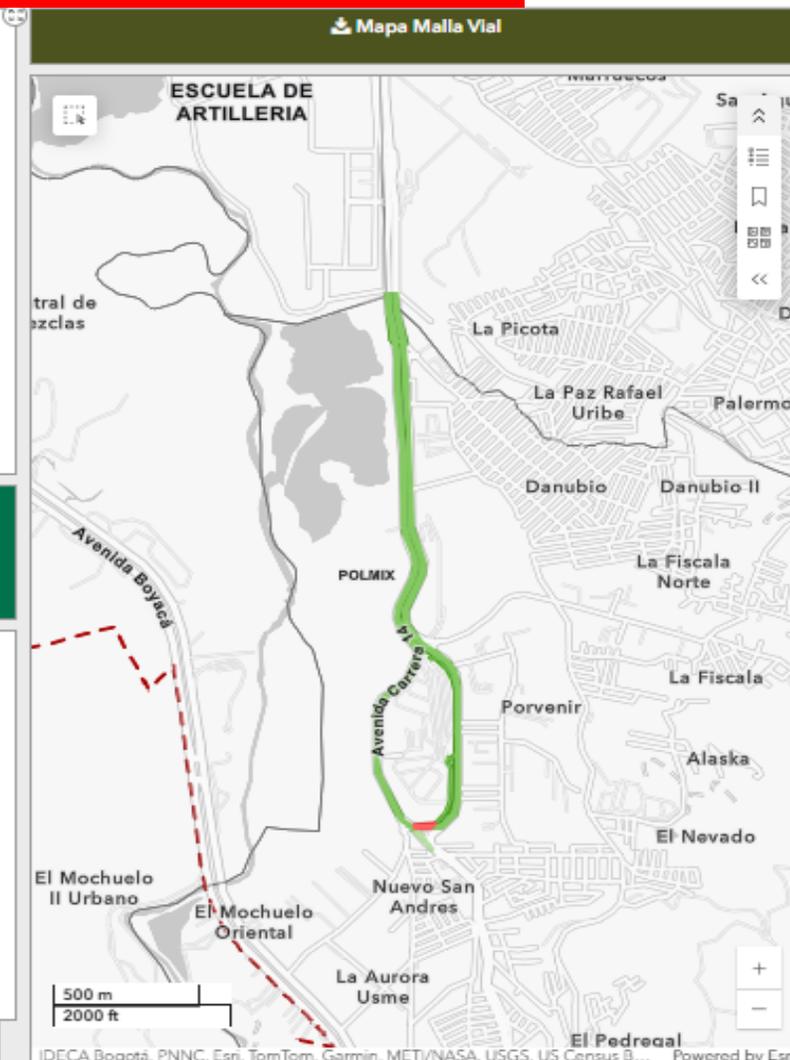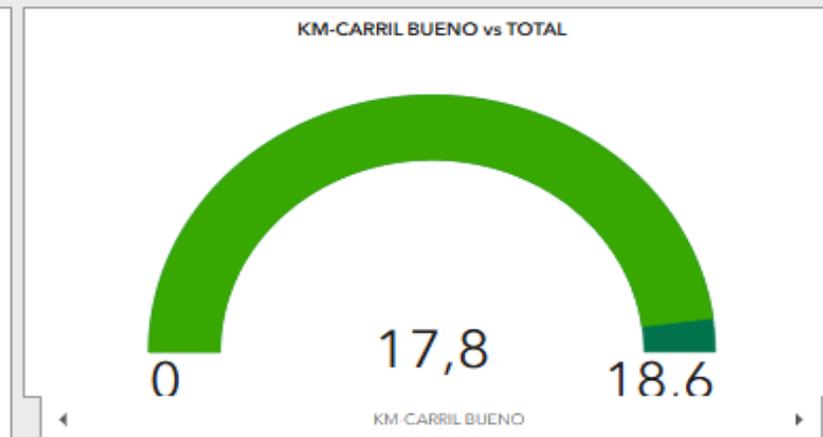

INVENTARIO DE MALLA VIAL

Malla vial Bogotá

▲ 18,6
Km-carril

Con estado

18,6
Km-carril

Sin estado

0.0
Km-carril

Malla vial Urbana

▲ 18,6
Km-carril

Malla vial Rural

0.0
Km-carril


% Km-carril total malla vial urbana



% Km-carril total malla vial rural

0.0

Extensión total por tipo de malla vial

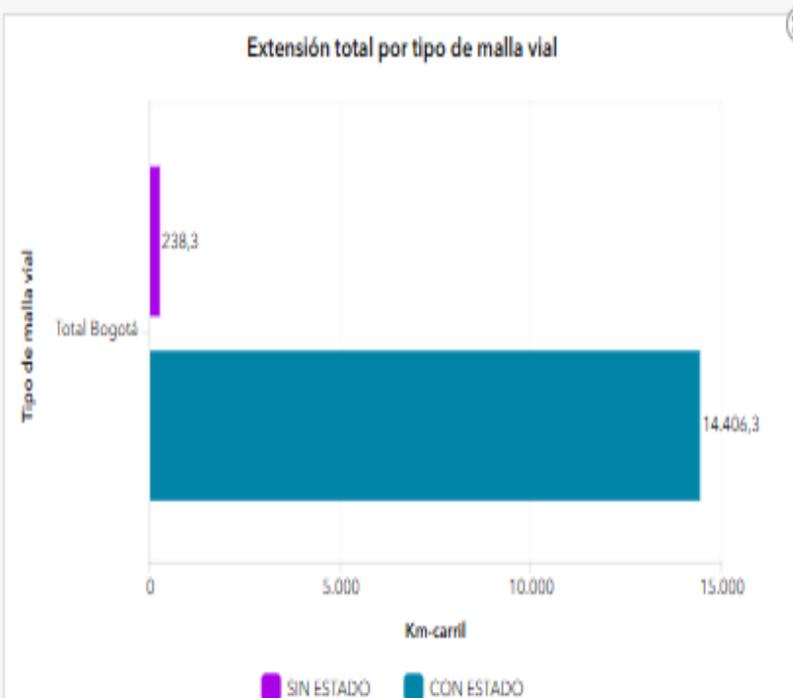



Contratos

idu
Instituto de
DESARROLLO URBANO



INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO





Conservación Malla Vial Rural - Vigencia 2021 - Grupo 3

Fecha de actualización: 16/08/2024

Avance programado: 100,0%

Avance ejecutado: 95,0%

Estado del contrato: TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION

Alcance del proyecto

Conservación Malla Vial Rural - Vigencia 2021 - Grupo 3

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Mantener Km-carril de Malla Vial Rural	110.55 Km_Carril

Información contractual

Número de contrato: IDU-1742-2021
Tipo: Contrato de Obra
Contratista: CONSORCIO VIAL SANTA FE IBI
Valor total: \$ 26.904.386.773,00
Fecha de inicio: 17/05/2022
Fecha de finalización: 20/08/2024
Empleos generados: 0

Número de contrato: IDU-1740-2021
Tipo: Consultoría (Interventoría)
Contratista: HMV PROYECTOS SAS
Valor total: \$ 2.687.354.832,00
Fecha de inicio: 17/05/2022
Fecha de finalización: 16/08/2024
Empleos generados: 0

Malla vial Localidad de Usme - Actualización Estudios y diseños y Construcción

Fecha de actualización: 30/06/2025

Avance programado: 73,88%

Avance ejecutado: 18,0%

Estado del contrato: SUSPENDIDO

Alcance del proyecto


ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE USME

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Diseño	2.0 Unidades

Información contractual

Número de contrato:	IDU-1784-2021	Número de contrato:	IDU-1797-2021
Tipo:	Contrato de Obra	Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	INFERCAL S.A	Contratista:	CONSORCIO DISEÑOS VIAL CAJ
Valor total:	\$ 15.658.095.207,00	Valor total:	\$ 2.456.088.794,00
Fecha de inicio:	25/01/2022	Fecha de inicio:	25/01/2022
Fecha de finalización:	13/02/2026	Fecha de finalización:	13/02/2026
Empleos generados:	28	Empleos generados:	24

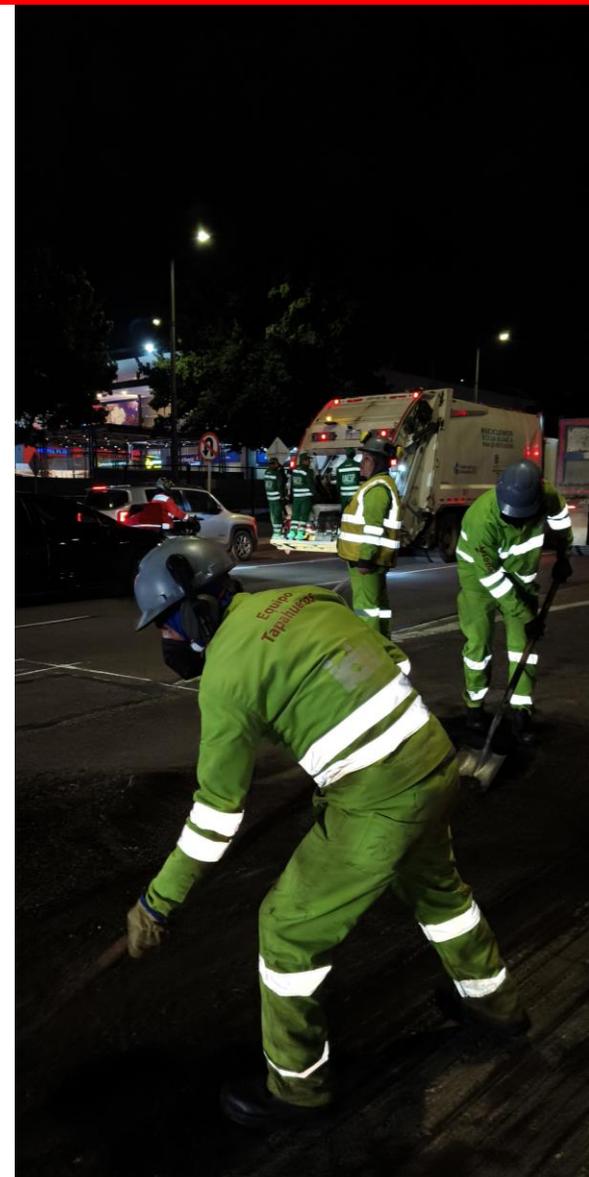



Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme - Construcción

Fecha de actualización: 11/06/2025

Avance programado: 86,45%

Avance ejecutado: 86,4%

Estado del contrato: EN EJECUCION



Alcance del proyecto

El proyecto contempla la construcción de las obras de infraestructura para la movilidad requeridas para la adecuación de la Extensión Troncal Caracas, desde el sector comprendido entre la actual estación Molinos y el Portal de Usme. Las obras contemplan la construcción de dos carriles exclusivos para el Sistema Transmilenio, la construcción de la estación alimentadora Molinos y una nueva estación en el sector Danubio y obras complementarias.

Información contractual

Número de contrato: IDU-1601-2019
Tipo: Contrato de Obra
Contratista: CONSORCIO CARACAS SUR
Valor total: \$ 281.009.395.610,00
Fecha de inicio: 26/12/2019
Fecha de finalización: 11/09/2029

Número de contrato: IDU-1605-2019
Tipo: Consultoría (Interventoría)
Contratista: CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS
Valor total: \$ 27.323.477.987,00
Fecha de inicio: 26/12/2019
Fecha de finalización: 11/09/2029

Sitios inestables Grupo D - Diagnóstico, Diseños y Construcción

Fecha de actualización: 07/07/2025

Avance programado: 85,0%

Avance ejecutado: 14,0%

Estado del contrato: EN EJECUCION

Alcance del proyecto

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO D

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Mantener m2 de Punto Crítico	23491.56 m2

Información contractual

Número de contrato: IDU-1775-2023
Tipo: Contrato de Obra
Contratista: CONSORCIO ESTABILIZACION AMJ
Valor total: \$ 11.192.188.083,00
Fecha de inicio: 15/05/2024
Fecha de finalización: 19/09/2025
Empleos generados: 29

Número de contrato: IDU-1799-2023
Tipo: Consultoría (Interventoría)
Contratista: CONSORCIO URBANO 2C
Valor total: \$ 2.284.021.050,00
Fecha de inicio: 15/05/2024
Fecha de finalización: 04/09/2025
Empleos generados: 16



PROYECTOS

Objeto del contrato	Información contractual	Estado
CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	<p>Número de contrato IDU-1712-2020 (TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION) Tipo Contrato de Obra Etapa Proyecto Preliminares - Construcción – Recibo Contratista PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S Total Contrato \$ 184.598.888.525,00 Fecha de Inicio 08/02/2021 Fecha de Finalización 02/10/2024</p> <p>Número de contrato IDU-1723-2020 (TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION) Tipo Consultoría (Interventoría) Etapa Proyecto Preliminares - Construcción – Recibo Contratista CONSORCIO VGM Total Contrato \$ 11.665.875.714,00 Fecha de Inicio 08/02/2021 Fecha de Finalización 02/10/2024</p>	Terminado y en proceso de liquidación

PROYECTOS

Objeto del contrato	Información contractual	Estado
<p>CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA HOYA DEL RAMO, SECTOR CUATRO CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.</p>	<p>IDU-1705-2022 (TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION) Tipo Contrato de Obra Etapa Proyecto: Contratación – Preconstrucción_ Construcción Contratista CONSTRUCCIONES CIVILES JFM SAS Total Contrato\$ 3.871.292.506,00 Fecha de Inicio15/06/2023 Fecha de Finalización13/12/2024</p> <p>IDU-1462-2023 (TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION) Tipo Consultoría (Interventoría) Etapa Proyecto Contratación - Preconstrucción – Construcción Contratista CONSORCIO PUENTE 4 Total Contrato\$ 2.075.134.149,00 Fecha de Inicio15/06/2023 Fecha de Finalización24/12/2024</p>	<p>Terminado y en proceso de liquidación</p>



Gracias

Síguenos en nuestras redes sociales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO

