




**METRO
BOGOTÁ**

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2026


RENDICION DE CUENTAS LOCALIDAD KENNEDY



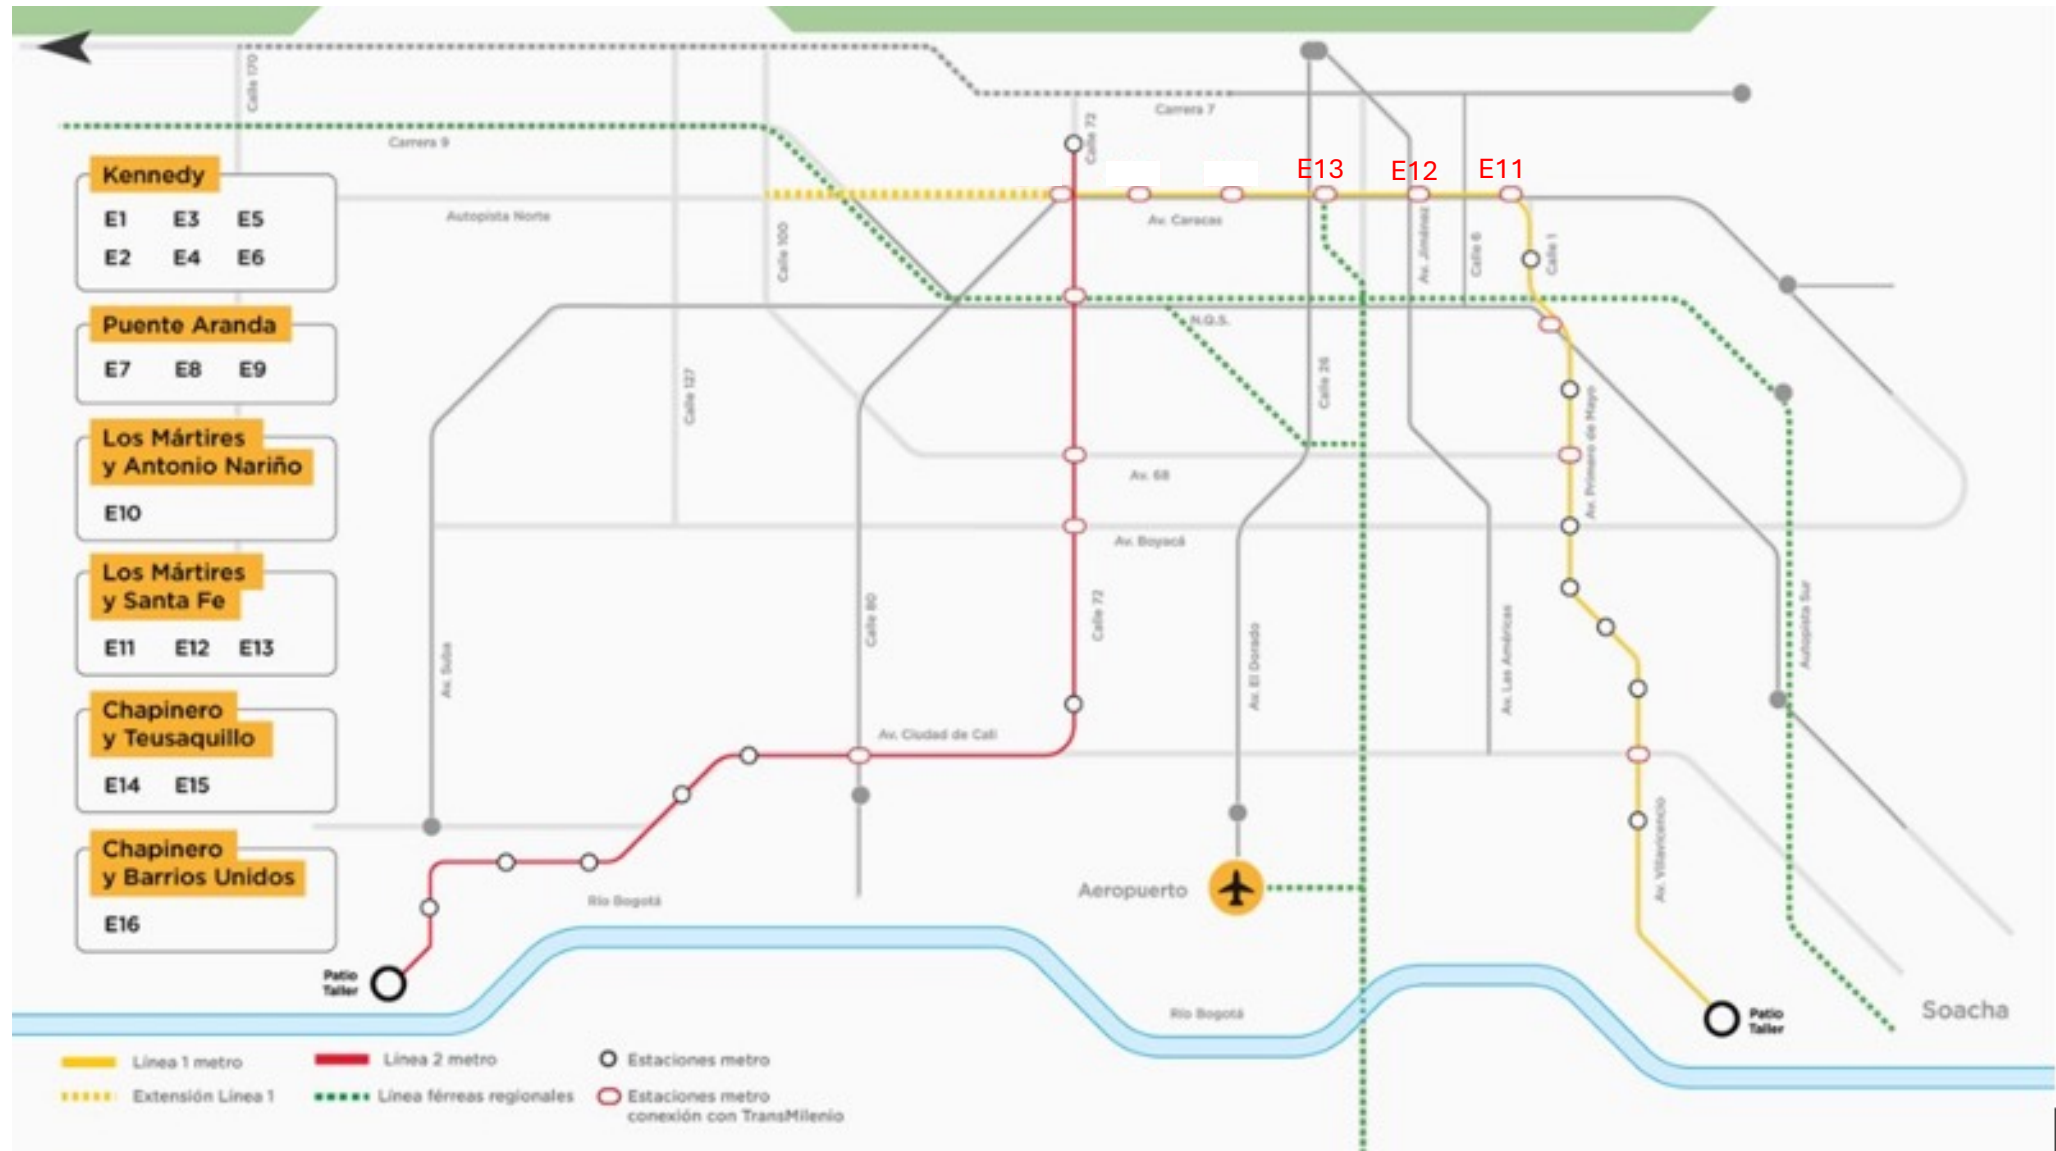

Línea 1 del Metro de Bogotá - Características

Integración con la bicicleta




19 km

Ciclorrutas



9,750

Cupos de
cicloparqueaderos



23,96 km

Longitud




100%

Viaducto




16

Estaciones




10

Estaciones integradas
con TransMilenio



12

Estaciones con
edificios laterales de
acceso




28

Edificios de acceso



Nuevo espacio público



1'348.106 m2


Espacio público renovado.
Estas áreas incluyen andenes, separadores,
parques, ciclorrutas, vías, vías de TransMilenio



94.856 m2

Espacio público generado.
Incluye estaciones y bienes fiscales en todo
el proyecto

Línea 1 del Metro de Bogotá - Características



4

Estaciones
convencionales



1.050.000

Capacidad
pasajeros día




43 km/h

Velocidad comercial



100%

Eléctrico



72.000 pax

Capacidad
máxima hora /
sentido



30

Trenes al inicio de
operación



2,92 millones

Habitantes
beneficiados con el
proyecto



90 seg

Intervalo mínimo
en hora pico



9 localidades

Bosa, Kennedy, Puente
Aranda, Antonio Nariño, Santa
Fe, Mártires, Teusaquillo,
Chapinero y Barrios Unidos



88%

Pertenecen a
estratos 1,2 y 3



80 km/h

Velocidad máxima de
operación



27 minutos

Tiempo de viaje entre
portal Américas y calle 72

El Metro de Bogotá será



Un sistema de transporte sostenible 100% eléctrico.



Que movilizará a los ciudadanos desde Bosa hasta la avenida Caracas con calle 72 en 27 minutos



Limpio, cómodo, seguro, puntual y frecuente



Con una capacidad de un millón de pasajeros diarios

SIGUIENTE

Frentes de Obra Activos del Viaducto en Av. Caracas WF4 - Sector Santa Fe



Tramo calle 1 Y 6



Tramo calles 6 y 12

Frentes de Obra Activos para el sector Kenedy



Estación 3
Av. Villavicencio entre cras 80G Bis y 80

Frentes de Obra Activos para el sector Kenedy



Estación 4

Av. 1 de Mayo entre calles 42C sur y 42 sur

Frentes de Obra Activos para el sector Kenedy



Estación 5
Av. 1 de Mayo entre calles 40 Sur y 39 Sur

Frentes de Obra Activos para el sector Kenedy



Estación 6

Av. 1 de Mayo entre cras 72M bis y Av. Boyacá

Avance Frentes de Obra Activos WF2 - Sector Kennedy. (corte 31/Mayo/2026)

Avance Viaducto

Viaducto 100% finalizado
Vía Férrea 38% finalizado

Avance Estructura Edificios Estación 3

- **Ascendente:** Estructura 100% terminada, están en actividades de mampostería (estructura metálica de confinamiento y levante de muros), instalación de escaleras mecánicas y redes.
- **Descendente:** Estructura 100% terminada, están en actividades de mampostería (estructura metálica de confinamiento y levante de muros), instalación de escaleras mecánicas y redes.

Avance Estructura Edificios Estación 4

- **Ascendente:** Estructura 100% terminada, están en actividades de mampostería (estructura metálica de confinamiento y levante de muros), instalación de escaleras mecánicas y redes.
- **Descendente:** Estructura 100% terminada, están en actividades de mampostería (estructura metálica de confinamiento y levante de muros), instalación de escaleras mecánicas y redes.

Avance Estructura Edificios Estación 5


- **Ascendente:** Estructura 100% terminada, están en actividades de mampostería (estructura metálica de confinamiento y levante de muros), instalación de escaleras mecánicas y redes.
- **Descendente:** Estructura 100% terminada, están en actividades de mampostería (estructura metálica de confinamiento y levante de muros), instalación de escaleras mecánicas y redes.

Avance Estructura Edificios Estación 6

- **Mezzanine:** Estructura 100% terminada, están en actividades de mampostería (estructura metálica de confinamiento y levante de muros), instalación de escaleras mecánicas y redes.

RESUMEN DEL AVANCE DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO

Según datos del reporte PBI del PMO – fecha de corte: 30 de junio 2026

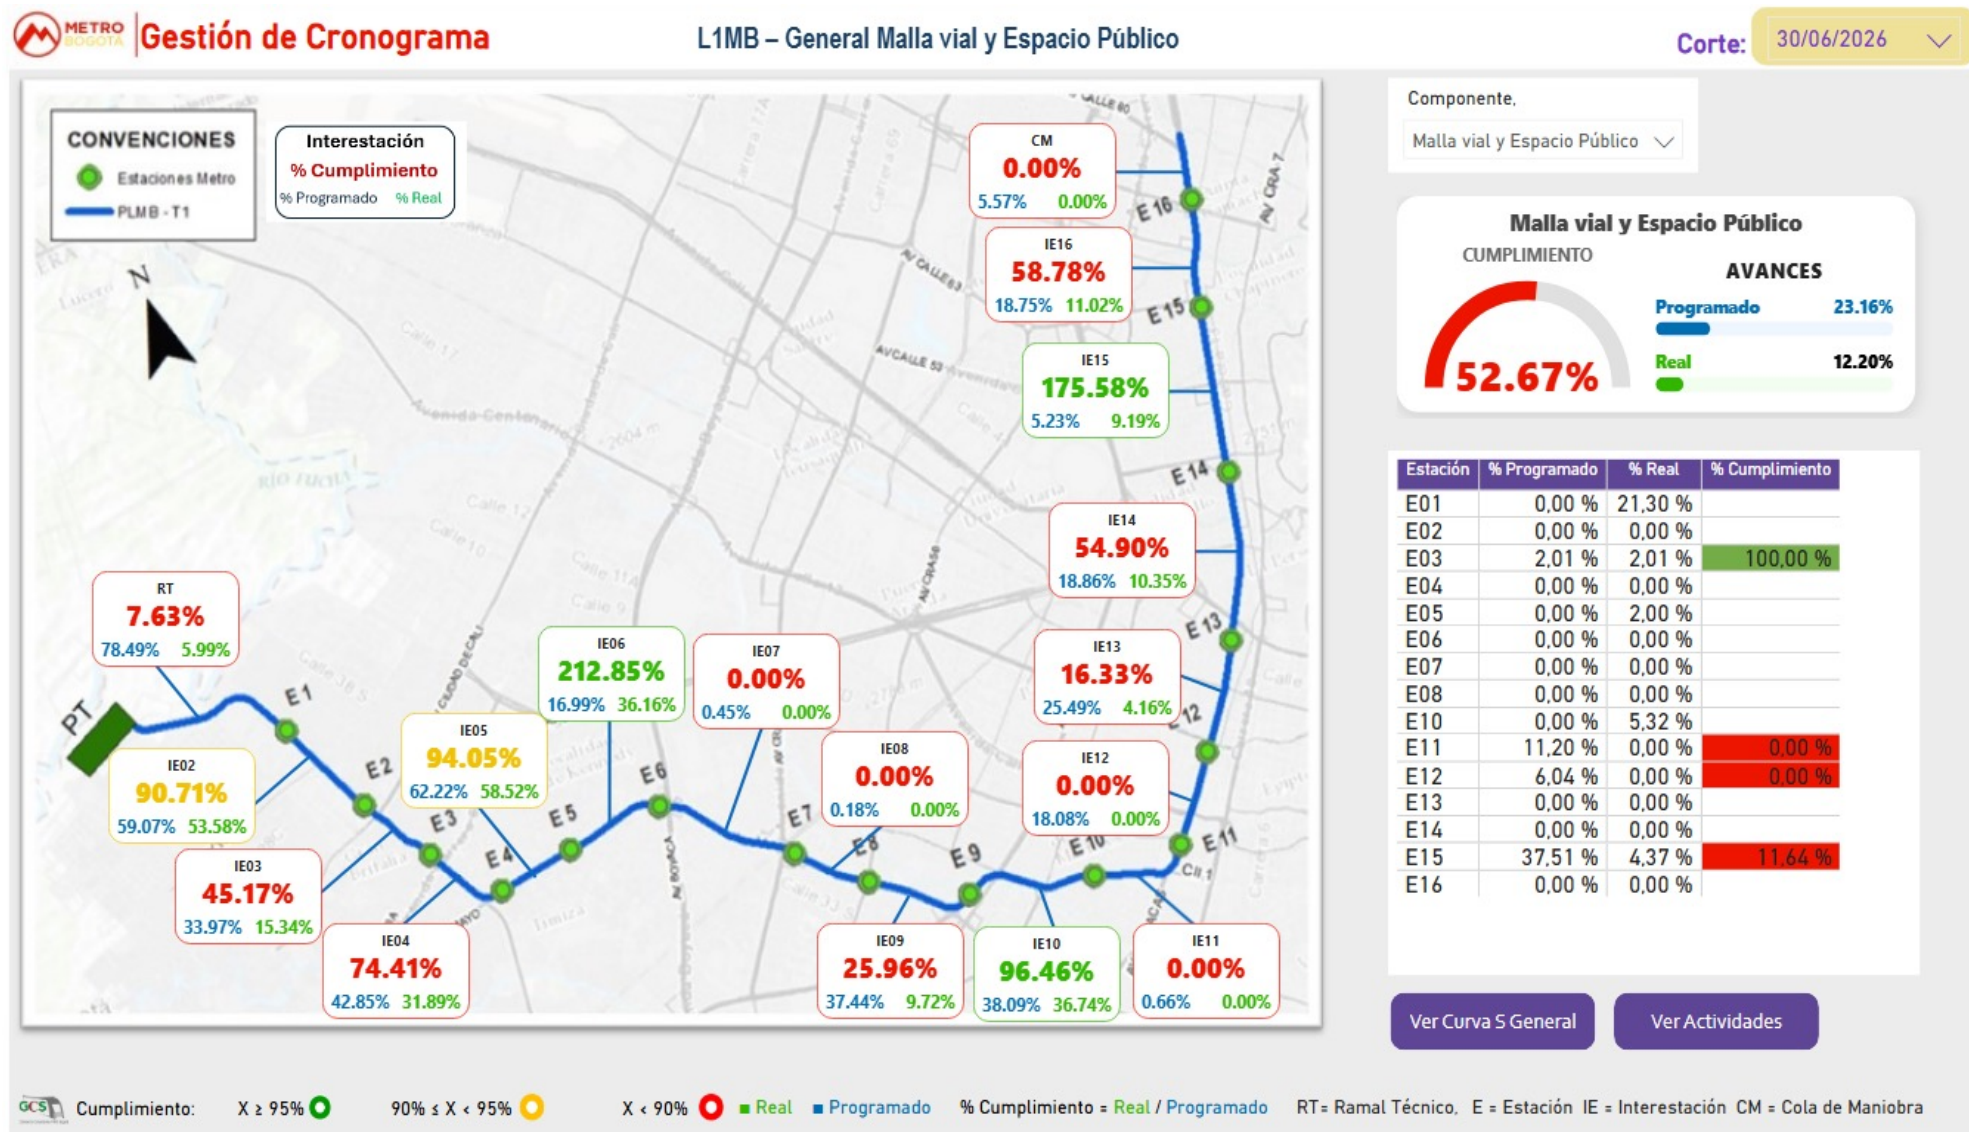

RESUMEN

INTERESTACIONES 17 TOTAL

(15 INTERESTACIONES + RAMAL
TÉCNICO + COLA DE MANIOBRA)

3 INT. ADELANTADAS

2 INT. CUMPLE

12 INT. ATRASADAS

UNIDADES DE EJECUCIÓN 93 TOTAL

27 Malla Vial (UE-206 a UE-232)
66 Espacio Público (UE-233 a UE-298)

5 UE en Plan de Acción Malla Vial
17 UE en Plan de Acción EP


COMPONENTE: MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO



Avance: 30 de junio 2026

AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

RELACIÓN
E/P



52,67%

TOTAL
UE

93

UE EN
EJECUCIÓN

46

UE TERMINADAS

0



INTER-ESTACIÓN 04 – K4+740 a K4+405 (Av. ClI 43 Sur entre Av. Cr. 80 y Cr. 79)

UE-284



COSTADO	ZONA	TIPO	LONGITUD	AVANCE	% AVCE	INICIO
PATIO TALLER	ANDEN	ENE	830 ml	0 ml	0.0%	
PATIO TALLER	ANDEN	ETB	94 ml	0 ml	0.0%	
PATIO TALLER	ANDEN	ACU	295 ml	0 ml	0.0%	
PATIO TALLER	VIA	SAN	235 ml	54 ml	22.8%	27-Aug-25
PATIO TALLER	VIA	PLU	244 ml	90 ml	36,9%	27-Aug-25
CALLE 72	ANDEN	ENE	663 ml	0 ml	0.0%	
CALLE 72	ANDEN	ETB	8 ml	0 ml	0.0%	
CALLE 72	ANDEN	ACU	365 ml	0 ml	0.0%	
CALLE 72	VIA	SAN	18 ml	12 ml	67,00%	27-Aug-25
CALLE 72	VIA	PLU	456 ml	394 ml	86,18%	27-Aug-25
TOTAL		UE284	3,308 ml	550 ml	16.60%	

UE-283

COSTADO	ZONA	TIPO	LONGITUD	AVANCE	% AVCE	INICIO
PATIO TALLER	ANDEN	ENE	684 ml	0 ml	0.0%	
PATIO TALLER	ANDEN	ETB	115 ml	0 ml	0.0%	
PATIO TALLER	ANDEN	ACU	163 ml	0 ml	0.0%	
PATIO TALLER	VIA	SAN	202 ml	0 ml	0.0%	
PATIO TALLER	VIA	PLU	282 ml	137 ml	48,56%	
CALLE 72	ANDEN	ENE	435 ml	0 ml	0.0%	
CALLE 72	ANDEN	ETB	1 ml	0 ml	0.0%	
CALLE 72	ANDEN	ACU	335 ml	0 ml	0.0%	
CALLE 72	VIA	SAN	219 ml	9.37 ml	4.27%	
CALLE 72	VIA	PLU	489 ml	157 ml	32,07%	
TOTAL		UE283	2,925 ml	303,37 ml	10,37%	

Espacio Público

UEs	Inicio Programado	Fin Programado	% Programado	% Real	% Cumplimiento
UE283 - Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 5+110 a 5+405	17/10/2025	11/05/2027	42,10 %	40,30 %	95,74 %
UE284 - Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 4+740 a 5+110	22/08/2025	28/04/2027	46,27 %	43,91 %	94,90 %

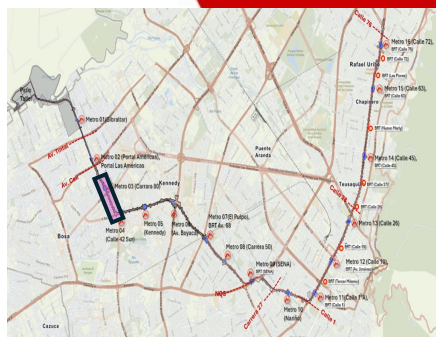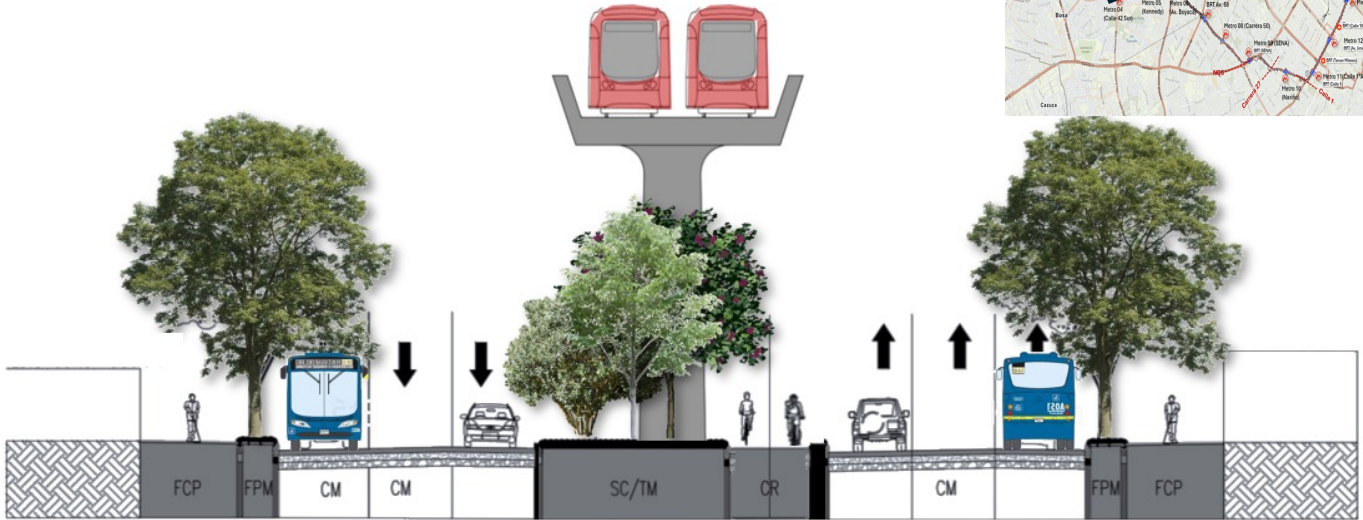

16/6/2026 4:34:45 p.m.
4°37'13"N -74°9'55" W
42 F- 36 Carrera 79f
Antonio Nariño
Bogotá

12 de mayo de 2026 11:08:23 a. m. COT
78P-31 Avenida 43 Sur
Kennedy
Bogotá, D.C.



INTER-ESTACIÓN 04 – K5+405 a K5+760

(Av. 1º de mayo entre Av. Cl 43 Sur y Cl. 38 sur


UE-282

Redes

COSTADO	ZONA	TIPO	LONGITUD	AVANCE	% AVCE	INICIO
PATIO TALLER	ANDEN	ENE	846,41 ml	140,35 ml	17,0%	5-Aug-25
PATIO TALLER	ANDEN	ETB	221 ml	0 ml	0,0%	
PATIO TALLER	ANDEN	ACU	678 ml	0 ml	0,0%	
PATIO TALLER	VIA	SAN	201 ml	0 ml	0,0%	
PATIO TALLER	VIA	PLU	472 ml	0 ml	0,0%	
CALLE 72	ANDEN	ENE	780 ml	0 ml	0,0%	
CALLE 72	ANDEN	ETB	157 ml	0 ml	0,0%	
CALLE 72	ANDEN	ACU	162 ml	0 ml	0,0%	
CALLE 72	VIA	SAN	281 ml	0 ml	0,0%	
CALLE 72	VIA	PLU	249 ml	140 ml	56,22%	6-Aug-25
TOTAL		UE282	4.047 ml	280,35 ml	6,92%	

Espacio Público

UEs	Inicio Programado	Fin Programado	% Programado	% Real	% Cumplimiento
UE282 - Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 5+405 a 5+760	11/10/2025	27/07/2027	25,99 %	1,99 %	7,66 %

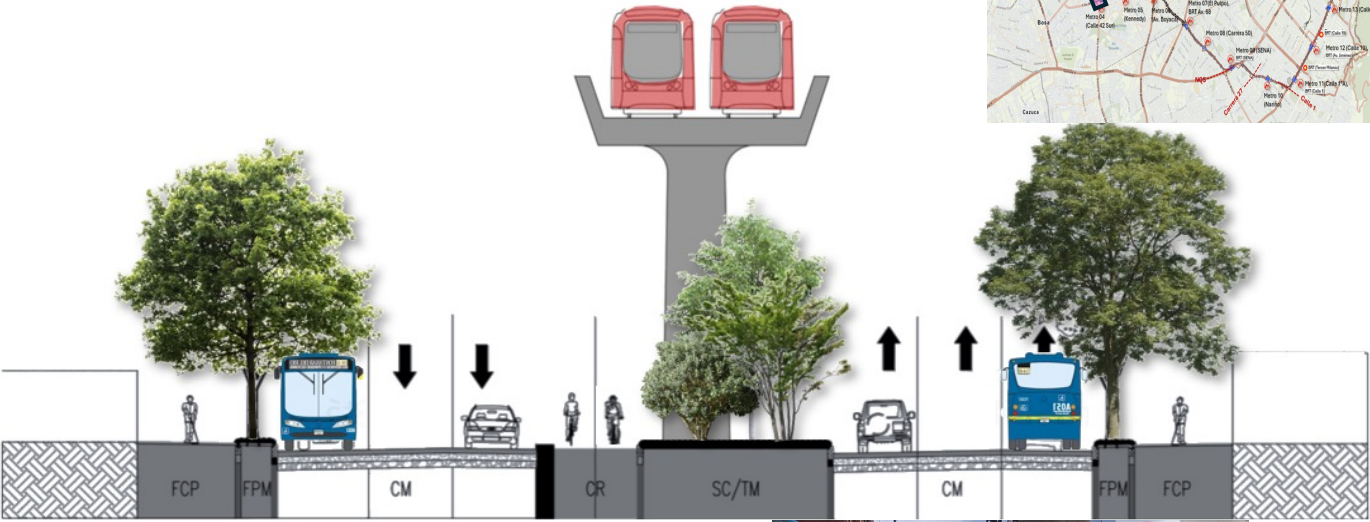

INTER-ESTACIÓN 05 – K5+760 a K6+545

(Av. 1º de mayo entre Av. Cl 42 Sur y Cl. 40 sur

UE-281-280


Redes

COSTADO	ZONA	TIPO	LONGITUD	AVANCE	% AVCE	INICIO
PATIO TALLER	ANDEN	ENE	1,951 ml	563 ml	28.85%	9-Oct-25
PATIO TALLER	ANDEN	ETB	224 ml	148 ml	66.07%	24-Nov-25
PATIO TALLER	ANDEN	ACU	919 ml	181 ml	19.69%	27-Nov-25
PATIO TALLER	VIA	SAN	751 ml	60 ml	7.98%	6-Aug-25
PATIO TALLER	VIA	PLU	1,114 ml	920 ml	82.57%	20-Jul-25
CALLE 72	ANDEN	ENE	1,095 ml	0 ml	0.0%	
CALLE 72	ANDEN	ETB	414 ml	0 ml	0.0%	
CALLE 72	ANDEN	ACU	658 ml	0 ml	0.0%	
CALLE 72	VIA	SAN	972 ml	0 ml	0.0%	
CALLE 72	VIA	PLU	650 ml	561 ml	86.26%	4-Aug-25
TOTAL		281-280	8,748 ml	2,433 ml	27.81%	

Espacio Público

UEs	Inicio Programado	Fin Programado	% Programado	% Real	% Cumplimiento
UE280 - Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 6+170 a 6+545	25/06/2025	14/11/2026	78,19 %	55,04 %	70,40 %
UE281 - Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 5+760 a 6+170	13/12/2024	24/11/2026	47,63 %	61,70 %	129,54 %


Inter-estación 05
Av Primera de Mayo entre Av Cl 42 Sur y Cl 40 Sur

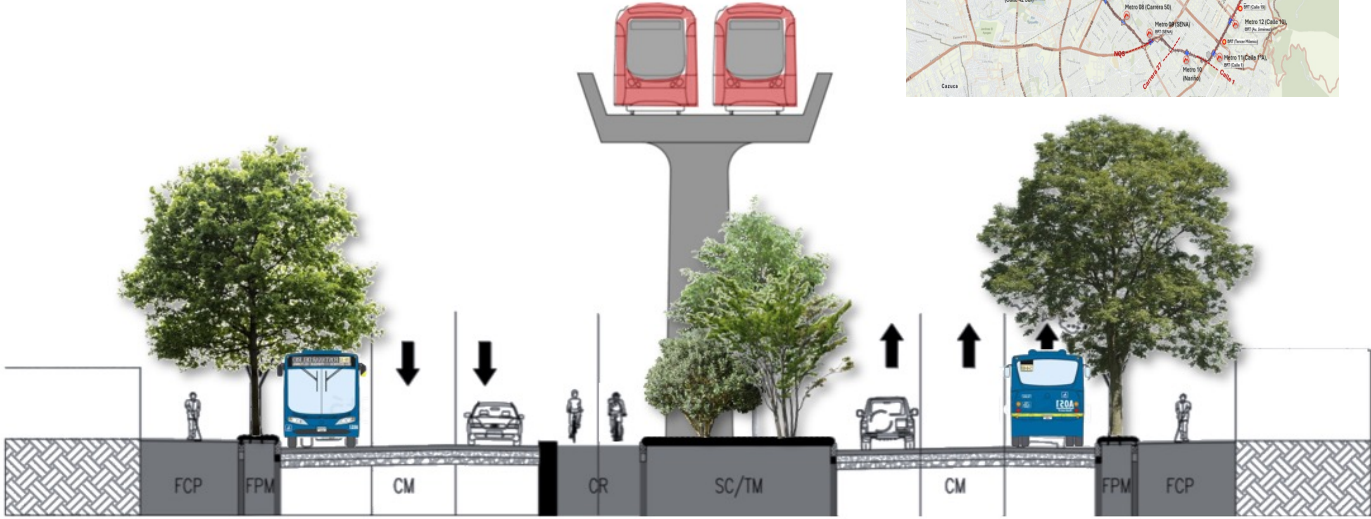

SEGUIMIENTO UE-280

Inter-estación 5



Fin programado 14/11/2026

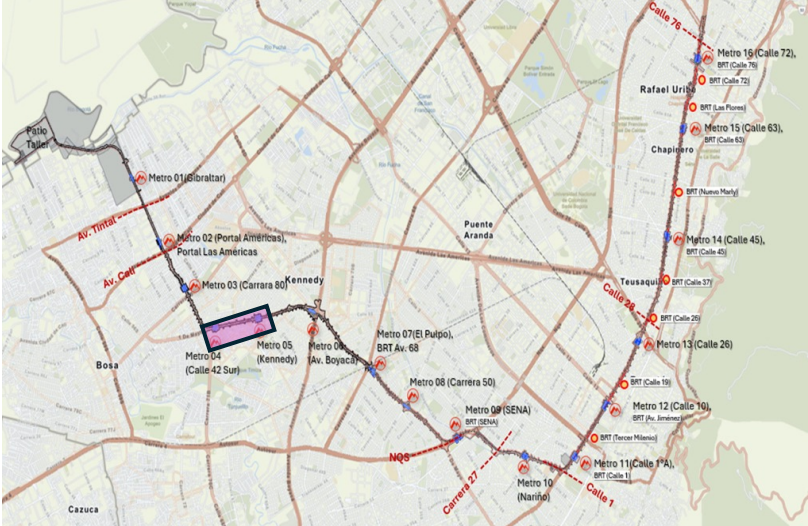

METRO BOGOTÁ | Gestión de Cronograma

L1MB – Sub componentes - UEs

Corte: 30/06/2026

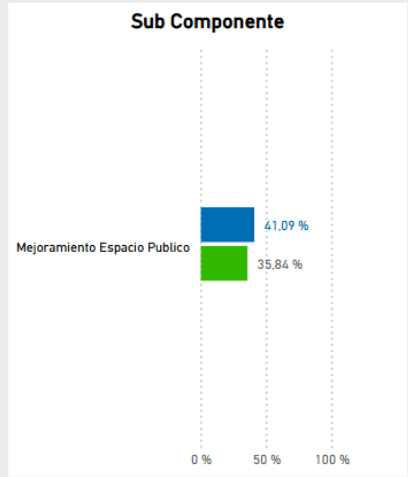

WF	Sub Componente	UEs	Inicio Programado	Fin Programado	% Programado	% Real	% Cumplimiento	% Programado
WF2	Mejoramiento Espacio Publico	UE278 - Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 6+760 a 7+215	28/11/2025	24/06/2027	35,84 %	39,11 %	109,13 %	35,84 %
WF2	Mejoramiento Espacio Publico	UE279 - Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 6+545 a 6+760	31/10/2026	30/06/2027	0,00 %	2,00 %		0,00 %
WF2	Mejoramiento Espacio Publico	UE280 - Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 6+170 a 6+545	25/06/2025	14/11/2026	78,19 %	55,04 %	70,40 %	78,19 %
WF2	Mejoramiento Espacio Publico	UE281 - Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 5+760 a 6+170	13/12/2024	24/11/2026	47,63 %	64,70 %	135,64 %	47,63 %
WF2	Mejoramiento Espacio Publico	UE282 - Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 5+405 a 5+760	11/10/2025	27/07/2027	25,99 %	1,99 %	7,66 %	25,99 %



INTER-ESTACIÓN 05 – K6+545 a K6+760

(Av. 1º de mayo entre Av. Cll 40 Sur y Cll. 39 sur


UE-279

Redes

COSTADO	ZONA	TIPO	LONGITUD	AVANCE	% AVCE	INICIO
PATIO TALLER	ANDEN	ENE	693 ml	131 ml	18,90%	5-Sep-25
PATIO TALLER	ANDEN	ETB	275 ml	0 ml	0,0%	
PATIO TALLER	ANDEN	ACU	199 ml	0 ml	0,0%	
PATIO TALLER	VIA	SAN	242 ml	0 ml	0,0%	
PATIO TALLER	VIA	PLU	228 ml	0 ml	0,0%	5-Sep-25
CALLE 72	ANDEN	ENE	530 ml	54 ml	10,18%	
CALLE 72	ANDEN	ETB	5 ml	0 ml	0,0%	
CALLE 72	ANDEN	ACU	233 ml	0 ml	0,0%	
CALLE 72	VIA	SAN	223 ml	0 ml	0,0%	
CALLE 72	VIA	PLU	394 ml	0 ml	0,0%	
TOTAL		UE279	3.022 ml	185 ml	6.12%	

Espacio Público

UEs	Inicio Programado	Fin Programado	% Programado	% Real
UE279 - Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 6+545 a 6+760	31/10/2026	30/06/2027	0,00 %	2,00 %

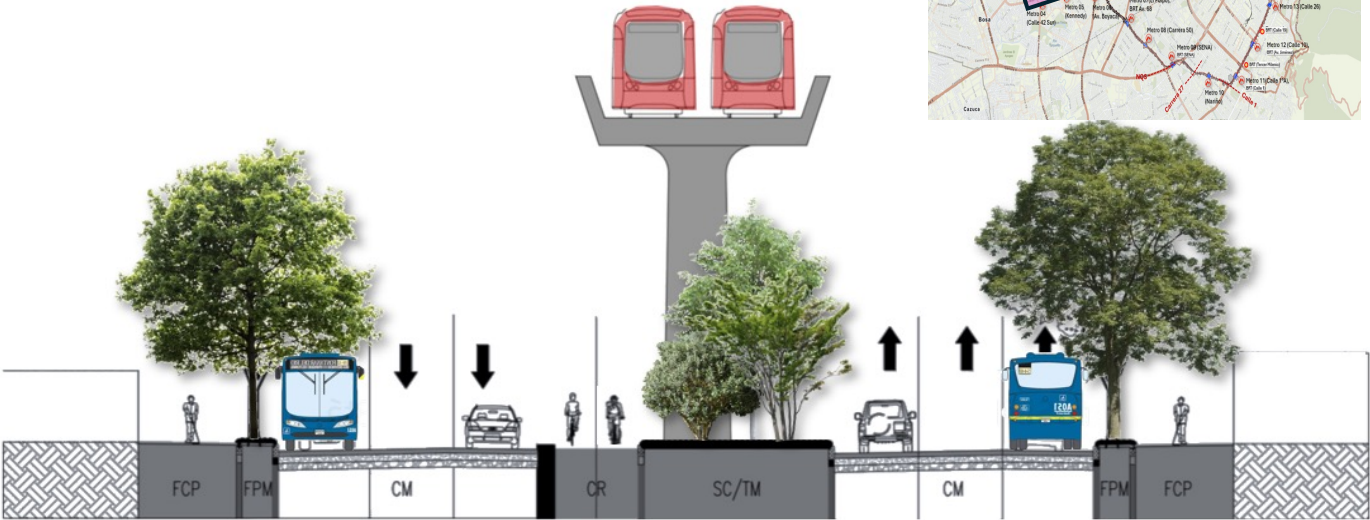

INTER-ESTACIÓN 05 – K6+760 a K7+800.

Av. 1º de mayo entre Cll. 39 sur y Dg. 36 Bis sur

UE-278

Redes

COSTADO	ZONA	TIPO	LONGITUD	AVANCE	% AVCE	INICIO
PATIO TALLER	ANDEN	ENE	439 ml	0 ml	0.0%	10-nov-25
PATIO TALLER	ANDEN	ETB	16 ml	0 ml	0.0%	
PATIO TALLER	ANDEN	ACU	211 ml	0 ml	0.0%	
PATIO TALLER	VIA	SAN	198 ml	0 ml	0.0%	
PATIO TALLER	VIA	PLU	293 ml	154 ml	53.0%	
CALLE 72	ANDEN	ENE	529 ml	0 ml	0.0%	1-nov-25
CALLE 72	ANDEN	ETB	23 ml	0 ml	0.0%	
CALLE 72	ANDEN	ACU	111 ml	0 ml	0.0%	
CALLE 72	VIA	SAN	226 ml	0 ml	0.0%	
CALLE 72	VIA	PLU	277 ml	17 ml	6.13%	
TOTAL		UE278	2,323 ml	171 ml	7,36%	



UE-277

Redes

COSTADO	ZONA	TIPO	LONGITUD	AVANCE	% AVCE	INICIO
PATIO TALLER	ANDEN	ENE	1315	0 ml	0.0%	8-Jan-26
PATIO TALLER	ANDEN	ETB	59	0 ml	0.0%	
PATIO TALLER	ANDEN	ACU	20	0 ml	0.0%	
PATIO TALLER	VIA	SAN	431	0 ml	0.0%	
PATIO TALLER	VIA	PLU	966	623 ml	64,5%	
CALLE 72	ANDEN	ENE	1055	0 ml	0.0%	
CALLE 72	ANDEN	ETB	30	0 ml	0.0%	
CALLE 72	ANDEN	ACU	226	0 ml	0.0%	
CALLE 72	VIA	SAN	434	0 ml	0.0%	
CALLE 72	VIA	PLU	693	382 ml	55.0%	
TOTAL		UE277	5,229 ml	1,005 ml	19,22%	

Espacio Público

UEs	Inicio Programado	Fin Programado	% Programado	% Real	% Cumplimiento
UE277 - Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 7+215 a 7+800	03/01/2026	24/06/2027	2,33 %	33,86 %	1454,43 %
UE278 - Obras de mejoramiento de espacio público - Absc 6+760 a 7+215	28/11/2025	24/06/2027	35,84 %	39,11 %	109,13 %

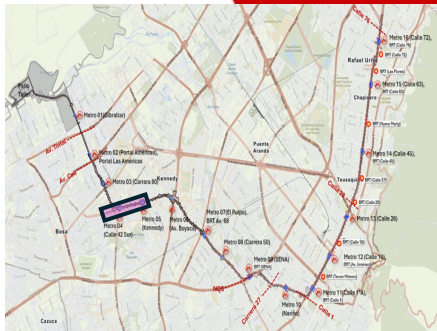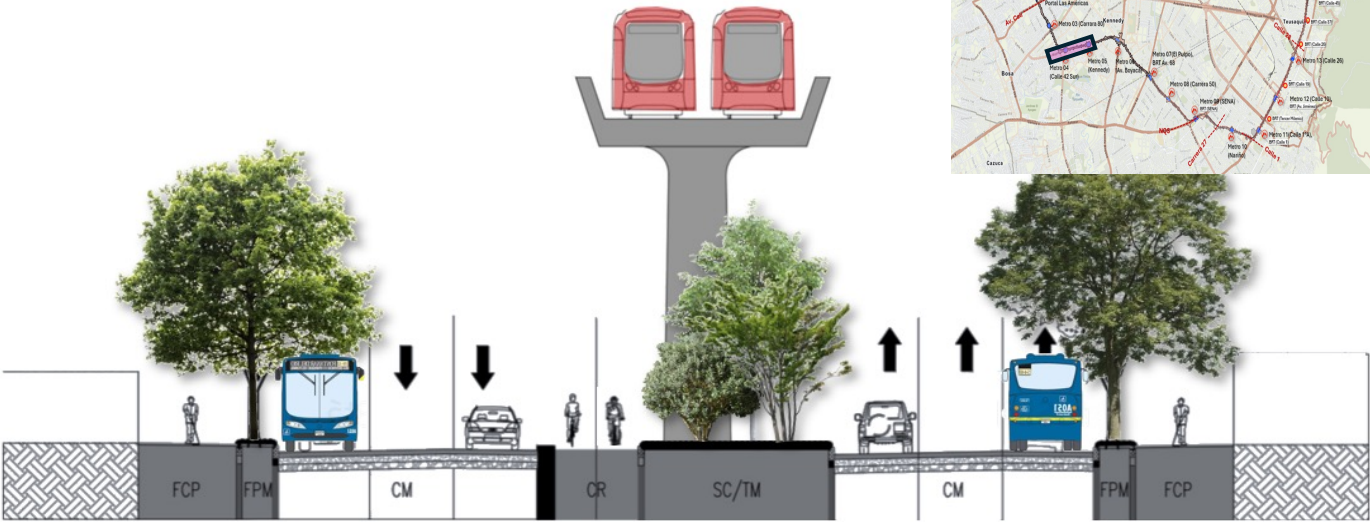

19 de mayo de 2026 1:13:41 p. m. COT # 35A-2 Carrera 72n Kennedy Bogotá D.C.



21 de abril de 2026 8:16:39 a. m. COT 72Q-72 1 De Mayo Kennedy Bogotá D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



GRACIAS
