

Instituto de Desarrollo Urbano

Localidad Tunjuelito

Rendición de cuentas nodo Movilidad

00 / 00 / 00

INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO

CONTENIDO



1 Presentación IDU

- Plataforma estratégica Misión – Visión
- Política antisoborno
- Informe PQRSD vigencia 2024 y 2025
- Diagnóstico de la malla vial de la localidad
- Información general de los proyectos IDU en la localidad
 - Etapa de construcción
 - Etapa de EyD
 - Etapa de conservación
- Preguntas e inquietudes

2 Unidad de Mantenimiento Vial

. Plataforma estratégica Misión – Visión



Nuestra Misión

Somos un establecimiento público descentralizado que ejecuta una Infraestructura con Propósito, que fomenta el desarrollo del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital y el área metropolitana, a través de la planeación, construcción y conservación de los proyectos para la movilidad y el espacio público.



Nuestra Visión

Al 2050 seremos reconocidos como una entidad confiable, efectiva y oportuna en el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial y de espacio público. Gracias a una gestión pública basada en la colaboración interinstitucional, la innovación en los sistemas de construcción y la participación ciudadana disfrutaremos de una ciudad con una infraestructura para la movilidad, más accesible, moderna y segura.

Política Antisoborno

El Instituto de Desarrollo Urbano estableció una estrategia que busca prevenir, detectar y enfrentar el soborno. Por medio de varios lineamientos institucionales se fortalece la cultura de la transparencia entre todos los servidores públicos del IDU.

Para garantizar la debida ejecución de los recursos públicos que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, el IDU implementa la Política Antisoborno. A través de este Abecé, usted conocerá en qué consiste esta estrategia y cómo puede tramitar una denuncia en caso de sospechar de una conducta indebida.

Contáctanos:

denuncia.soborno@idu.gov.co



AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA



. Informe PQRSD vigencia 2024 y 2025




No.	Fecha	No. Radicado	No. Respuesta
1	12/06/2025	IDU 202518500837452	202522600683951 del 25/06/2025
2	12/06/2025	IDU 202518500844682	202538500675901 del 24/06/2025




Diagnóstico de la malla vial



DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA VIAL LOCALIDAD TUNJUELITO

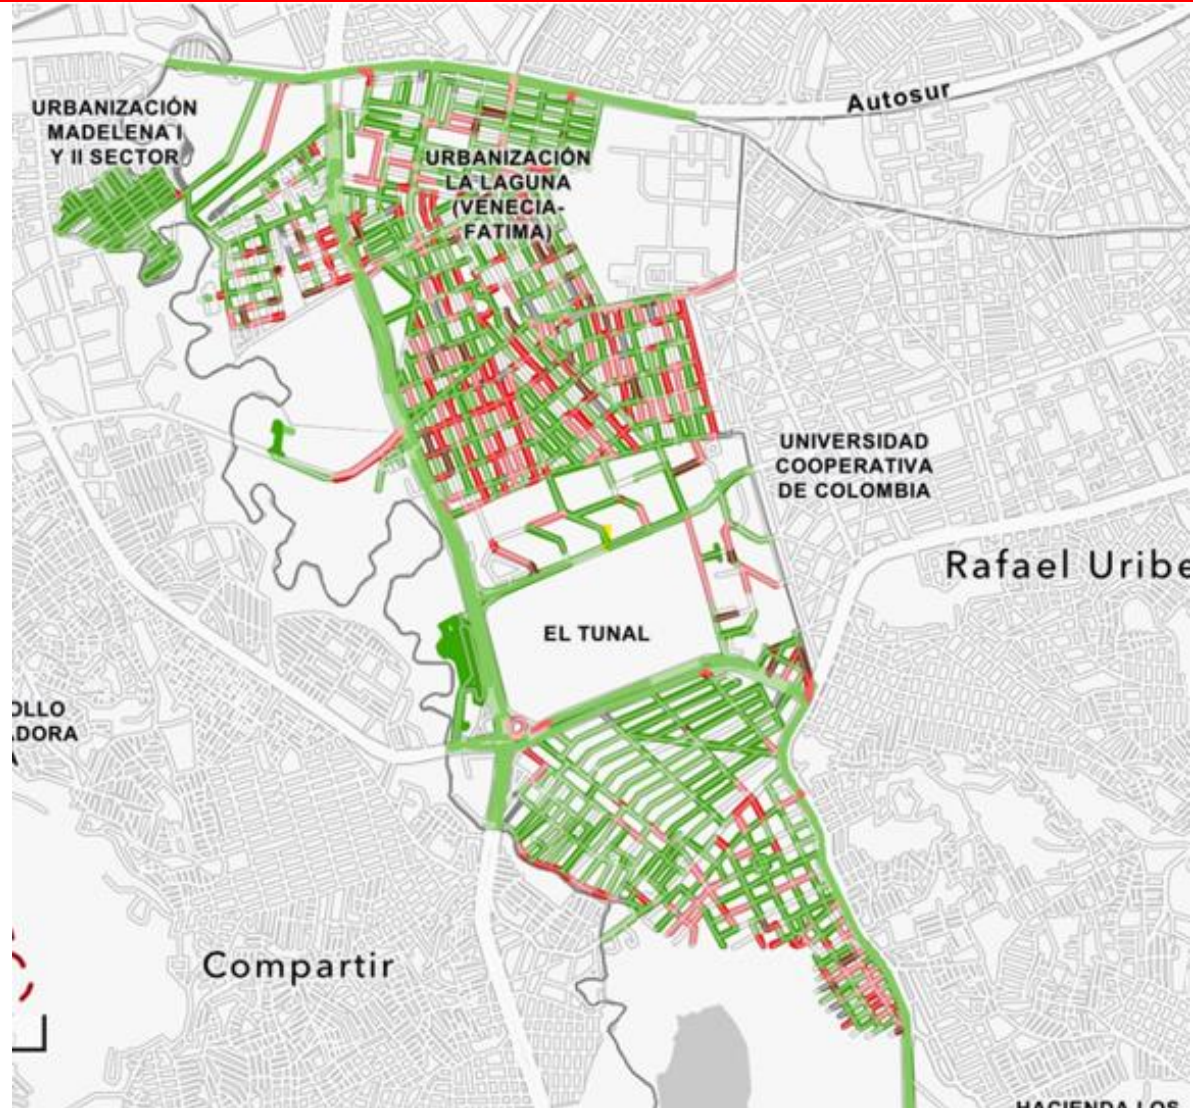

EXTENSIÓN RED VIAL LOCALIDAD TUNJUELITO

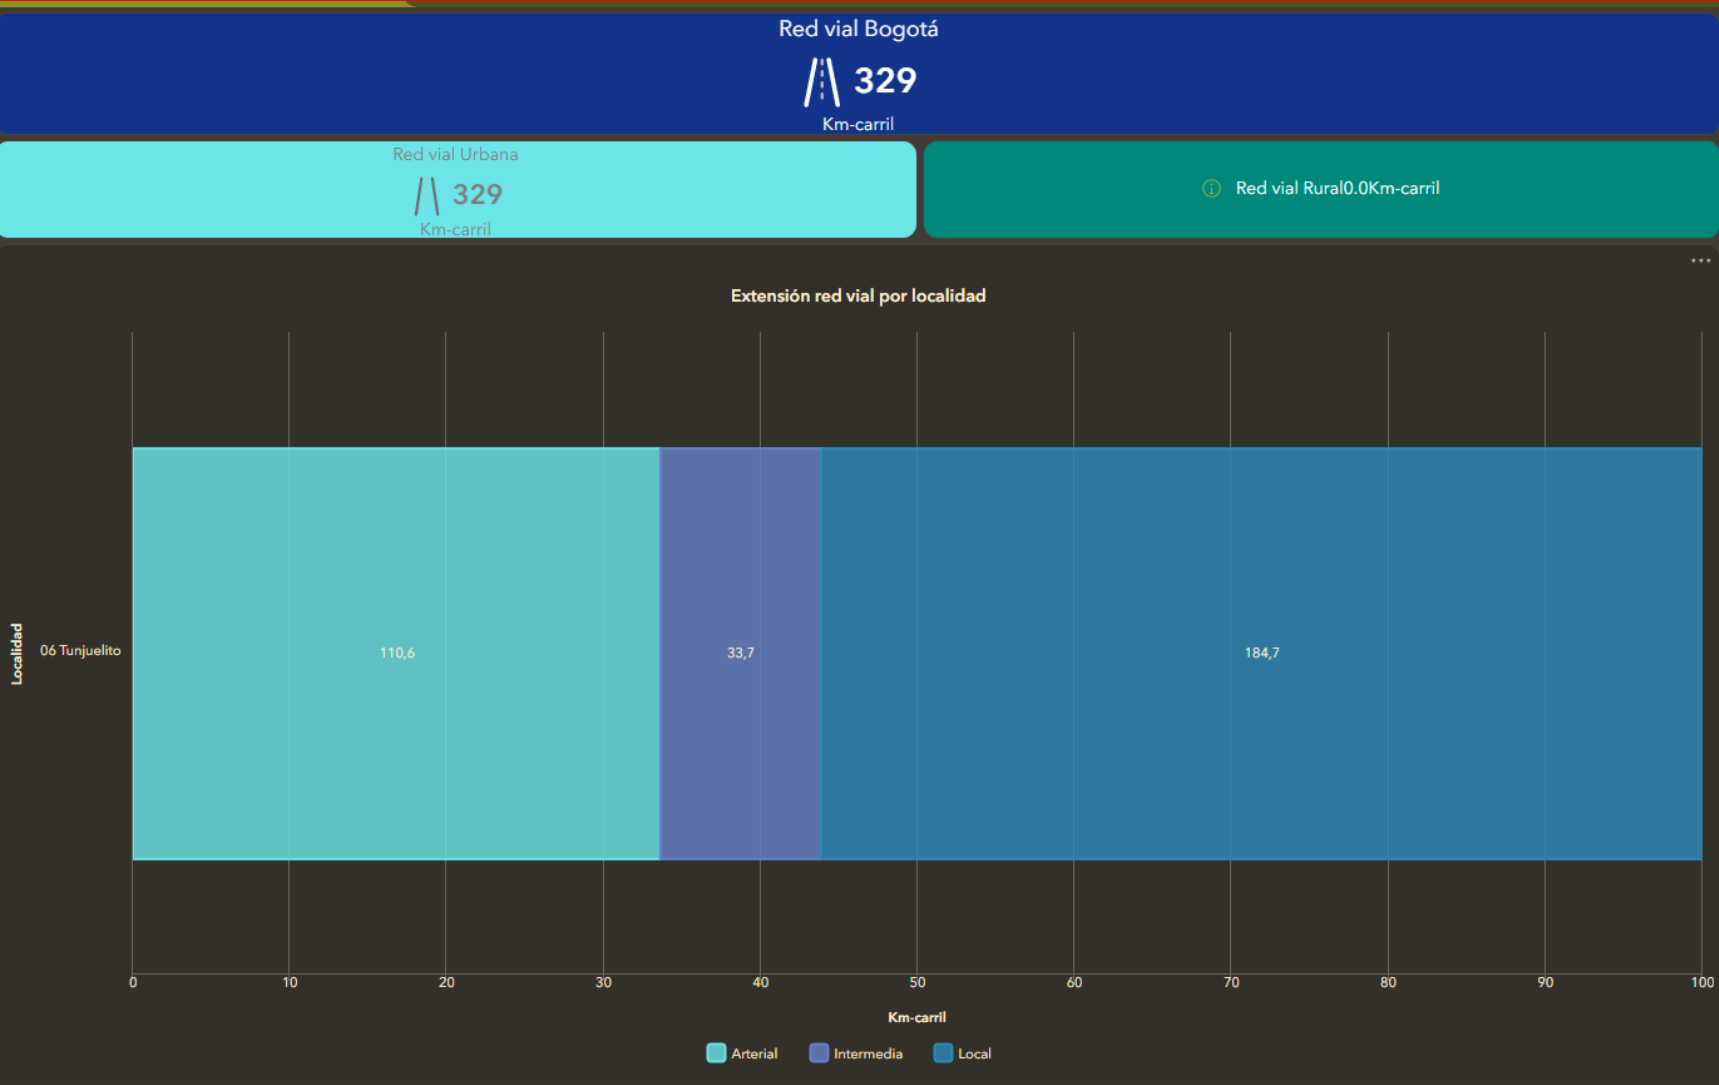


Km-carril	Porcentaje
110,6	33,6 %
33,7	10,2 %
184,7	56,2 %
329,0	100 %

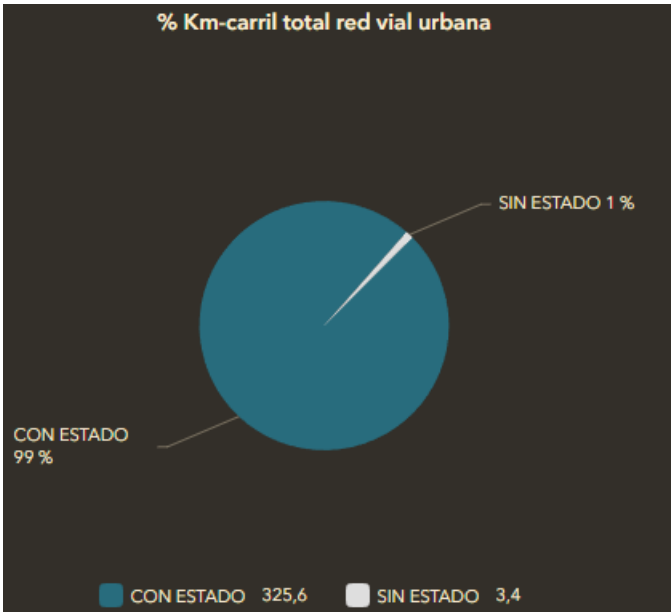

INVENTARIO ESTADO MALLA VIAL ARTERIAL




Mapa red vial

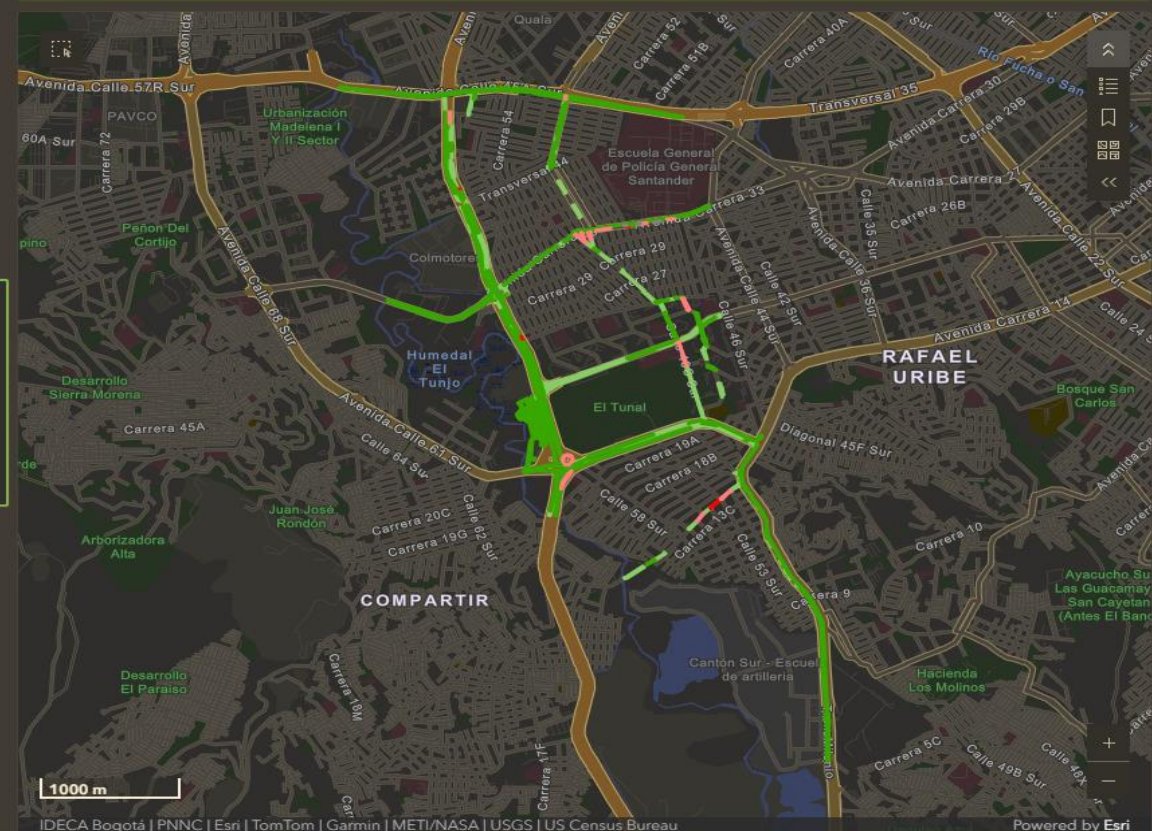


% estado por Localidad km-carril estado por Localidad Tabla km-carril estado por localidad




Diagnóstico

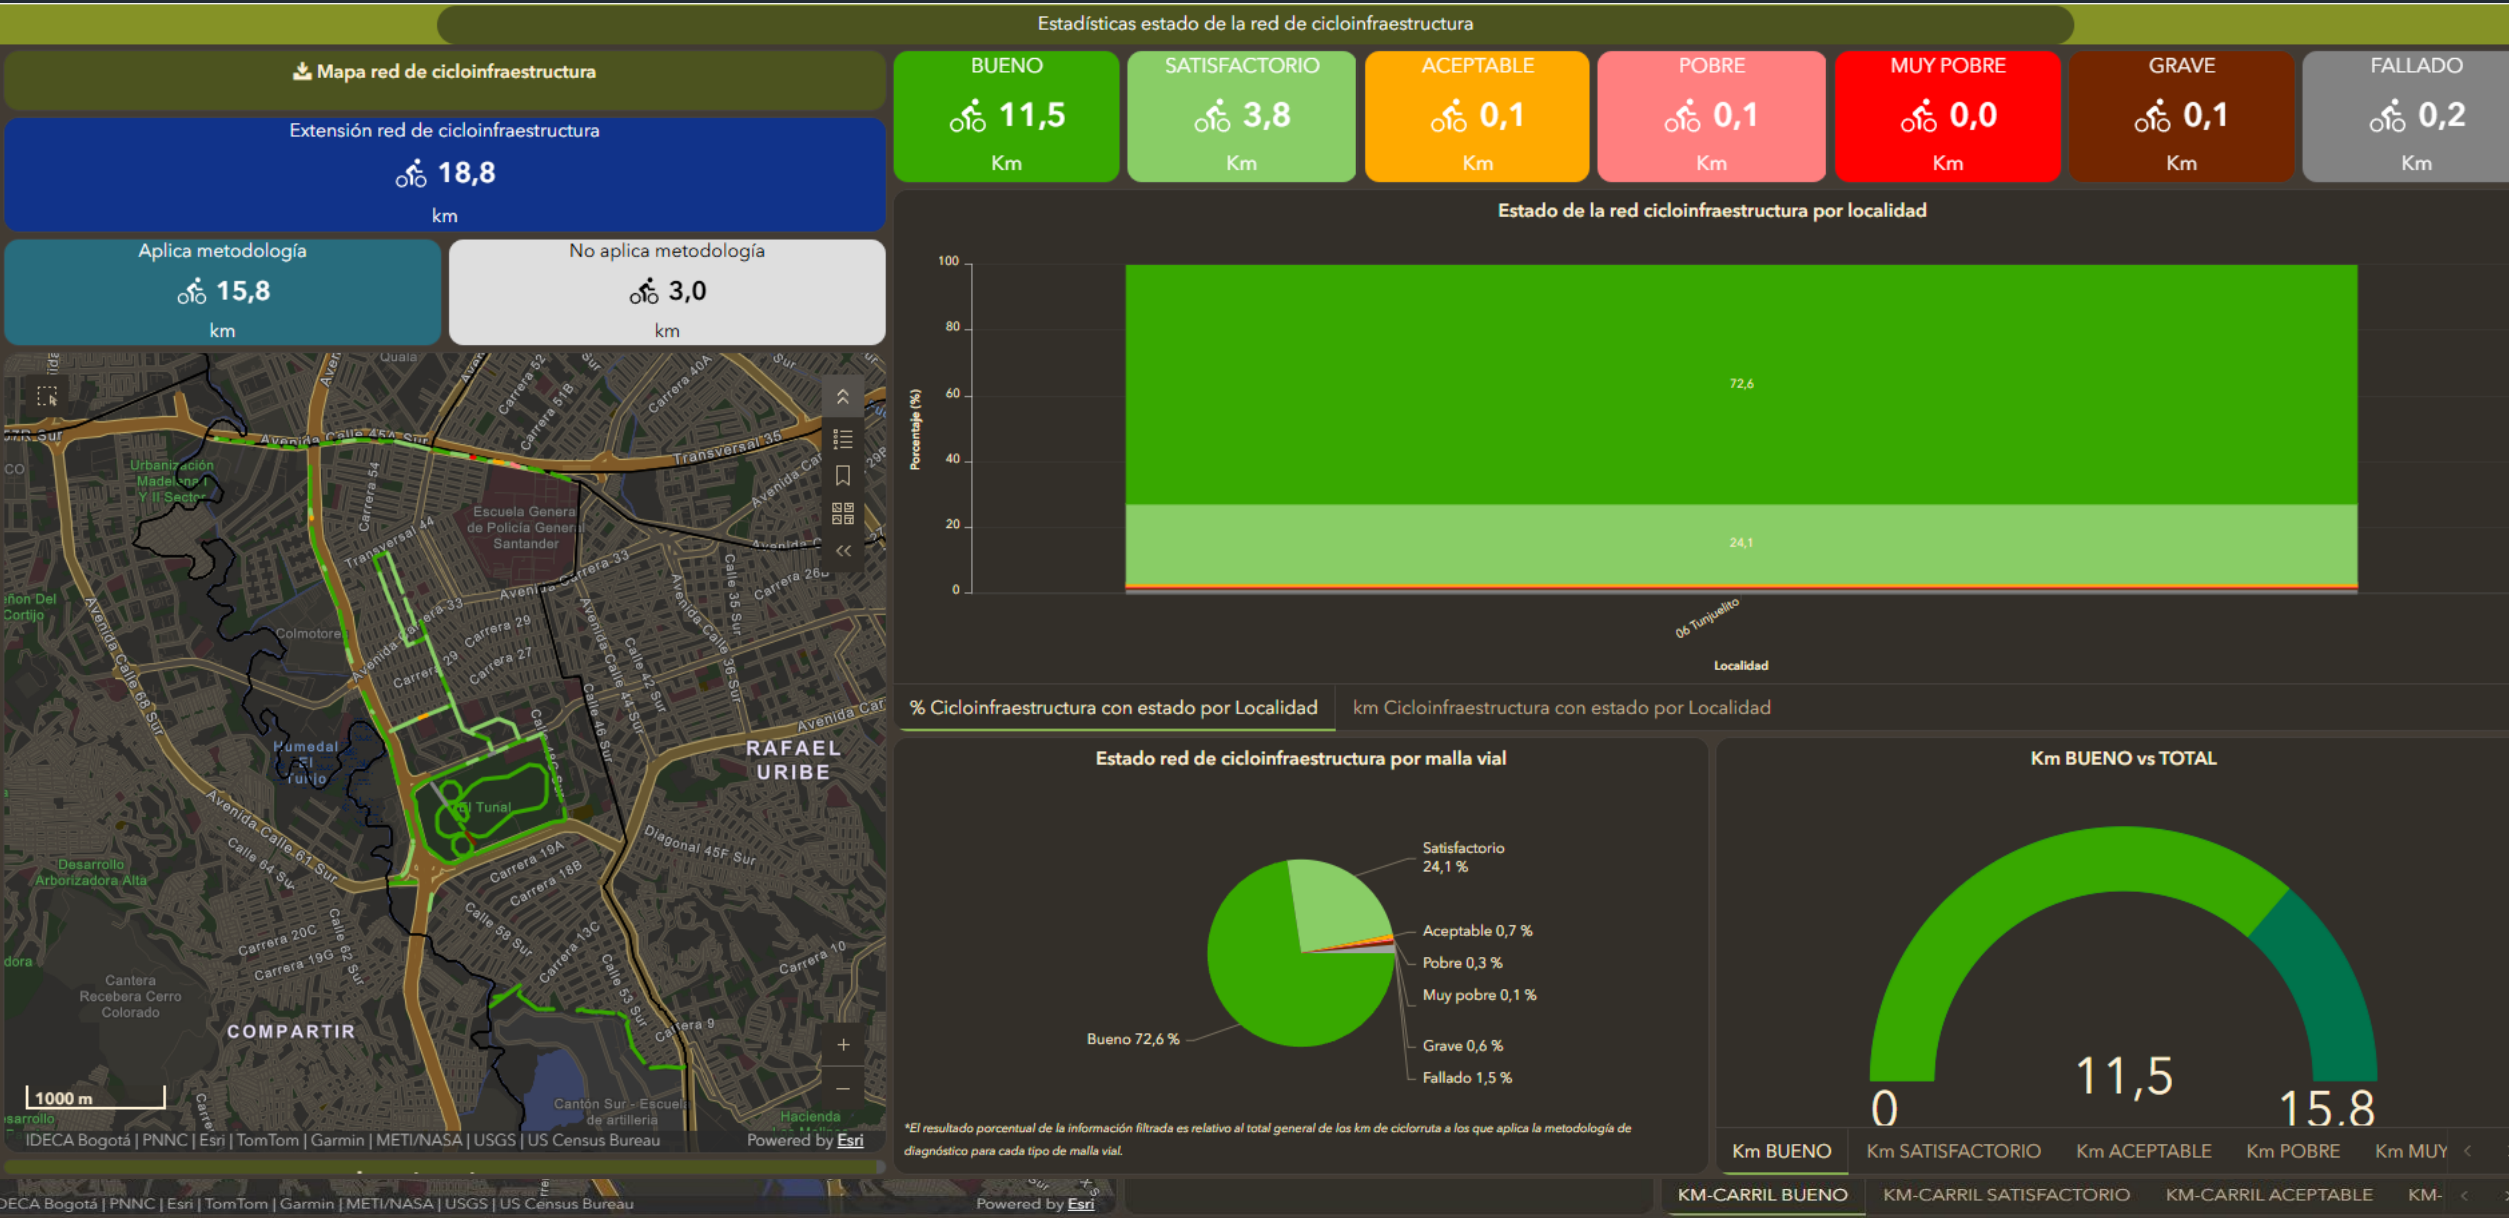

INVENTARIO ESTADO MALLA VIAL LOCAL

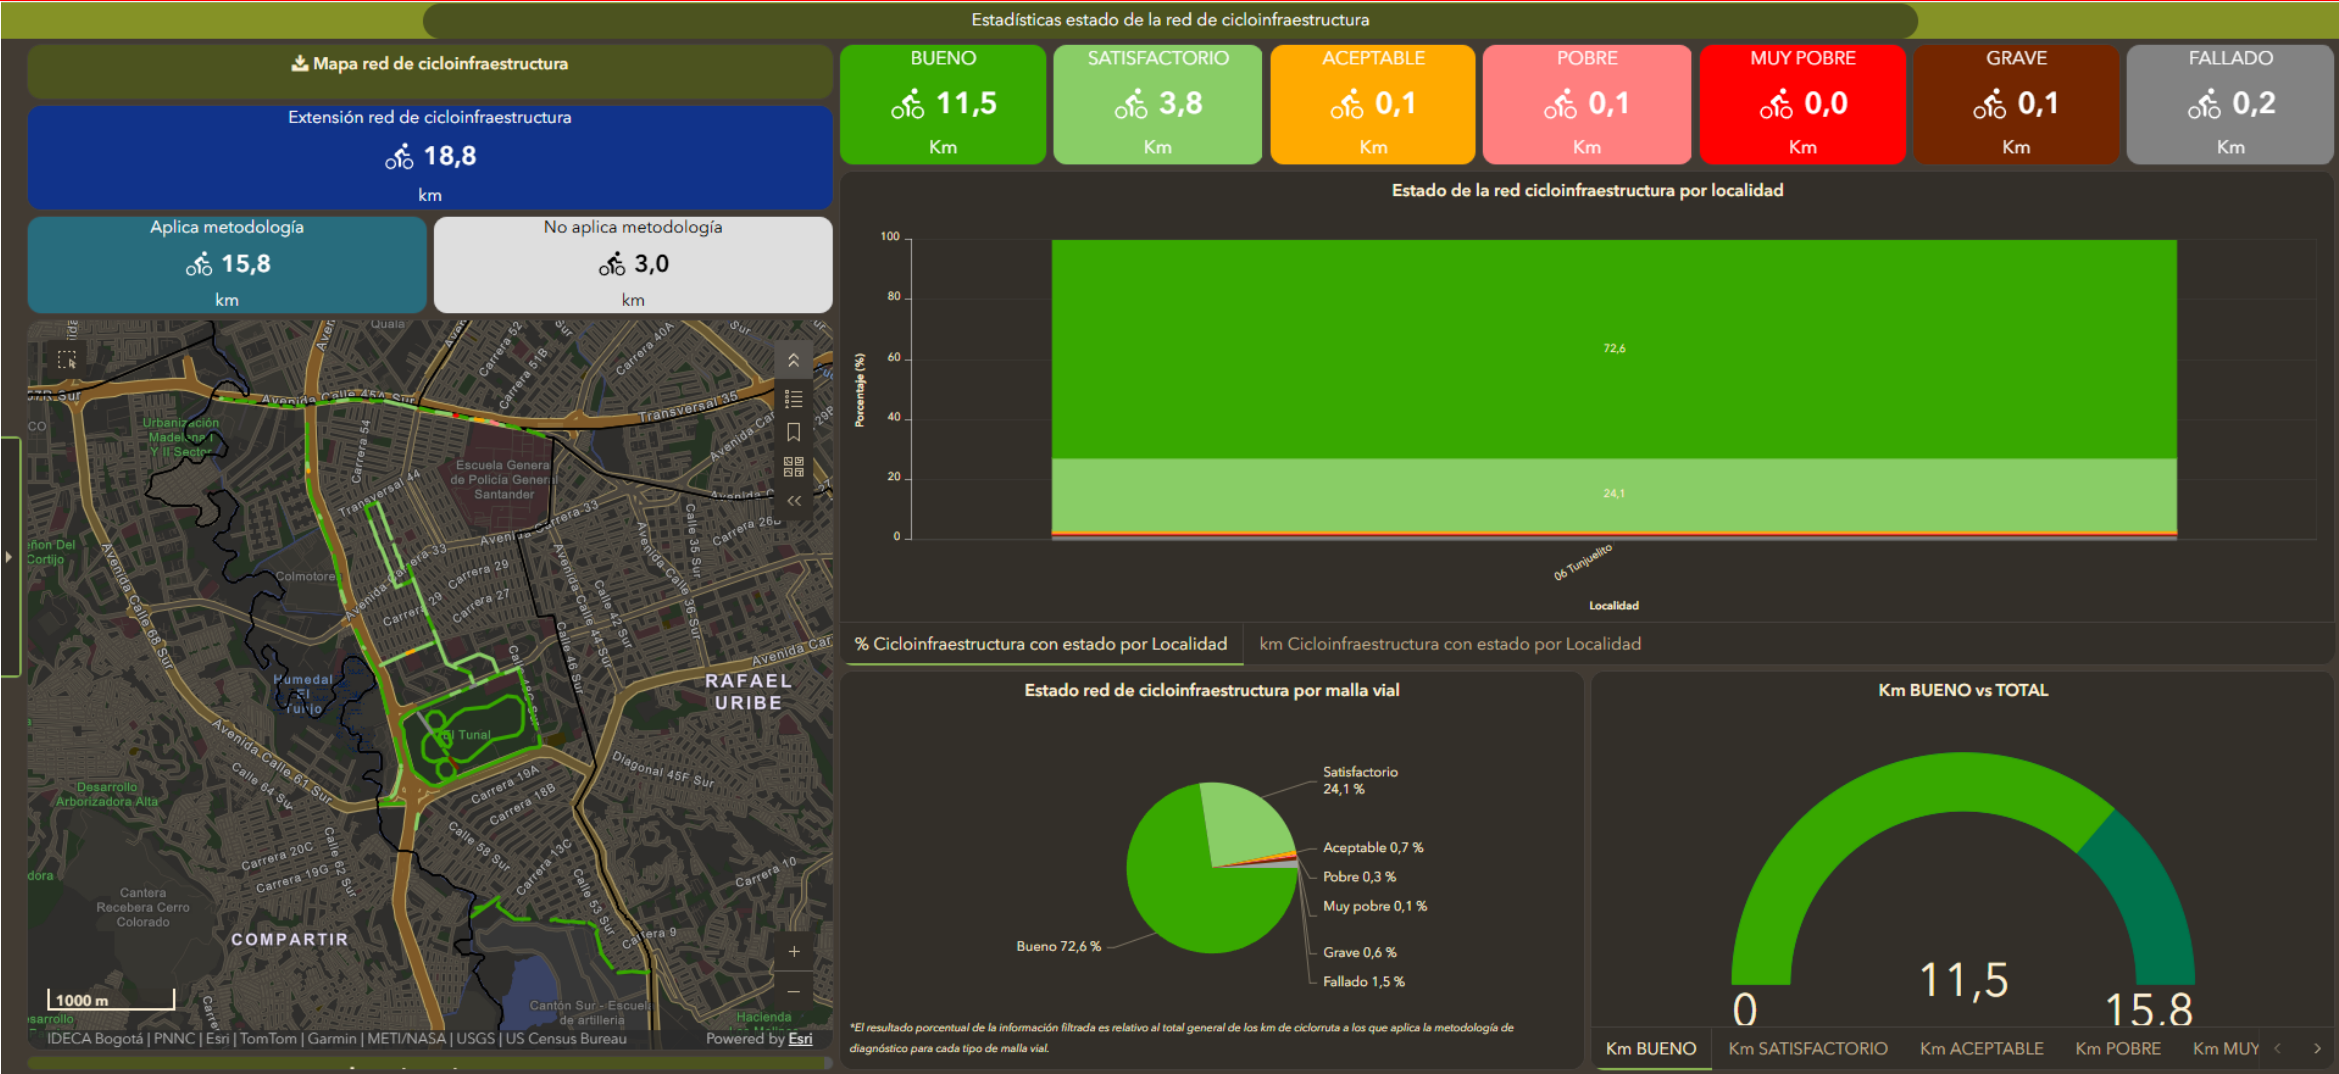

Diagnóstico

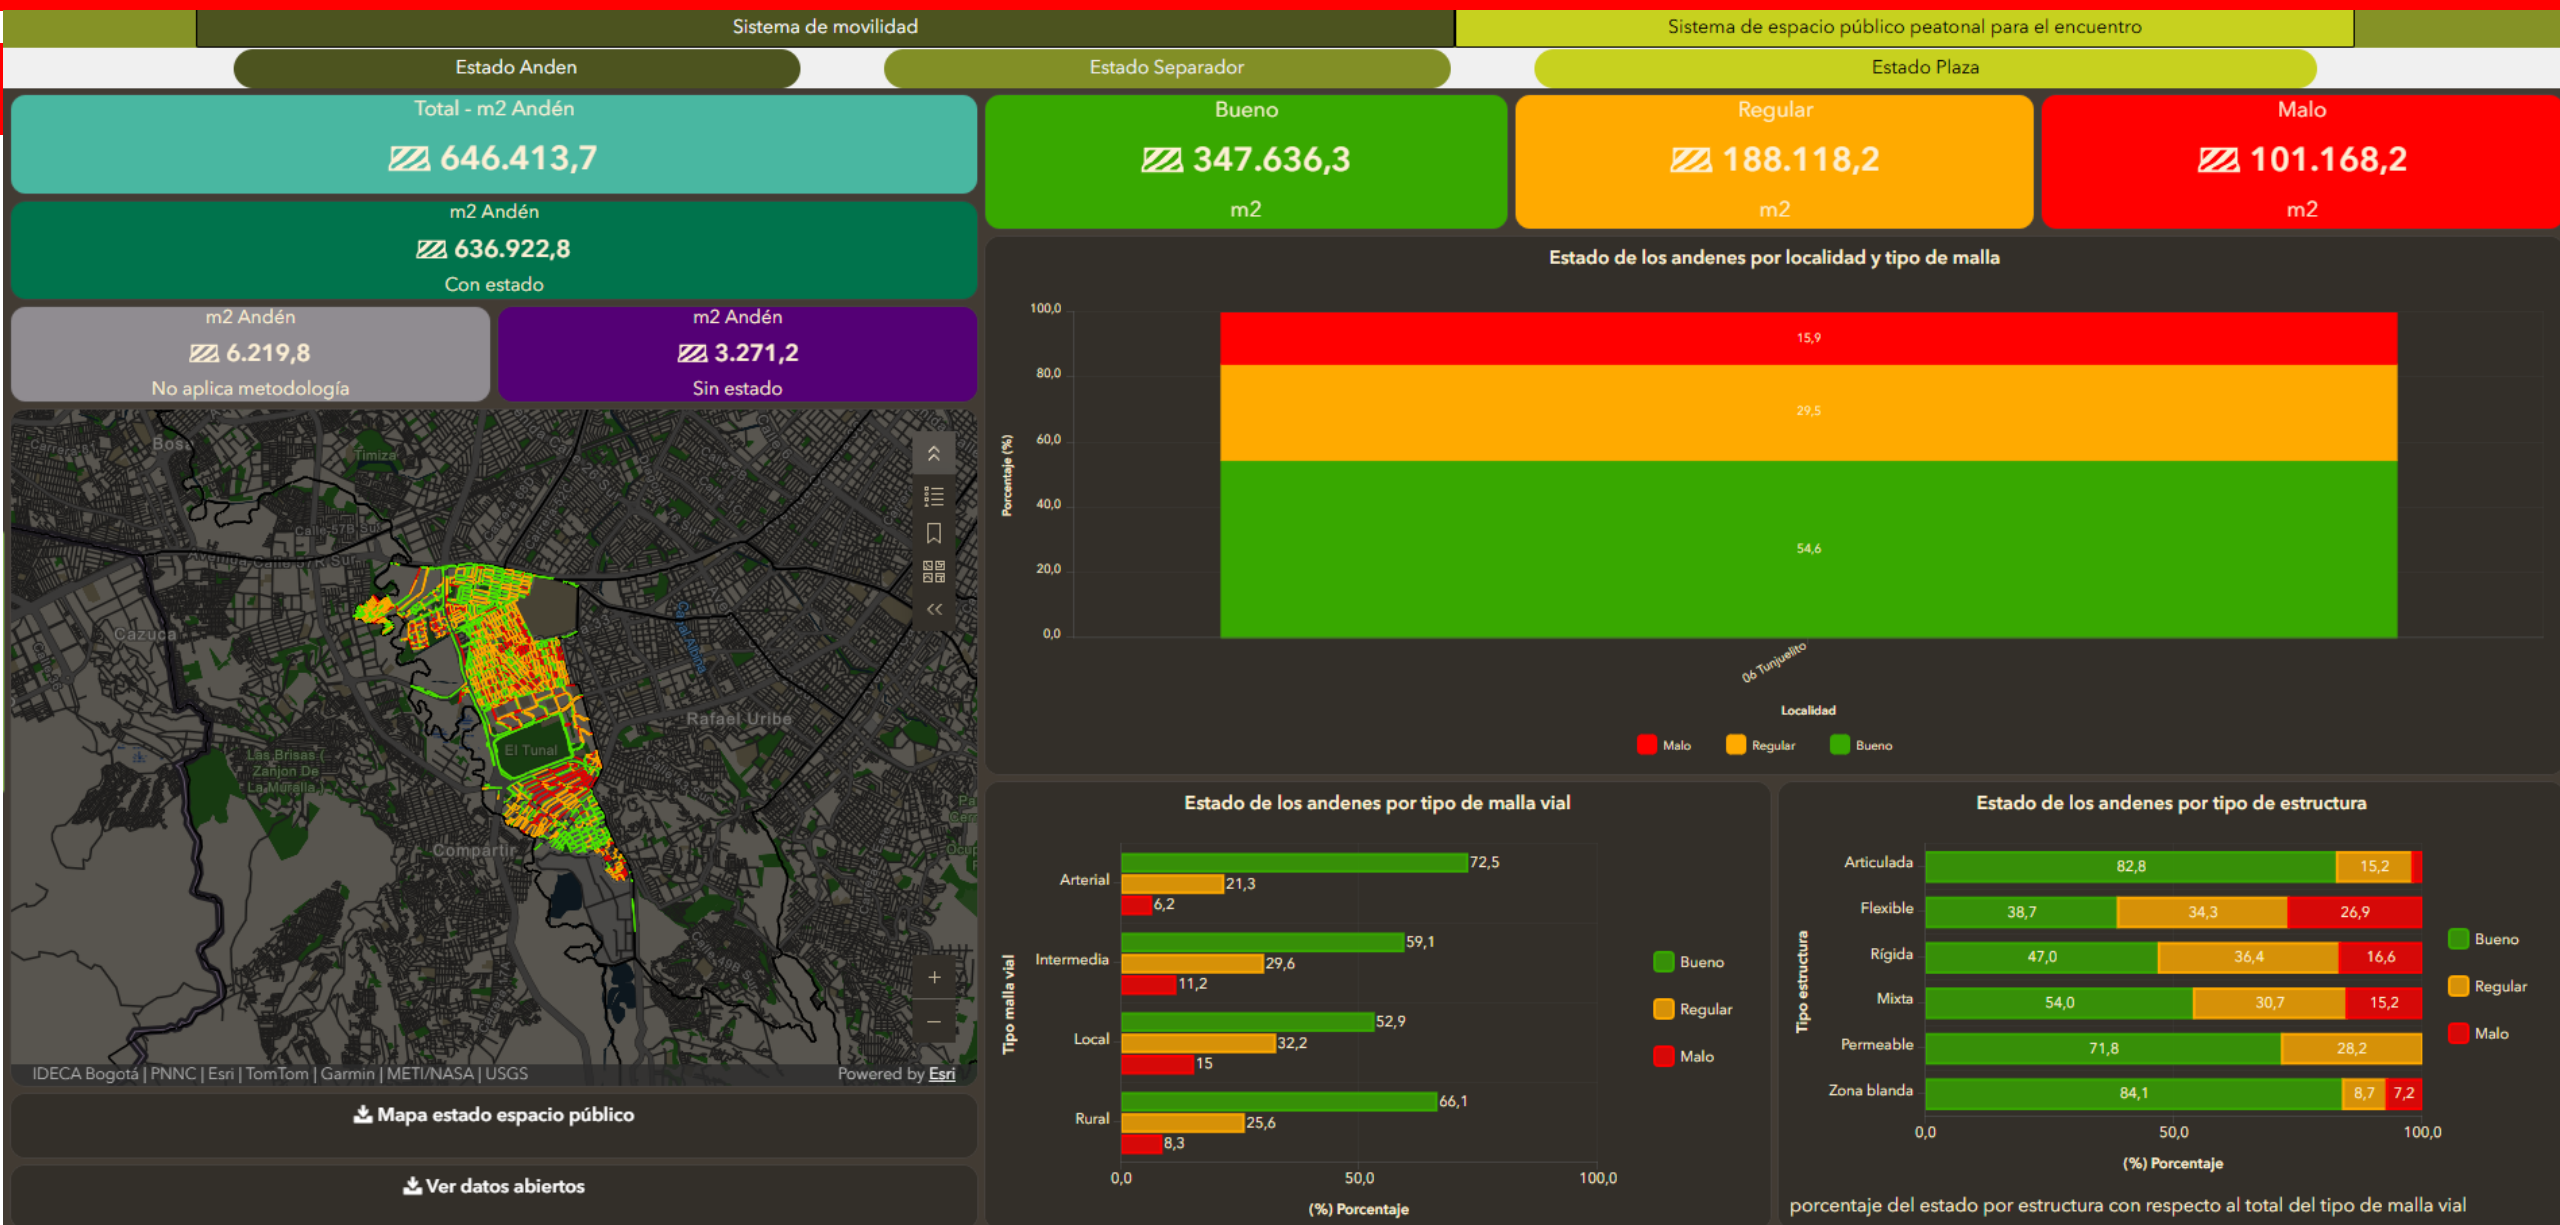




Proyectos IDU en la Localidad



INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO



Proyectos IDU 2024 – Localidad de Tunjuelito

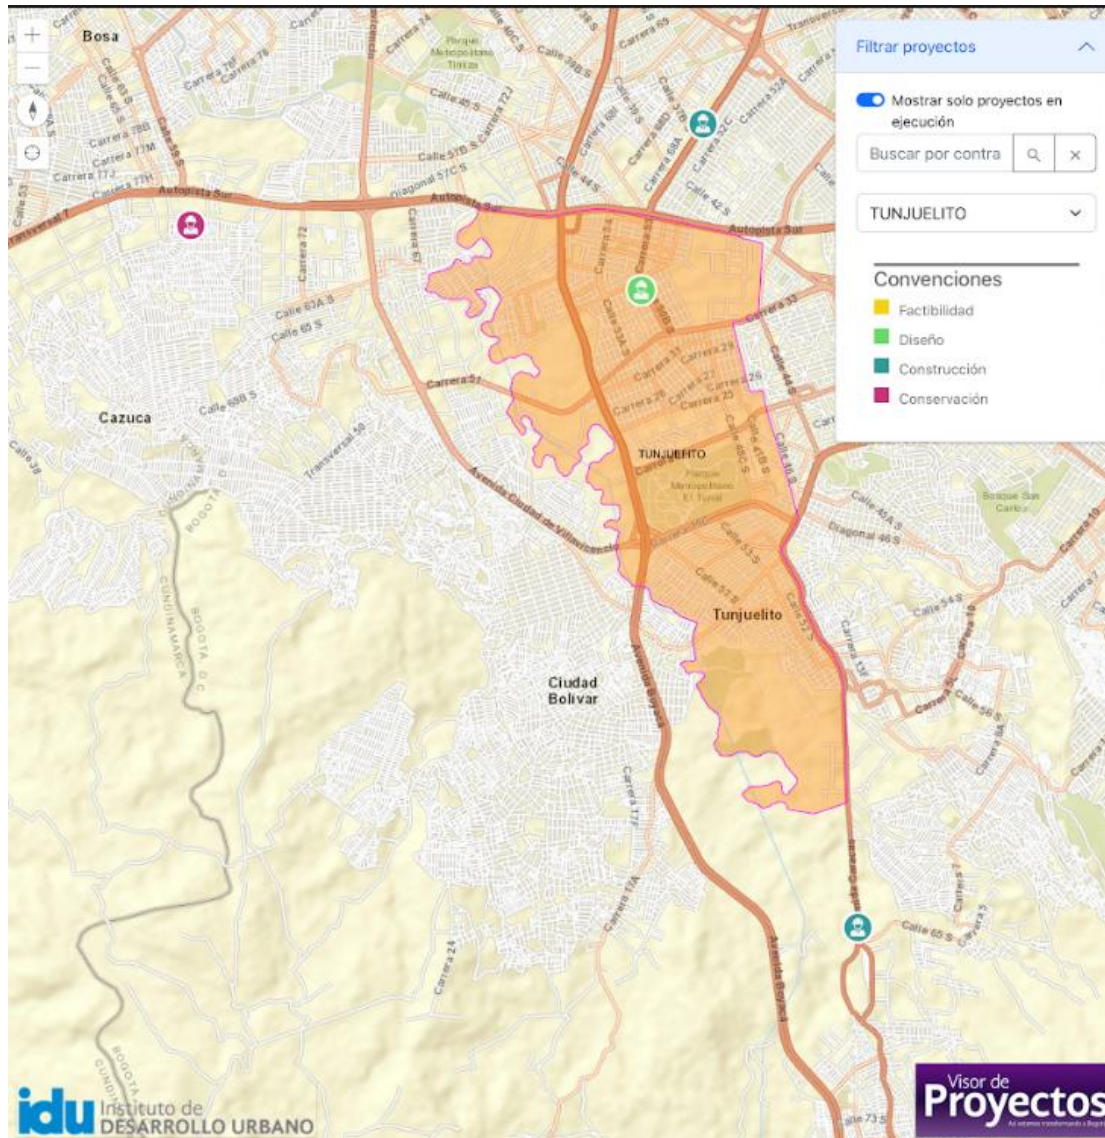

- * Jorge Gaitán Cortes
- * Troncal Caracas Sur
- * Avenida 68.



AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

BOGOTÁ

Instituto de Desarrollo Urbano

ESTUDIOS Y DISEÑOS

05 / 08 / 2026

INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO

PRODUCTOS

TOPOGRAFÍA

**REDES
HIDROSANITARIAS**

PAVIMENTOS

**DISEÑO
GEOMÉTRICO**

REDES SECAS

**AMBIENTAL - SST -
FORESTAL**

TRÁNSITO

ESTRUCTURAS

SOCIAL

DISEÑO URBANO

GEOTECNIA

**PRESUPUESTO Y
PROGRAMACIÓN**

Instituto de Desarrollo Urbano

Instituto de Desarrollo Urbano

**ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA
JORGE GAITÁN CORTÉS (CARRERA 33) DESDE LA CALLE 51 SUR (AVENIDA
CONGRESO EUCARÍSTICO) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ (CALLE 56 SUR) EN LA
LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C**

05/ 08 / 2026

**INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



El proyecto se encuentra localizado en la localidad 6 de Tunjuelito, UPL 19 Tunjuelito, la carrera 33 (avenida Jorge Gaitán Cortés), desde la calle 51 sur (Avenida Congreso Eucarístico) hasta la Avenida Boyacá (calle 56 sur) en la localidad de Tunjuelito. Sirve de límite entre los barrios San Vicente Ferrer, Fátima y El Carmen.

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN	CONSULTORÍA	INTERVENTORÍA
No. DEL CONTRATO	1521-2025	1535-2025
OBJETO	"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA JORGE GAITÁN CORTES (CARRERA 33) EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 51 SUR (AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO) HASTA LA AVENIDA BOYACÁ (CALLE 56 SUR) EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C.".	"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA JORGE GAITÁN CORTES (CARRERA 33) EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 51 SUR (AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO HASTA LA AVENIDA BOYACÁ (CALLE 56 SUR) EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN BOGOTÁ D.C."
CONTRATISTA CONFORMACIÓN CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	GINPROCOL SAS	HORIZONTES CIVILES SAS
PLAZO	14 MESES	14 MESES
FECHA DE INICIO:	17 de febrero de 2026	17 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	16 de abril de 2027	16 de abril de 2027



Metas físicas	
Tipo	Cantidad
Construir Km-Carril de Malla Vial Local	86.0 Km_Carril
Espacio Público	13833.0 m2
Información contractual	
Número de contrato:	IDU-1521-2025
Tipo:	Consultoría (Estudios y Diseños Tecnicos)
Contratista:	GINPROCOL S.A.S.
Valor total:	\$ 4.577.821.612,00
Fecha de inicio:	17/02/2026
Fecha de finalización:	16/04/2027
Empleos generados:	34
Número de contrato:	IDU-1535-2025
Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	HORIZONTES CIVILES S.A.S.
Valor total:	\$ 2.362.950.442,00
Fecha de inicio:	17/02/2026
Fecha de finalización:	16/04/2027
Empleos generados:	26



IDU-1601-2019

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Descripción del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Fecha de actualización: 29/06/2026

[Descargar Informe de Avance PDF](#)

Equipo de Apoyo a la Supervisión

Helver Fabian Casallas Romero - Apoyo Principal Juan Sebastian Cedenro Rodriguez - Apoyo Principal Juan Sebastian Cedeño Rodriguez - Apoyo Principal

Información Contractual


Número de contrato	IDU-1601-2019 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapa Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO CARACAS SUR
Valor Sin Adiciones	\$ 256.554.412.806,00
Valor Adiciones	\$ 9.334.424.237,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 15.120.558.567,00
Total Contrato	\$ 281.009.395.610,00
Fecha de Inicio	26/12/2019
Fecha de Finalización	11/09/2029

Número de contrato	IDU-1605-2019 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapa Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS
Valor Sin Adiciones	\$ 21.218.407.533,00
Valor Adiciones	\$ 6.373.741.502,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 27.592.149.035,00
Fecha de Inicio	26/12/2019
Fecha de Finalización	11/09/2029

Nueva Caracas Sur



Nueva Caracas Sur

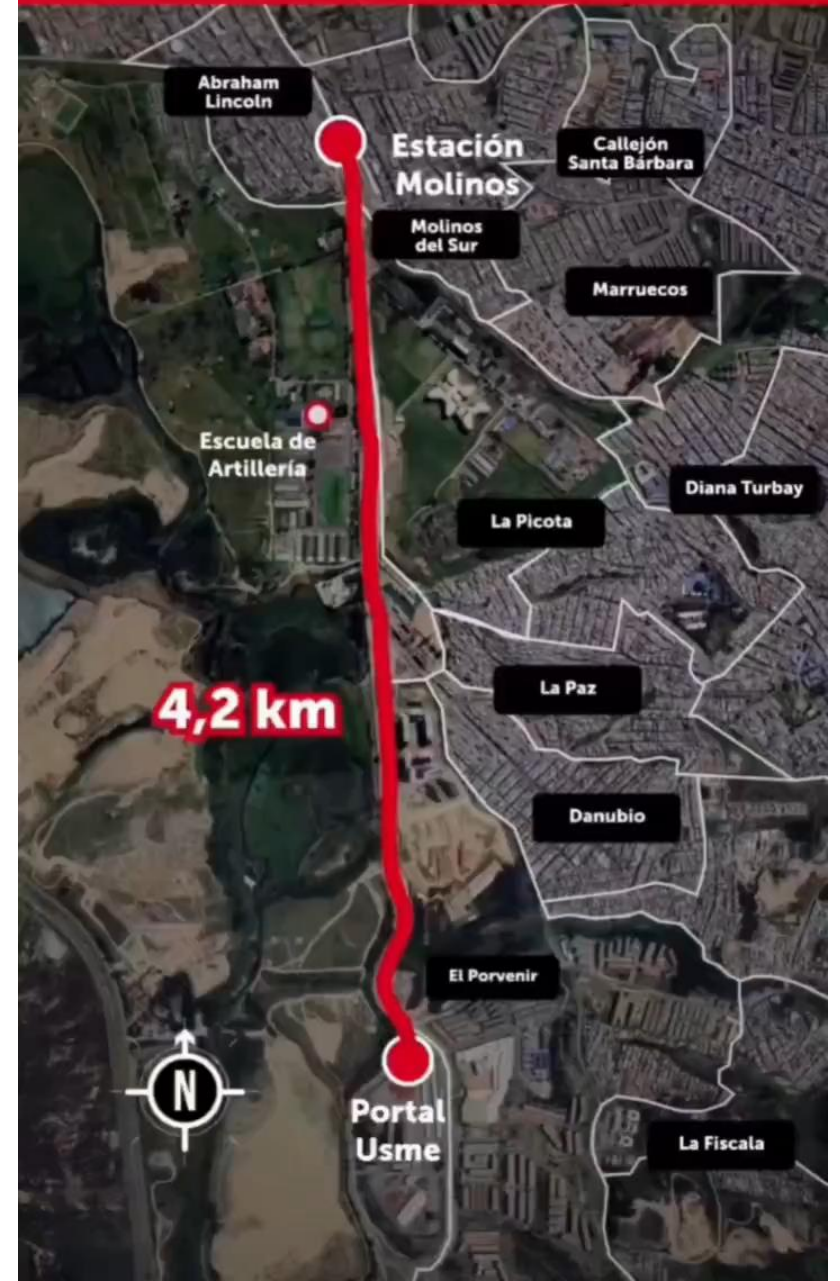

BOGOTÁ



Etapa de construcción



INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO

BOGOTÁ



IDU-345-2020

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.. (GRUPO 1): CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CALLE 18 SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C

Descripción del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.. (GRUPO 1): CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO

Fecha de actualización: 27/07/2026

[Descargar Informe de Avance PDF](#)

Equipo de Apoyo a la Supervisión

👤 Alvaro Francisco Arroyo Caycedo - Apoyo Principal 👤 Luis Fernando Zamora Pita - Apoyo Principal 👤 Claudia Fabiola Garcia Pinzon - Apoyo Principal 👤 Roberto Manuel Carrillo Rodriguez - Apoyo Principal

Información Contractual

Número de contrato	IDU-599-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A
Valor Sin Adiciones	\$ 34.830.386.494,00
Valor Adiciones	\$ 3.093.747.294,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 37.724.113.788,00
Fecha de Inicio	25/08/2020
Fecha de Finalización	24/10/2032

Número de contrato	IDU-345-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68
Valor Sin Adiciones	\$ 356.558.147.916,00
Valor Adiciones	\$ 24.754.784.019,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 381.312.911.935,00
Fecha de Inicio	25/08/2020
Fecha de Finalización	24/10/2032

Información contractual



Entidad Contratante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Interventoría: Ayesa Ingeniería y Arquitectura S.A.U Sucursal Colombia

Contratista: Consorcio Eucarístico Cra.68

Proyecto Av. 68 desde la Autopista sur hasta la calle 18 sur – G1




El proyecto cuenta con **tres frentes de trabajo**:

1. Av.68 con Primero de mayo – sector El pulpo – Intercambiador
2. Corredor Av. 68
3. Autopista Sur - Puente vehicular Venecia

Generalidades del contrato

Construcción para la adecuación al sistema TransMilenio de la avenida Congreso Eucarístico (carrera 68) desde la carrera 9 hasta la Autopista Sur y obras complementarias en Bogotá D.C – Grupo 1 – entre la Autopista Sur y calle 18 sur.

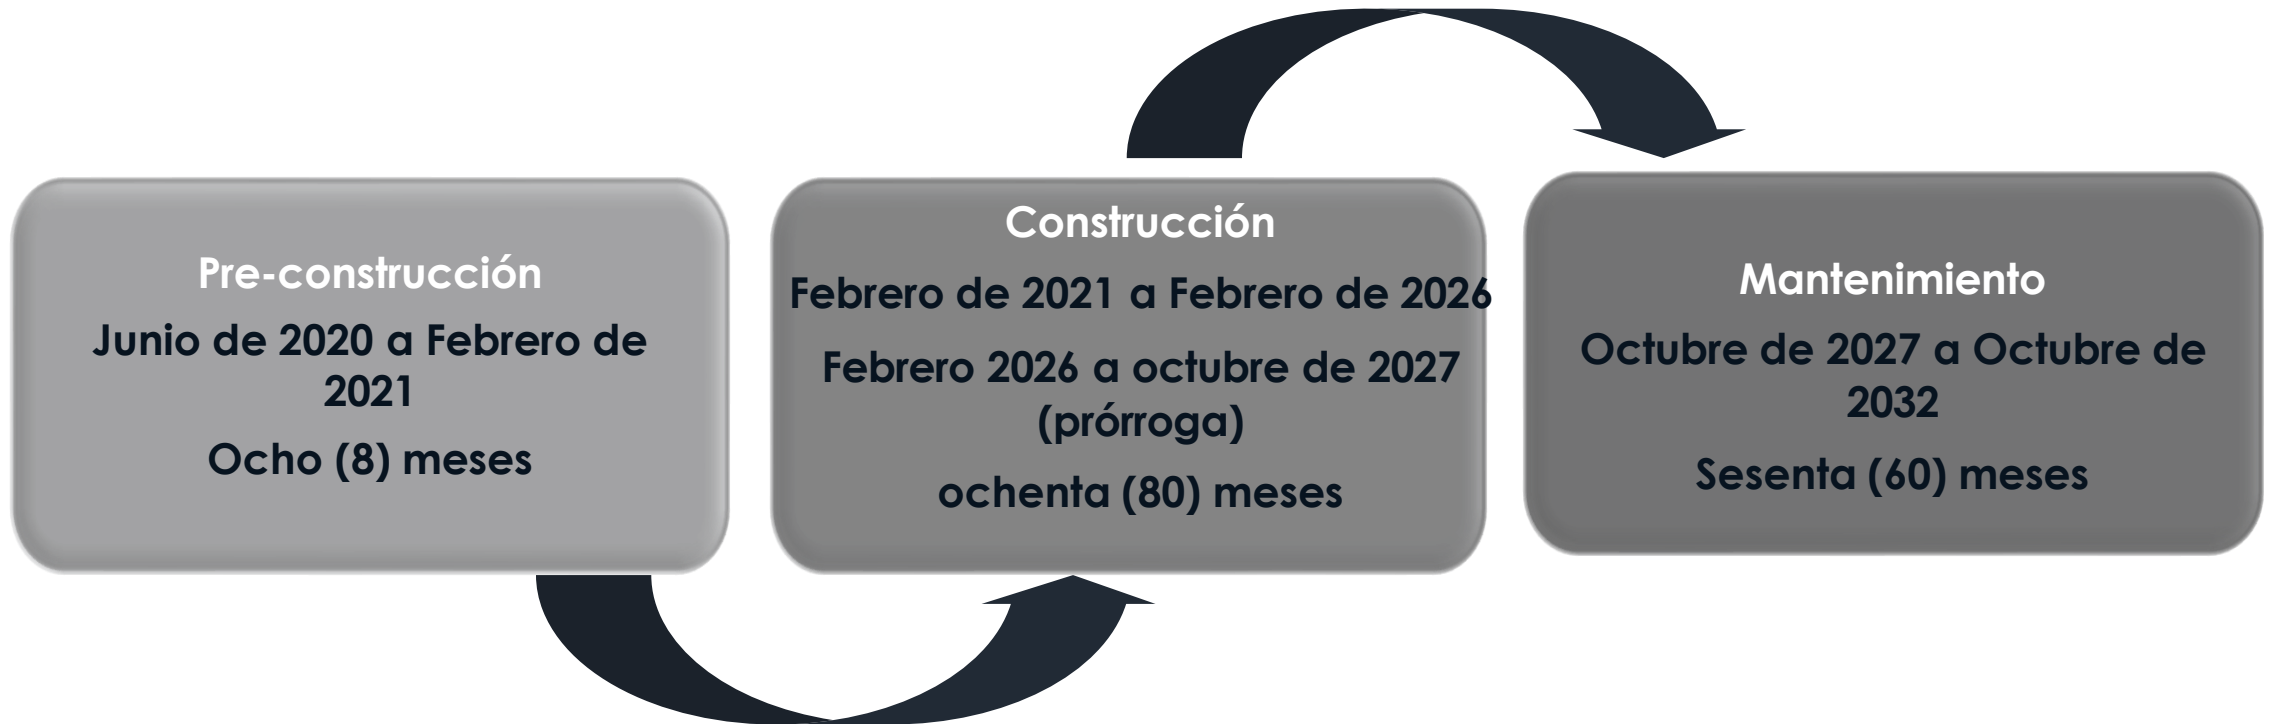

Componente técnico



Proyecto Av. 68 desde la Autopista sur hasta la calle 18 sur – G1



El proyecto cuenta con **tres frentes de trabajo**:

1. Av.68 con Primero de mayo – sector El pulpo – Intercambiador
2. Corredor Av. 68
3. Autopista Sur - Puente vehicular Venecia

Avance de obra

73 %

AUTOPISTA SUR – Puente vehicular Venecia



Avance de obra – Puente vehicular Venecia



Construcción de estructura de vía puente de Venecia



Construcción de muros de acompañamiento en el eje 6.



Construcción de losa retorno oriente - oriente

Avance de obra – **Puente vehicular Venecia**



Se han construido 12 pilas de las 12 proyectadas – Actividad finalizada

Instalación de baranda metálica sobre los eje 3,4 y 6



El puente tiene 4 estribos de los cuales:
4 contruidos totalmente – Actividad Finalizada

Actividades de construcción de Barretes para la ampliación del deprimido Autopista Sur.



Avance de obra – **Puente vehicular Venecia**

Habilitación Eje 8 - Paralela Autopista sur



Diálogo y comunicación estratégica



📢 ¡Haz parte del Comité IDU de tu comunidad!



👉 El **Comité IDU** es un grupo de ciudadanos residentes y/o comerciantes del área de influencia del proyecto, que de manera **voluntaria**:

- ✓ Hacen seguimiento a las obras.
- ✓ Reciben y divulgan información del proyecto.
- ✓ Canalizan inquietudes de la comunidad.
- ✓ Proponen soluciones y aportes.

💡 Ser parte del Comité te permite **participar activamente** en el desarrollo de tu barrio, aportar a la **transparencia** y garantizar que las obras se realicen pensando en la comunidad.

🔑 **¡Inscríbete y participa!**
Con tu voz, construimos una mejor ciudad.

Punto de atención a la comunidad



Calle 30 Sur N.º 52c-24 Barrio Los Ángeles



Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada Continua.



Virtual: puntoidu345@mhc.com.co



Teléfono: 601-8088845 - Celular: 322-2344219



**Coloque una
imagen de su
localidad**

Gracias

Síguenos en nuestras redes sociales

    @IDUBogota  @IDUobras
