

Presentación general 2021




Avance PLMB

¿Quién construye el metro?



Modelo de gestión del proyecto

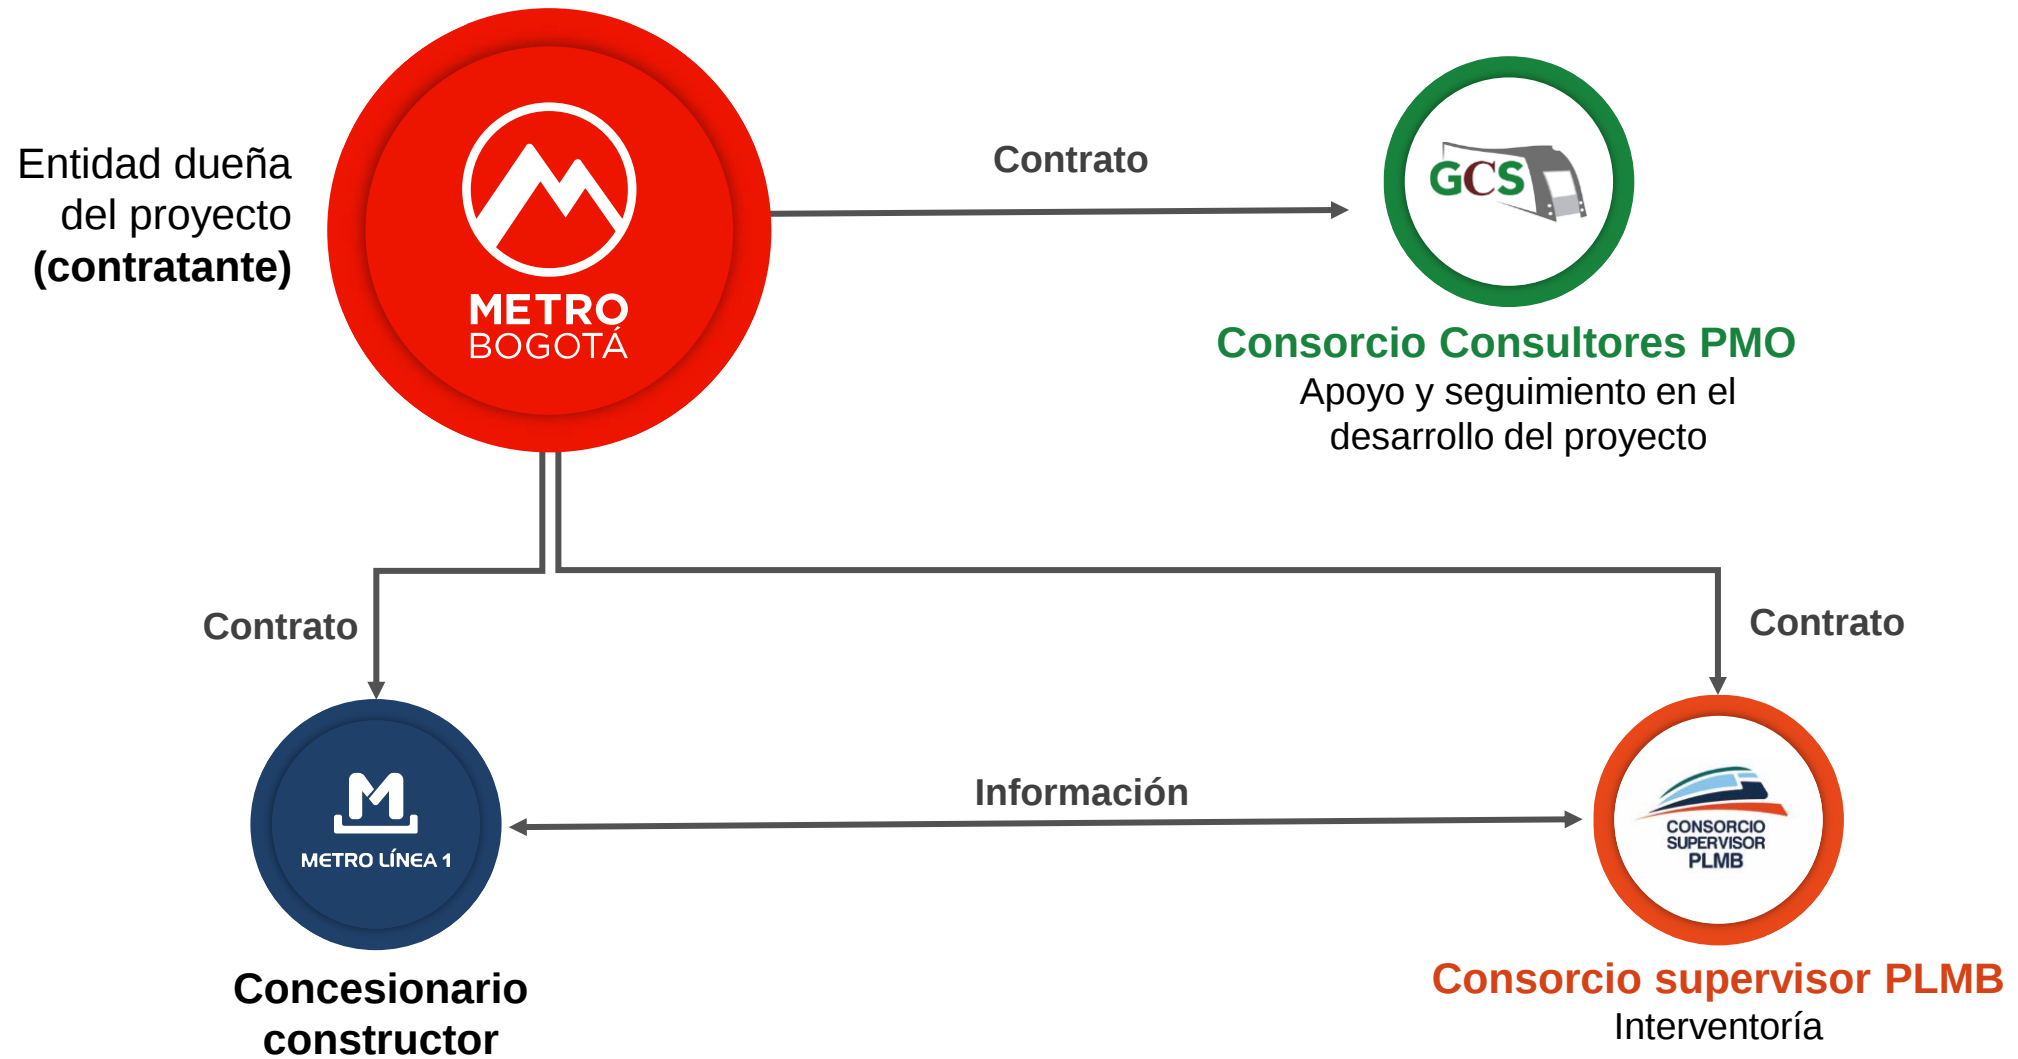

PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ



CRONOGRAMA PLMB

27
meses

Fase previa

(octubre 20 de 2020 a enero 9 de 2023)

Cierre financiero ML1 **\$1,95 bill.**

Fecha: 30 días hábiles siguientes al cumplimiento de todas las demás condiciones precedentes para el inicio de la fase de construcción.

57
meses

Fase de construcción

(enero 10 de 2023 a agosto 26 de 2027)

6
meses

Fase de pruebas (marcha blanca)

(agosto 27 de 2027 a marzo 14 de 2028)

20
Años

Inicio operación comercial

(marzo 15 de 2028)

597 unidades
de ejecución



Fase previa

- Diseños detalle
- Adecuación terrenos del patio taller
- Intercambio vial en la calle 72 con avenida Caracas
- Desvío de redes de servicios públicos
- Recibo de predios adquiridos por la Empresa Metro de Bogotá
- Planes de manejo de tráfico (PMTs)
- Adecuación de vías de desvíos de tráfico
- Actualización del Plan de Manejo Ambiental y Social
- Actualización del Estudio de Impacto Ambiental y Social y sus instrumentos


Plan de obras





Trazado PLMB localidad Barrios Unidos




Localidad Barrios Unidos

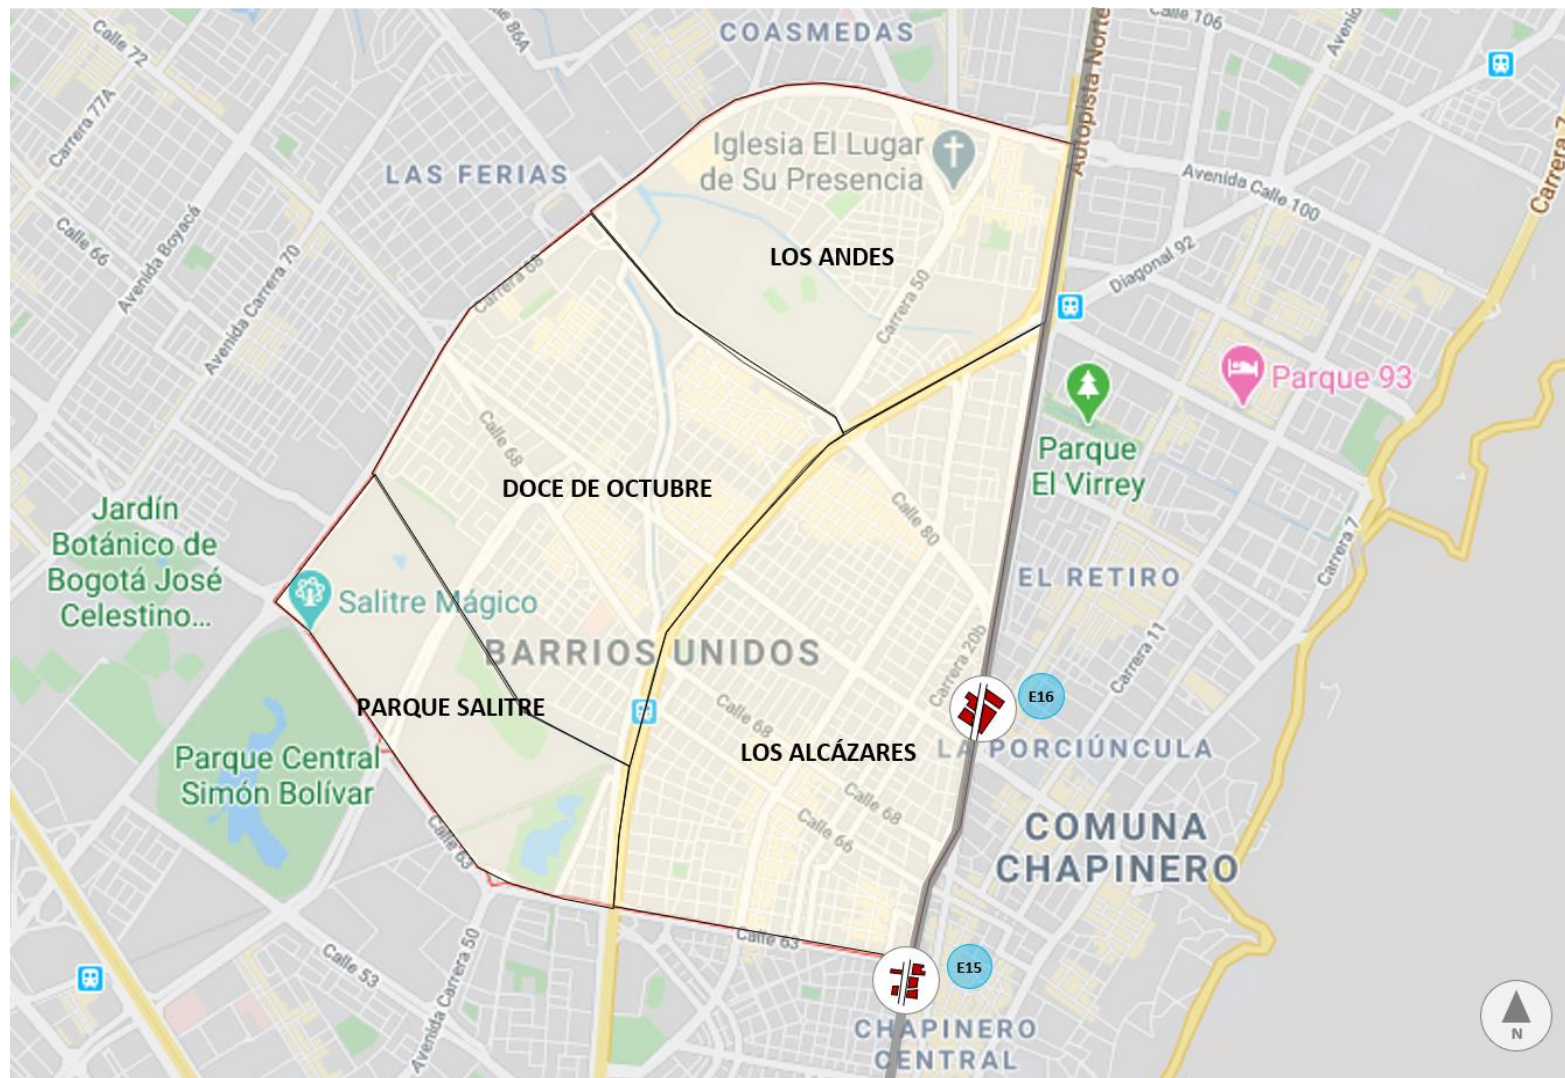

Perfil actual Av. Caracas

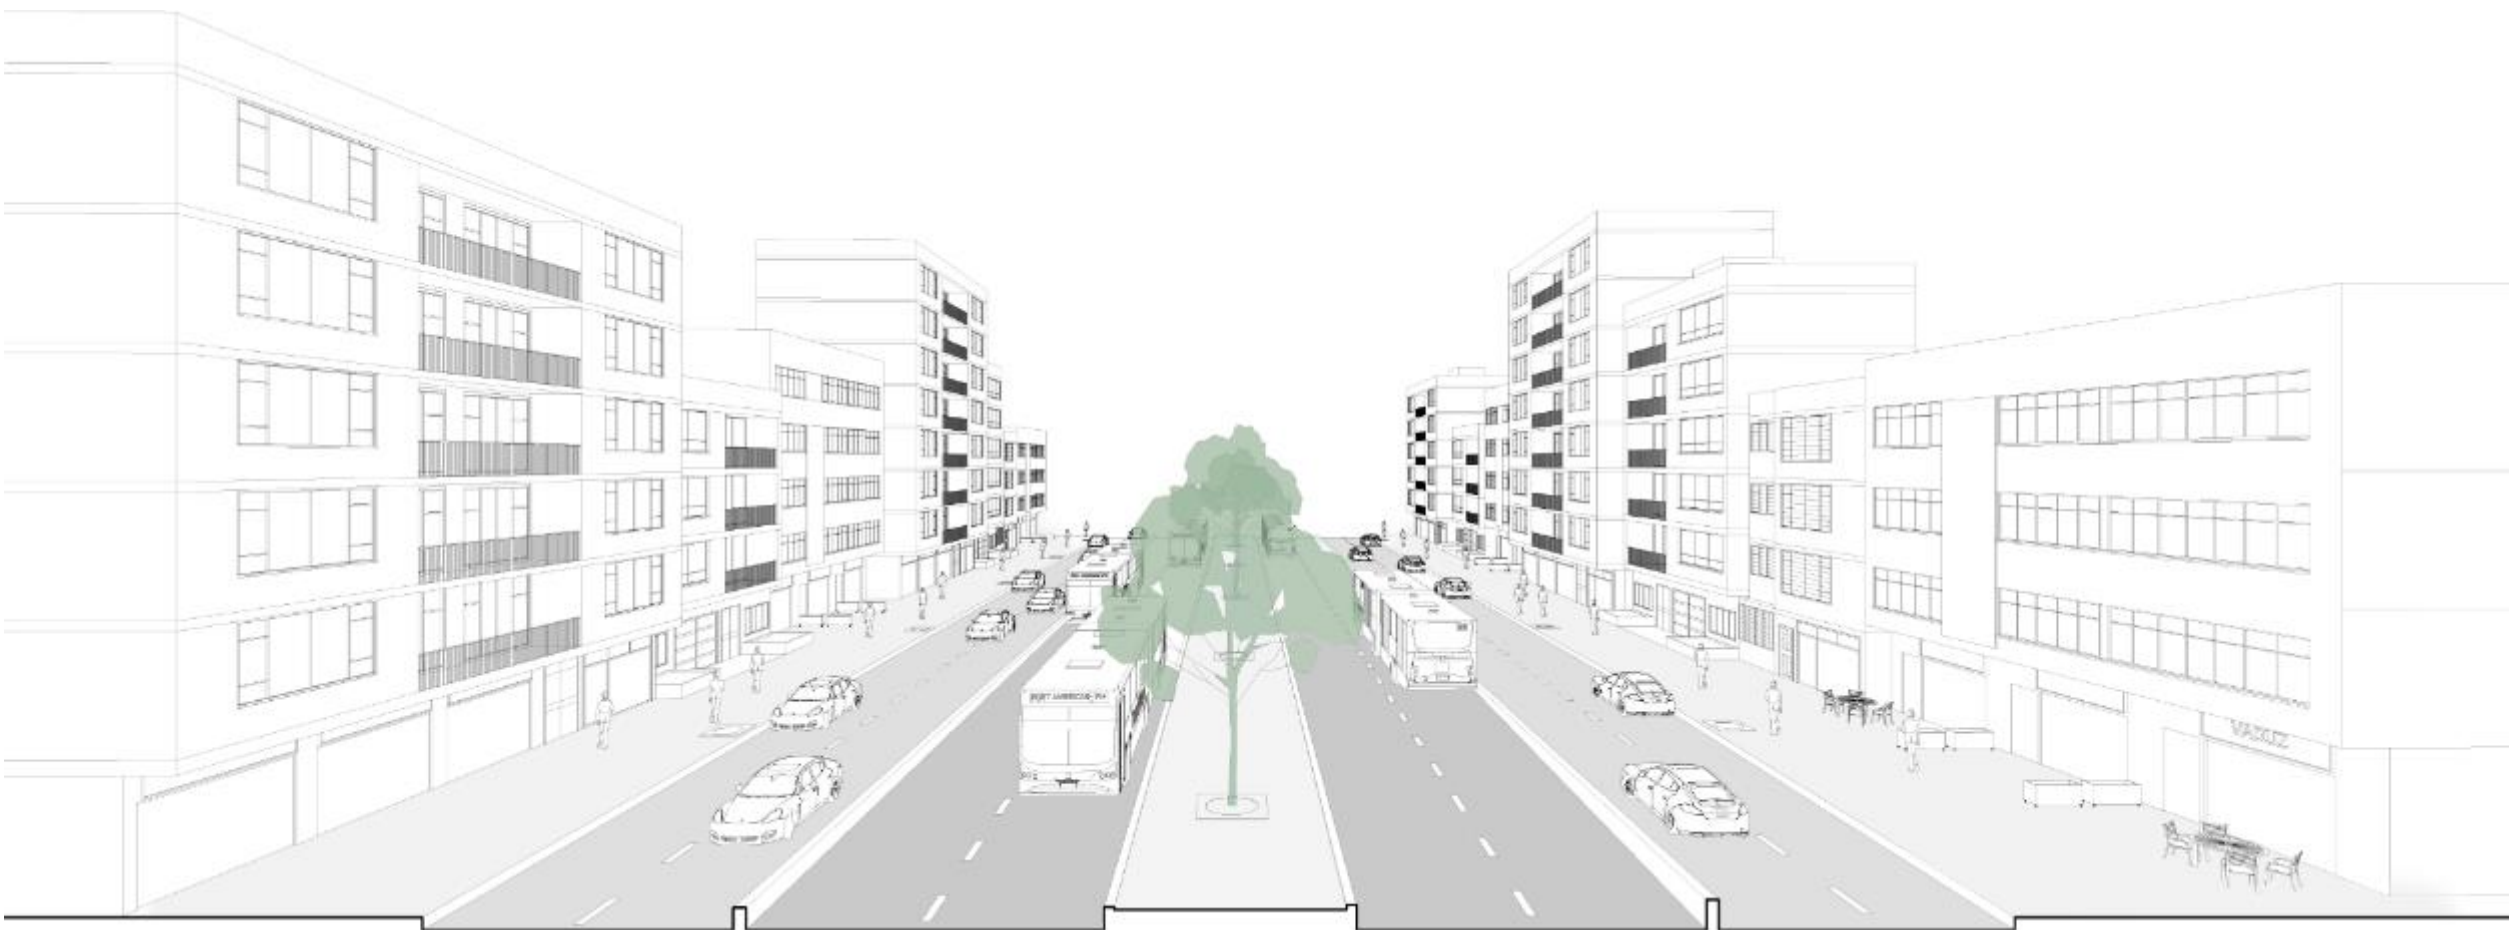

Av. Caracas: futuro perfil

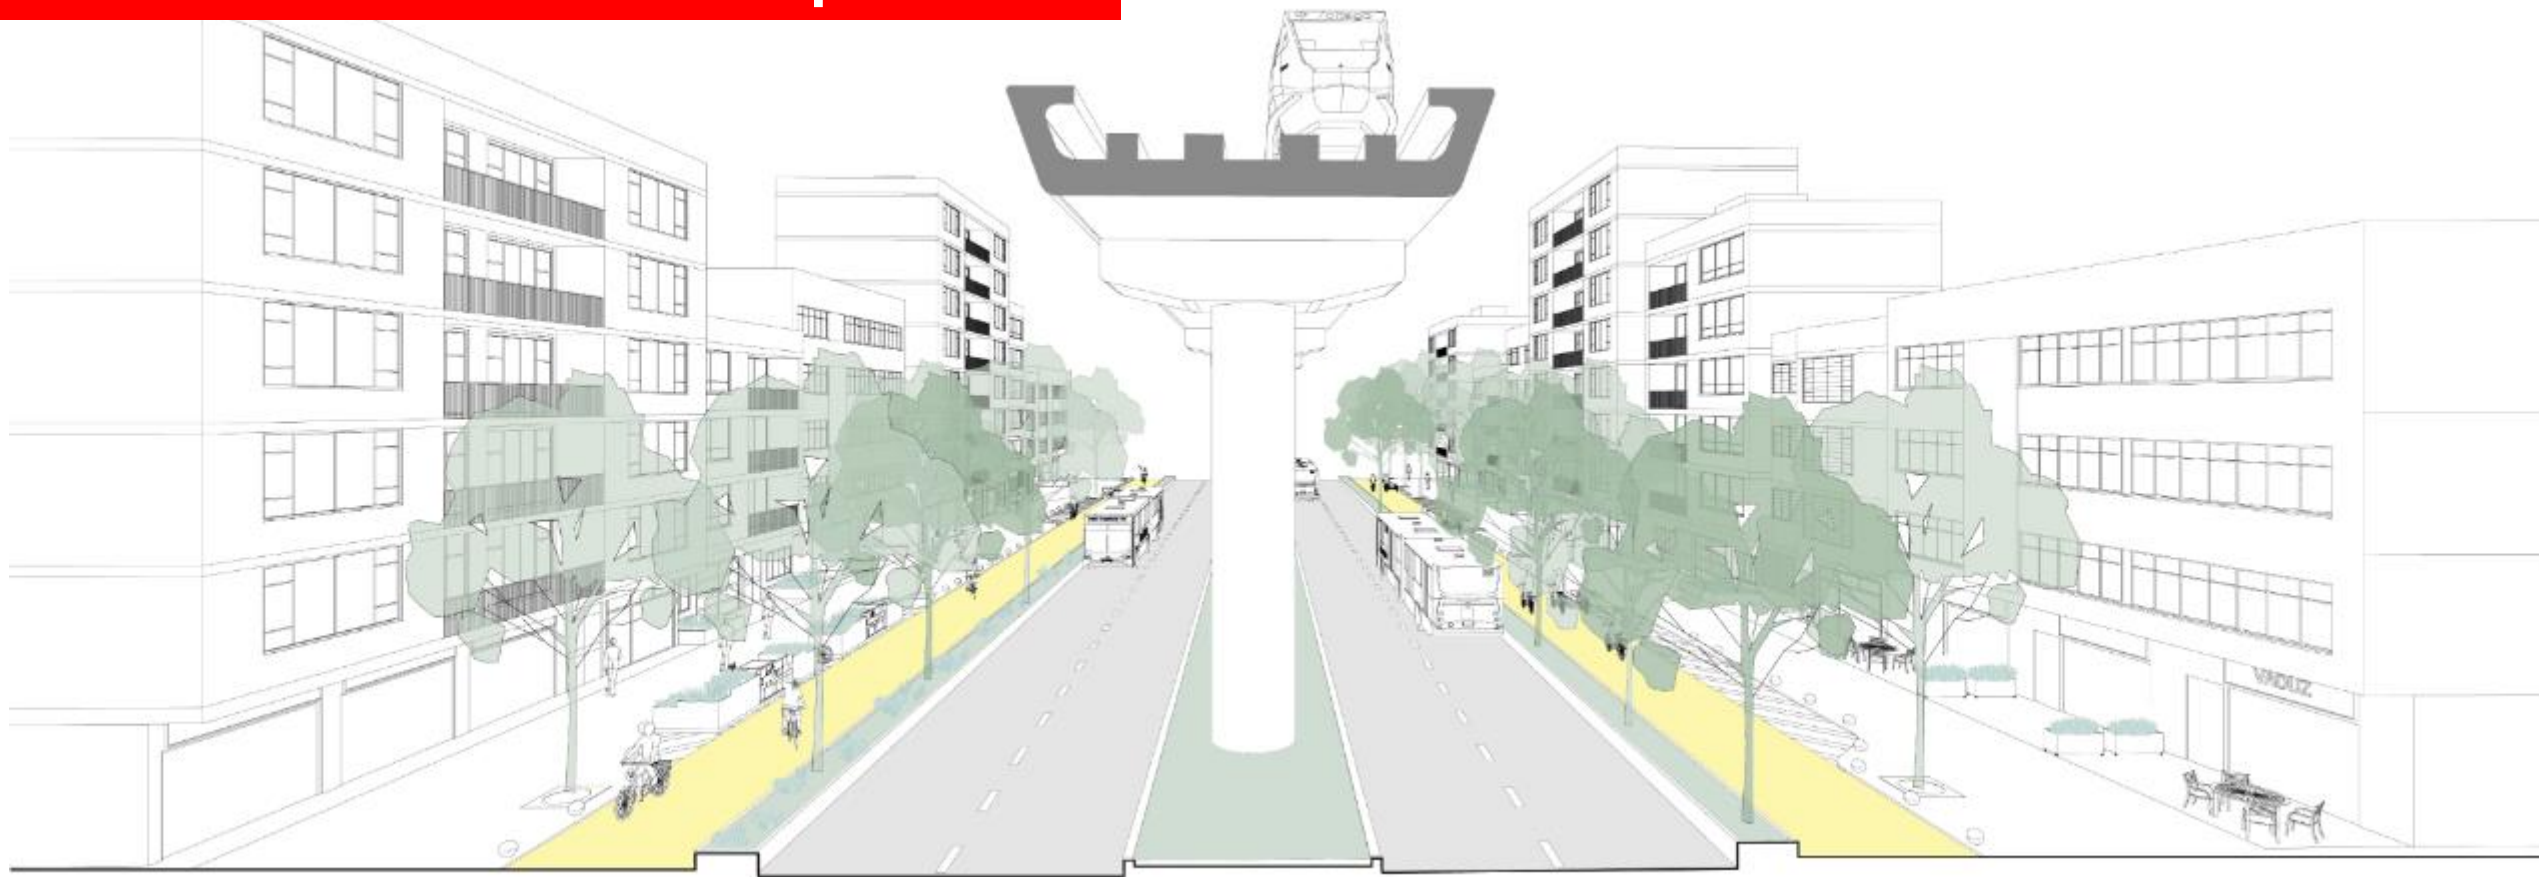

**FRANJA DE
CIRCULACIÓN
PETONAL**

**FRANJA
DE
PAISAJIS
MO Y
MOBILIARI
O**

**CARRIL DE
TRÁFICO
VEHICULAR
RESTRINGIDO**

**FRANJA
DE
PAISAJIS
MO Y
MOBILIARI
O**

**CALZADA
TRANSMILENIO**

SEPARADOR

**CALZADA
TRANSMILENIO**

**FRANJA
DE
PAISAJIS
MO Y
MOBILIARI
O**

**CARRIL DE
TRÁFICO
VEHICULAR
RESTRINGIDO**

**FRANJA DE
PAISAJIS
MO Y
MOBILIARI
O**

**FRANJA DE
CIRCULACIÓN
PETONAL**

La Av. Caracas se convertirá en un corredor integral de transporte sostenible

Traslado de redes



117 obras



Traslado de redes

Componente TAR PLMB – T1

EAB



CODENSA



GAS NATURAL



ETB



TELEFÓNICA



No. de obras

28

7

11

39

32

117 obras

COP\$323 mil mill.

Comprometido a 2020 COP\$237 mil. mill.

Hemos pagado a 2020 \$129 mil mill.

Fin de gestión: ene 2023

EMB

TAR

ESP

Traslado de redes

Proyección semáforo e indicador TAR AT-12*

E.S.P.	Alertas por holgura con fecha para concesión				Total x ESP
	Menor a 3 meses	≤3 meses < 6 meses	> 6 meses	X	
EAAB	4	3	5	15	27
CODENSA	3	1	1	0	5
Vanti	1	5	2	0	8
ETB	5	5	11	1	22
TEL	0	4	6	18	28
Total x interferencia	13	18	25	34	90

* Fuente: PMO. Escenario proyectado con base en la mejor información disponible a abril 2021

Semáforo por holguras entre la fecha de término de las obras por cada interferencia y la fecha de entrega del sector (estación o interestación) determinada en el AT-12. No se tienen en cuenta las interferencias ejecutadas a la fecha (27) y las eliminadas (6).

X

No cuenta con holguras, por lo tanto la probabilidad de un incumplimiento es muy alta.

Gestión socio **predial**



1.443 predios



Gestión socio-predial PLMB – Tramo 1

Avance en la gestión a abril del 2021

Para la construcción de la
Primera Línea del Metro de
Bogotá – Tramo 1 se
requieren

1443 predios



1443

100%

	Mar 2021 CORTE 31/03/2021		Abr 2021 CORTE 30/04/2021		AVANCE DIFERENCIA MAR - ABR	
Avalúos comerciales solicitados	1246	86%	1262	87%	16	1,1%
Avalúos comerciales aprobados	970	67%	988	68%	18	1,2%
Ofertas de compra expedidas	970	67%	972	67%	2	0,0%
Promesas de compraventa firmadas	757	52%	771	53%	14	1,0%
Entregas a la EMB - IDU	579	40%	601	42%	22	2,0%
Entregas de IDU a EMB	26	2%	99	7%	73	5,1%
Disponibles entrega material al concesionario*	26	2%	99	7%	73	5,1%
Entregas al concesionario	78	5%	78	5%	0	0,0%


*Predio con cerramiento, sin ocupantes y demolido a nivel de andén (no todos los predios requieren proceso de demolición).

Proyección de entrega de predios según AT12

Avance en la gestión a abril del 2021

Para la construcción de la
Primera Línea del Metro de
Bogotá – Tramo 1 se
requieren


1443 predios

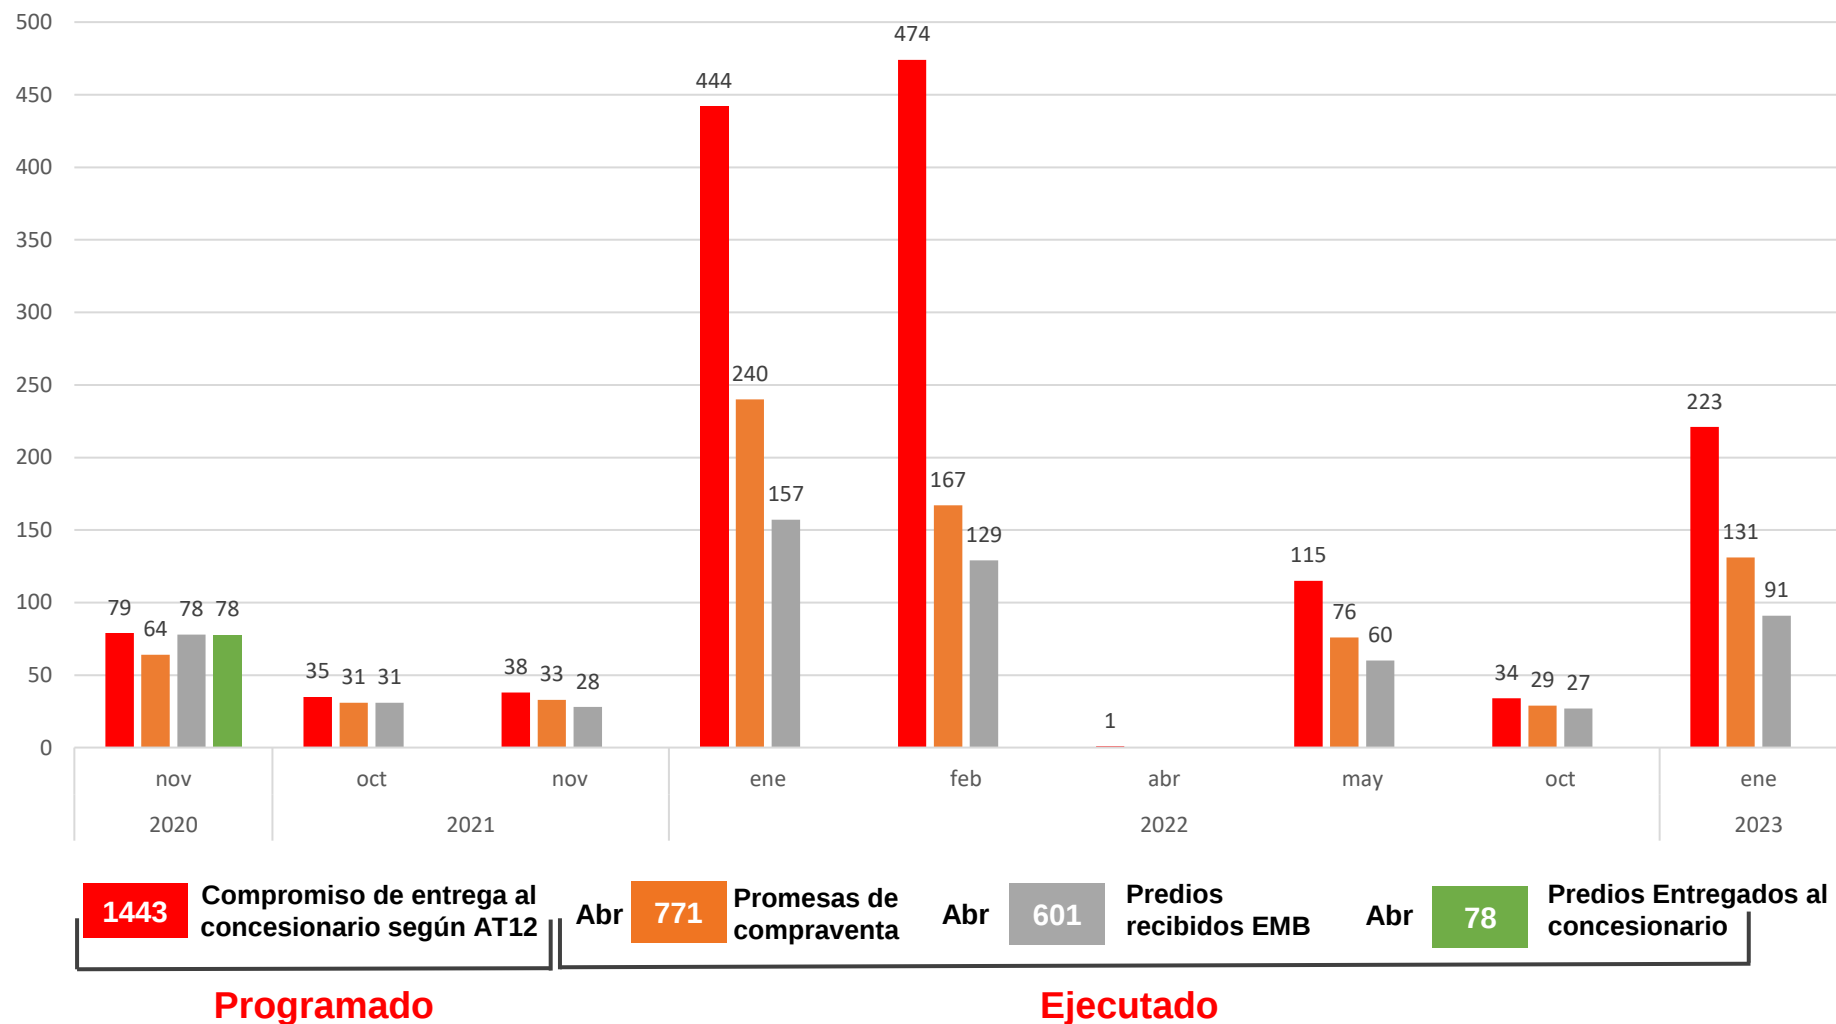

Proceso de gestión predial en Barrios Unidos



Estado actual de gestión predial

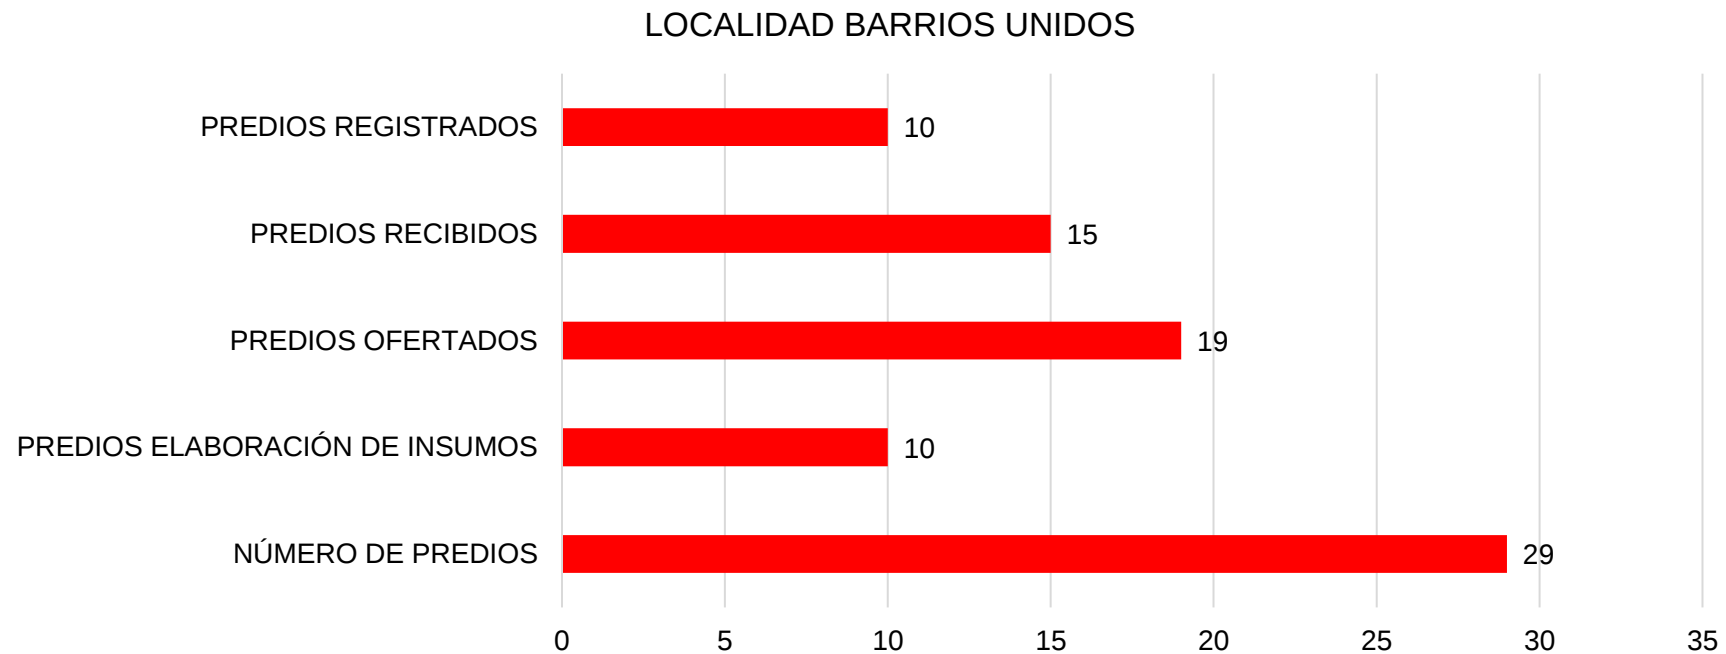

LOCALIDAD	NÚMERO DE PREDIOS	PREDIOS ELABORACIÓN DE INSUMOS	PREDIOS OFERTADOS	PREDIOS RECIBIDOS	PREDIOS REGISTRADOS
BARRIOS UNIDOS	29	10	19	15	10
TOTAL	29	10	19	15	10

Articulación POT



Articulación POT - Empresa Metro de Bogotá

Para impulsar la definición y la ejecución de las Líneas 1 y 2 y de las líneas férreas en el POT, la EMB ha trabajado de manera articulada con la Secretaría Distrital de Planeación, entidad encargada de la formulación del POT, y con la Secretaría de Movilidad, cabeza de sector, en torno a los siguientes componentes:

1.

Definición de las condiciones para la inserción urbana de las líneas 1 y 2 de metro, que incluye los trazados actuales, los futuros y las reservas; los requerimientos funcionales y su articulación con los perfiles viales; las condiciones y la normativa que permita viabilizar la localización de la infraestructura de soporte (patio talleres, estaciones, entre otros).

2.

Articulación de las líneas 1 y 2 de metro con la estructura ecológica principal y los sistemas de movilidad, de servicios públicos, de espacio público y el sistema de patrimonio en particular.

Articulación POT - Empresa Metro de Bogotá

3. Potenciar el sistema de cuidado, a través de los proyectos de iniciativa pública, desarrollos inmobiliarios donde se podrán generar equipamientos que respondan a las vocaciones de las estaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo.
4. Estructurar las líneas 1 y 2 de metro con el modelo de ocupación urbana como una oportunidad para mejorar la calidad urbana, ambiental, paisajística y de espacio público a lo largo del trazado.
5. Integrar el modelo de captura de valor desarrollado por la EMB para generar recursos provenientes de los proyectos que se ejecuten en el área de influencia.
6. Establecer los instrumentos de financiación que permiten destinar los recursos generados por la captura de valor a la EMB.

Normativa sobre infraestructura de transporte metro y líneas férreas

Articulación de la línea 1, la línea 2 y las líneas adicionales de metro, con las estructuras y sistemas del POT.



Estructura ecológica principal:

Armonización de la infraestructura de la línea 1, la línea 2 y las líneas adicionales de metro con la estructura ecológica principal y el sistema de áreas protegidas. (Trazado y patios).



Sistema de movilidad:

Integrar la línea 1, la línea como un componente del sistema y velar por su articulación con las demás infraestructuras de transporte y movilidad.



Sistema de servicios públicos:

Establecer condiciones de armonización con la infraestructura de redes de servicios públicos que se deban intervenir durante la ejecución de las obras. EAAB, CODENSA (subestaciones).



Sistema de espacio público

Condiciones para la desafectación y restitución del espacio público cuando EMB genere desarrollos urbanos.



Sistema de patrimonio cultural

Normativa sobre infraestructura de transporte metro y líneas férreas

Incluir el modelo de captura de valor en el POT


- **Modelo propuesto por la EMB** que permite generar recursos en los proyectos que se ejecuten en el área de influencia.
- **Normativa para captura de valor.** Criterios para la definición de **áreas de influencia e instrumentos de planeación y gestión del suelo.**
- Destino de los recursos con **apropiación exclusiva a la EMB** para funcionamiento, inversión u operación.



PRIMER NIVEL

Explotación de los Edificios de acceso de las estaciones de la PLMB

- Áreas comerciales (72.000 m2)
- Publicidad
- Demanda de pasajeros
- Otros Negocios No Tarifarios

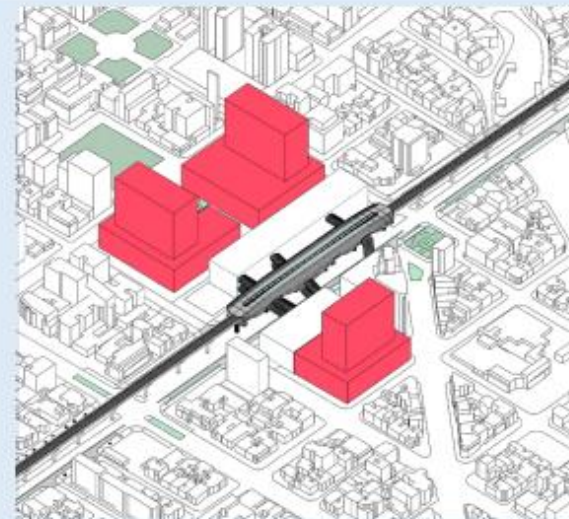

SEGUNDO NIVEL

Desarrollos Urbanos de iniciativa Pública

- AIM. Áreas de Integración Multimodal.
- Desarrollo de Proyectos de Iniciativa Pública por medio de Fichas Normativas



TERCER NIVEL

Desarrollos Urbanos de iniciativa Privada y otros instrumentos de captura de valor

- Proyectos urbanos en la modalidad de revitalización.
- Cobro de cargas urbanas
- Otros instrumentos de Captura de Valor como cobro por plusvalía.

Empleo y vinculación de la industria nacional



Empleo PLMB cifras 2020 – 2021



Durante los primeros dos años, 2020 y 2021, se están creando


3.276

empleos directos y 13.842
empleos indirectos.

Las necesidades pueden variar en cada fase del proyecto, pero, para las fases de construcción se estiman entre

5.000 y 8.950

los trabajadores directos que requerirá la obra y unos 6.000 más para la etapa final.



Además, el proyecto del metro generará también un impacto

positivo


en otras industrias paralelas generando una gran cantidad de empleos indirectos.

El metro llega a Suba y Engativá




Proyecto de expansión PLMB - FASE 2 Línea 2 del metro de Bogotá

Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

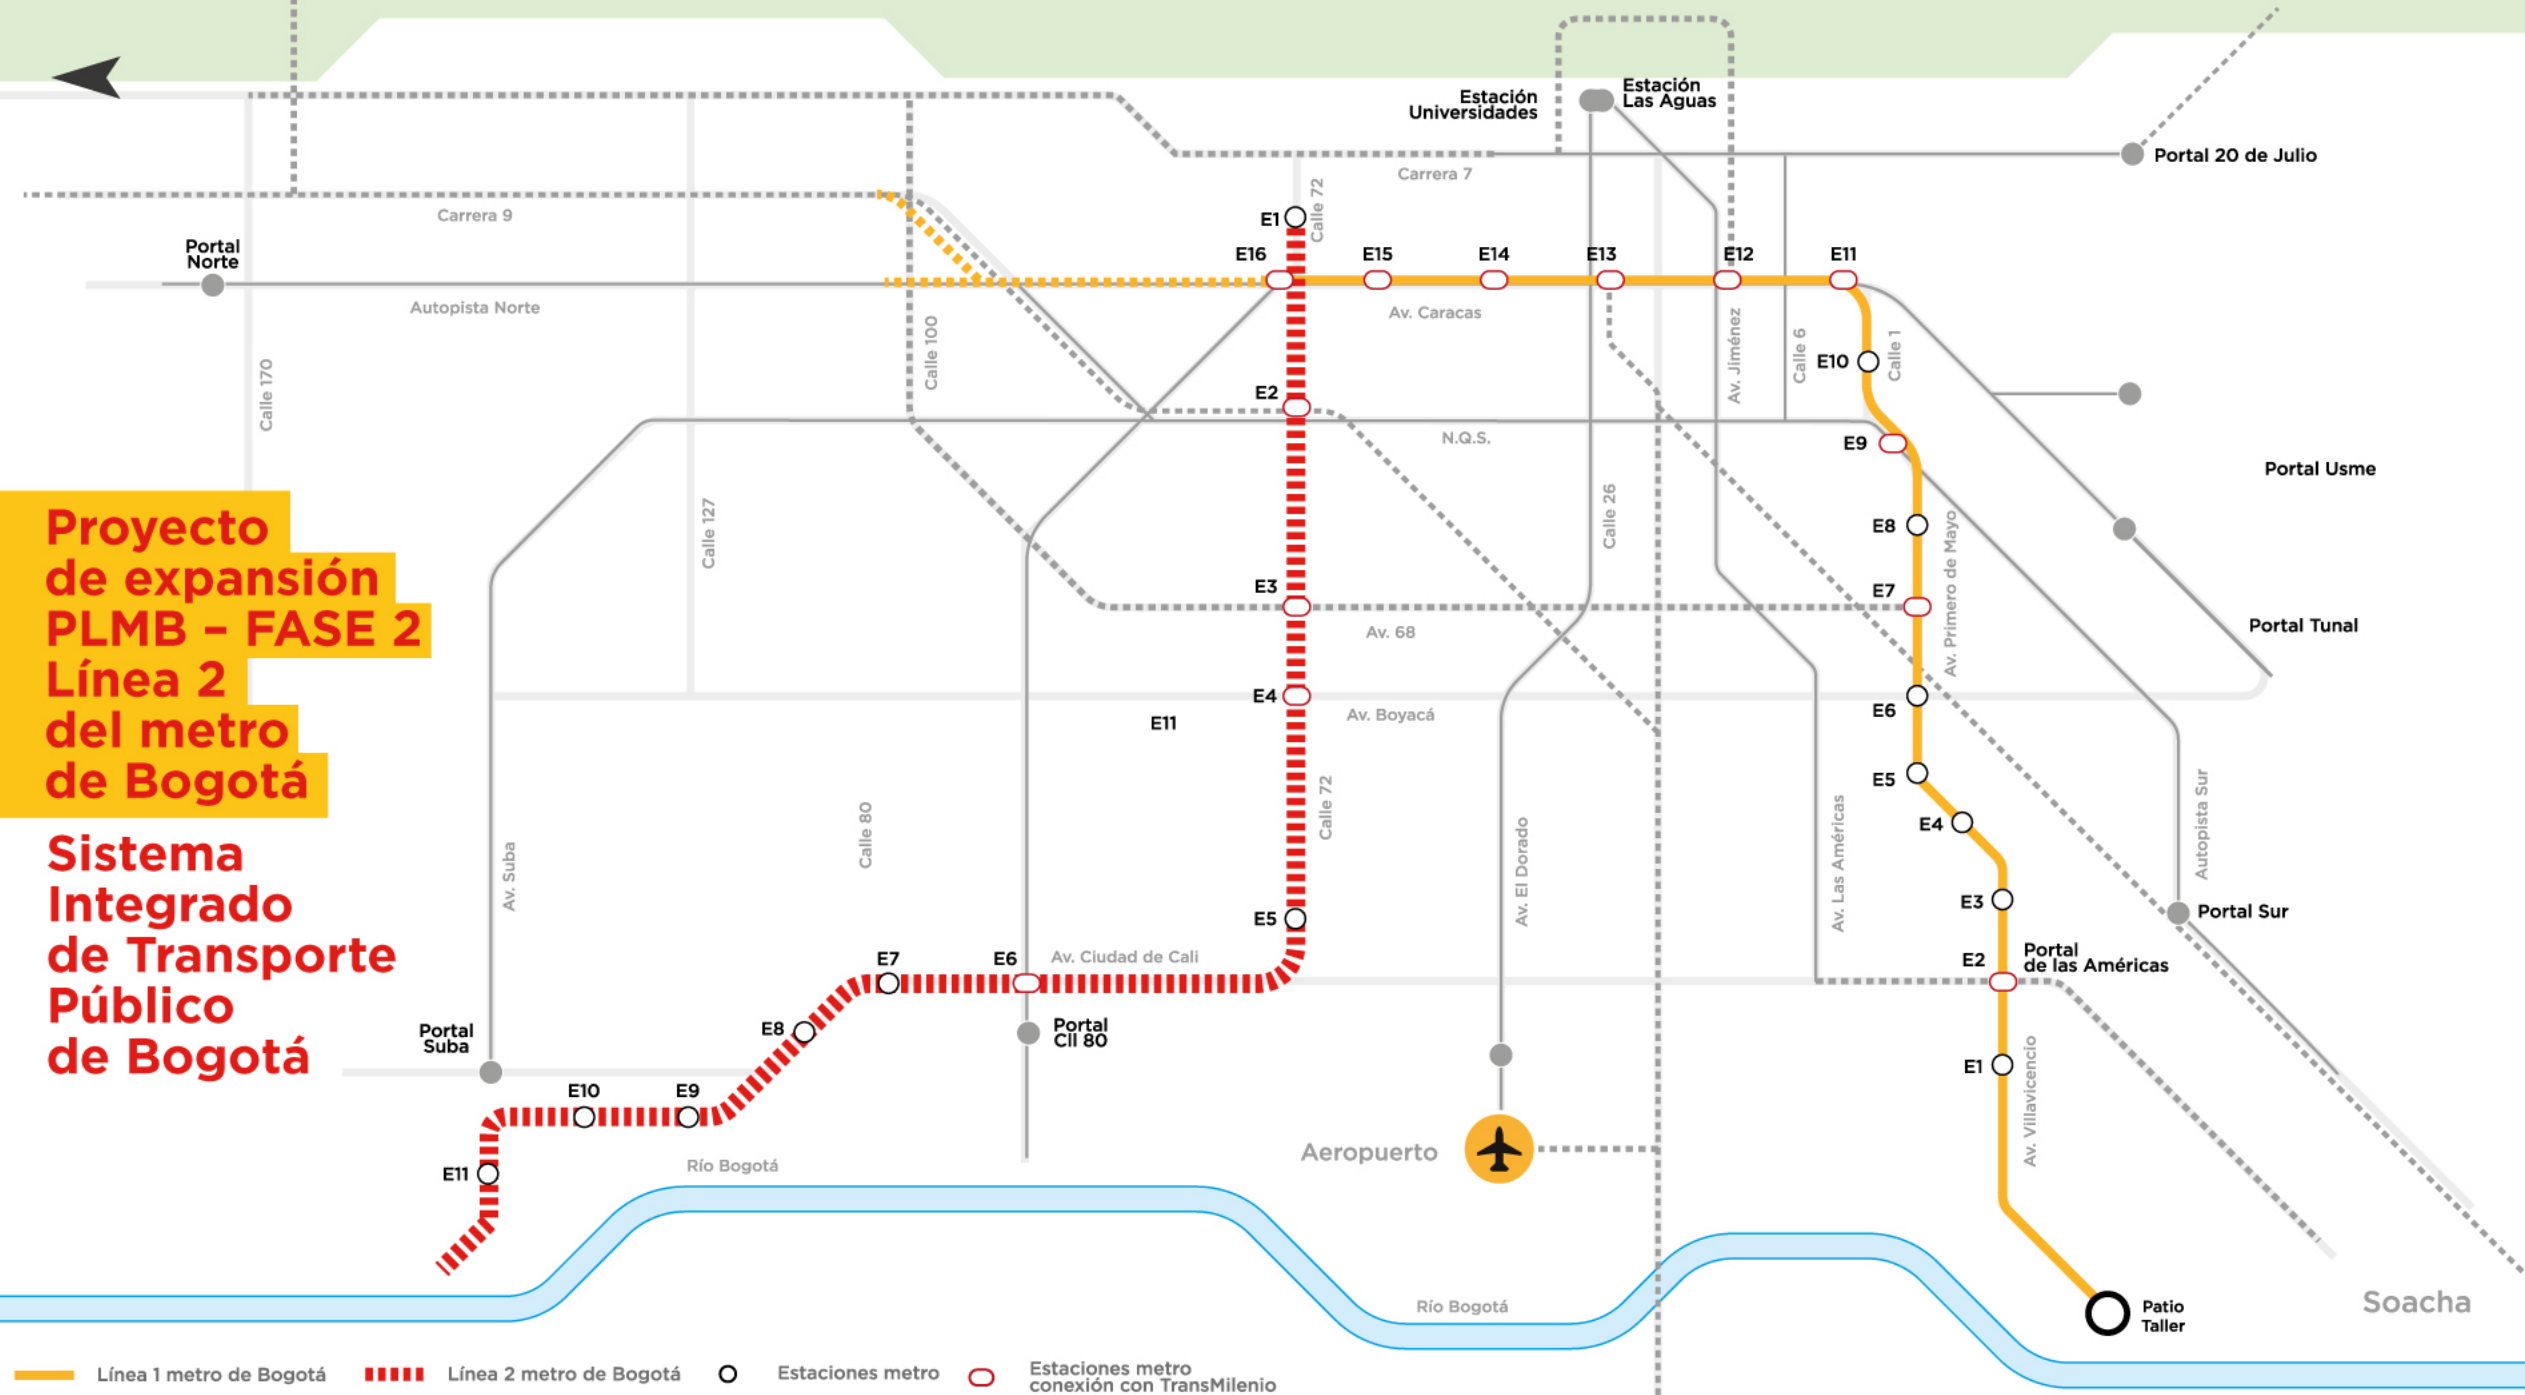

Metodología análisis de alternativas y estudio de prefactibilidad

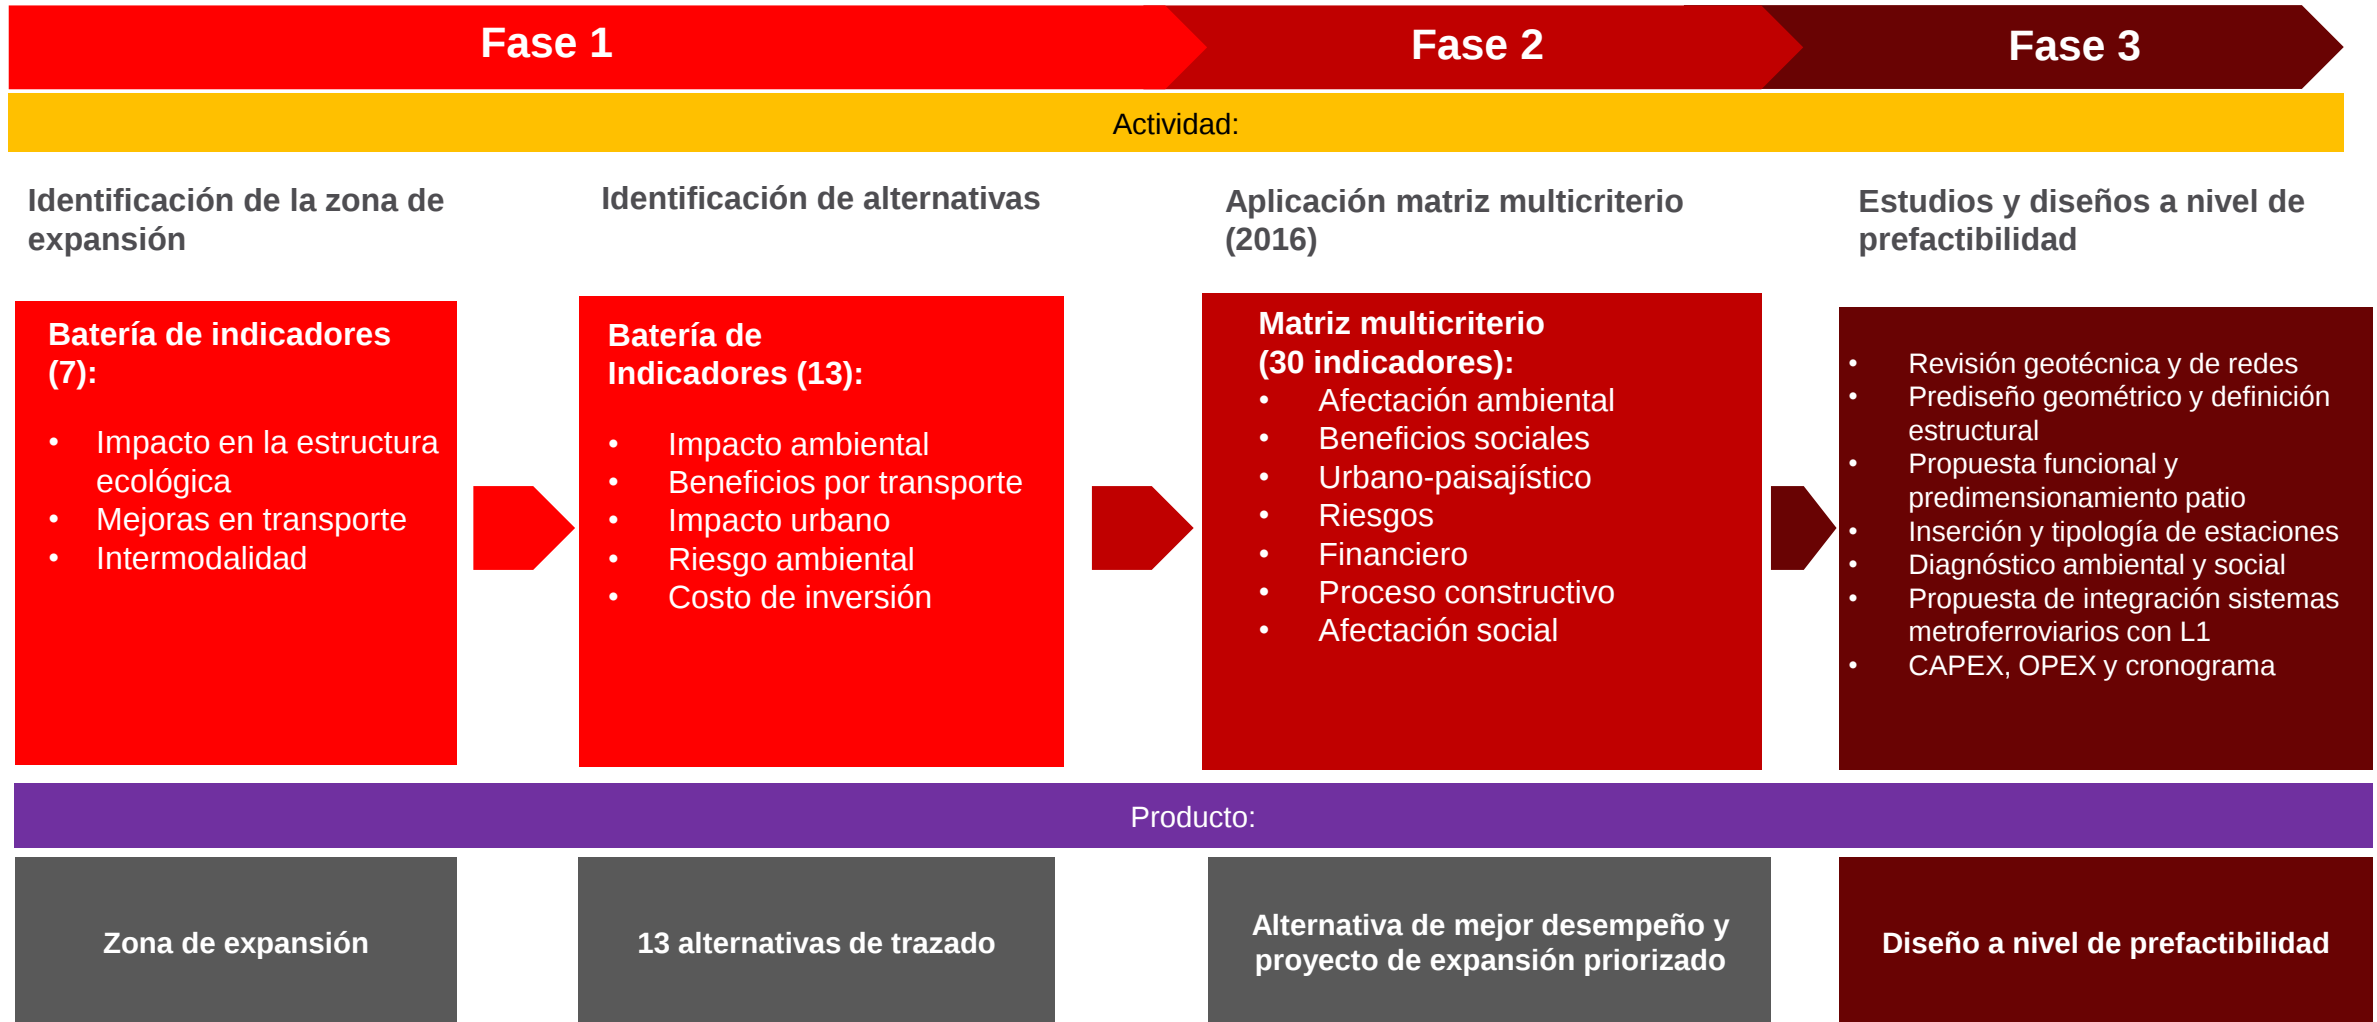

Características - Línea 2

Trazado: calle 72 – Av. Cali – ALÓ – Av. transversal de Suba

Longitud

15,8
km

Incluido el ramal
técnico

11

Estaciones



Integración con
la PLMB

22
ha

Patio taller
Fontanar del Río

13 bill.

Capex

45.000

Carga máxima
PPHS (2030)



Cantidad trenes
23 un (2030)
26 un (2050)

6
vagones

Trenes
1800 Pax. / tren

HPAM: Hora pico am

PPHS: Pasajeros por hora por sentido

CULTURA METRO



La promoción de la cultura Metro parte del entendimiento de que el metro es mucho más que un sistema de transporte, es un motor de desarrollo y de transformación urbana y social.

Las obras que mejoran la vida de las personas, como los metros, permiten reforzar la confianza de los ciudadanos, así como el sentido de pertenencia y amor por la ciudad.

Teniendo en cuenta eso, la Empresa Metro de Bogotá debe diseñar y poner en marcha estrategias para:



Convertir el metro en un símbolo de ciudad.



Promover la participación activa de las comunidades vecinas al metro, en todas las fases del proyecto, para impulsar propuestas que beneficien a las comunidades, a lo largo del trazado.



Generar solidaridad y paciencia frente al avance de las obras.



Preparar a la ciudadanía para que cuide y promueva el disfrute de la infraestructura del metro.

TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN

Micrositio WEB

GOV.CO
Ley de Transparencia y acceso a la información pública | Atención y servicios al ciudadano | Participa


METRO BOGOTÁ

Inicio · Empresa Metro · Atención al Ciudadano · Información inversionistas

Home » Información PLMB

PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ PLMB-T1


Traslado Anticipado de Redes


Gestión socio-predial


Concesión (obras civiles, material rodante, equipos y sistemas)


Interventoría


Project Management Office - PMO


Avance físico y financiero del proyecto


Visor geográfico


Cuarto de datos


Denuncias


Banco fotográfico



Agenda

COMISIÓN SEGUIMIENTO PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ INFORME FINAL / OCTUBRE 2020

NOTIFICACIONES POR AVISO

NOTIFICACIONES PROCESOS DISCIPLINARIOS

Reportes públicos de avance

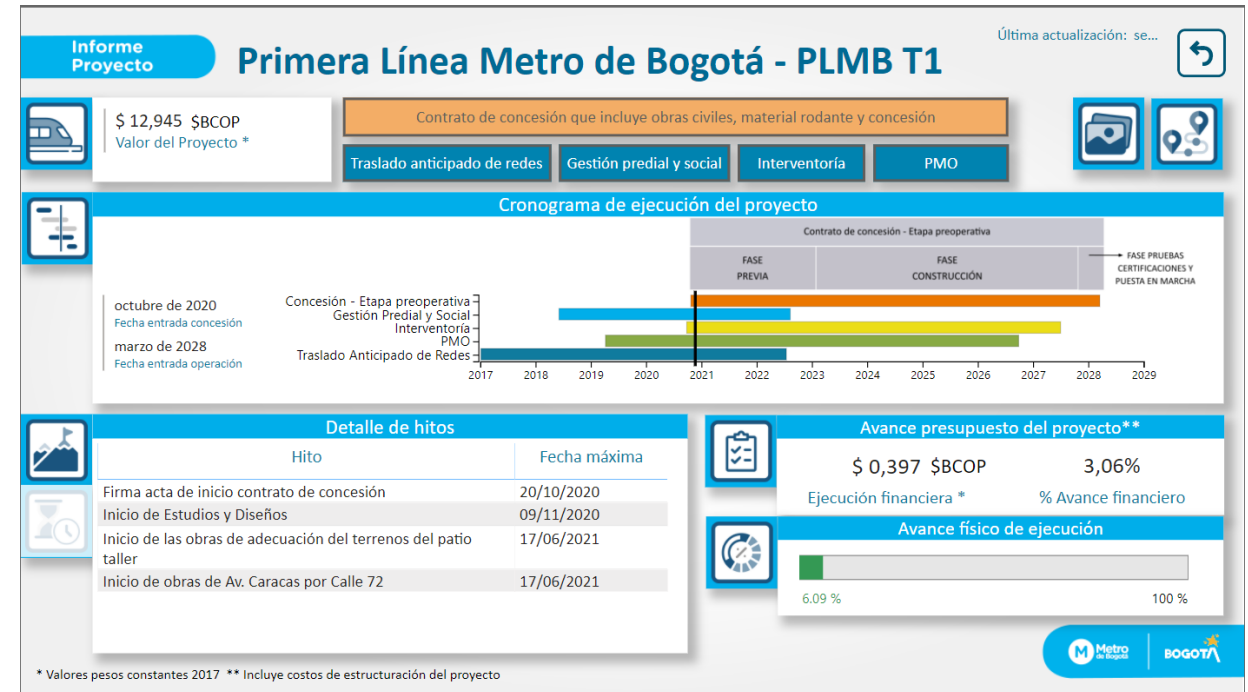



METRO
BOGOTÁ

VISÍTENOS EN:



@MetroBogota



Metro Bogotá



@elmetrobogota



@MetroBogota



Metro de Bogotá



/metrobogota
