



BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

IDU Rendición de Cuentas Sumapaz 2025

Instituto de Desarrollo Urbano

Rendición de cuentas Localidad de Los Mártires

Rendición de cuentas nodo Movilidad

30 / 04 / 25



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO



CONTENIDO

1 Presentación IDU

- Diagnóstico vial de la localidad de Los Mártires
- Información general de los proyectos IDU en la localidad de La Candelaria
- Etapa de construcción
- Etapa de E y D
- Etapa de conservación
- Preguntas e inquietudes

2 Presentación UMV

- Información general de proyectos UMV en la localidad de La Candelaria
- Etapa de conservación
- Etapa de Tapahuecos
- Diagnóstico vial


3 Diálogo con la comunidad



Localización de proyectos IDU – Localidad de Los Mártires

Misión

El propósito del IDU (Instituto de Desarrollo Urbano), para el año 2025, es el de continuar mejorando la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, a través del desarrollo de infraestructura vial y de espacio público, con un enfoque en la movilidad segura, sostenible y eficiente. Se enfoca en la conservación de la infraestructura existente y en la ejecución de nuevos proyectos para cumplir con las metas del Plan Distrital de Desarrollo.

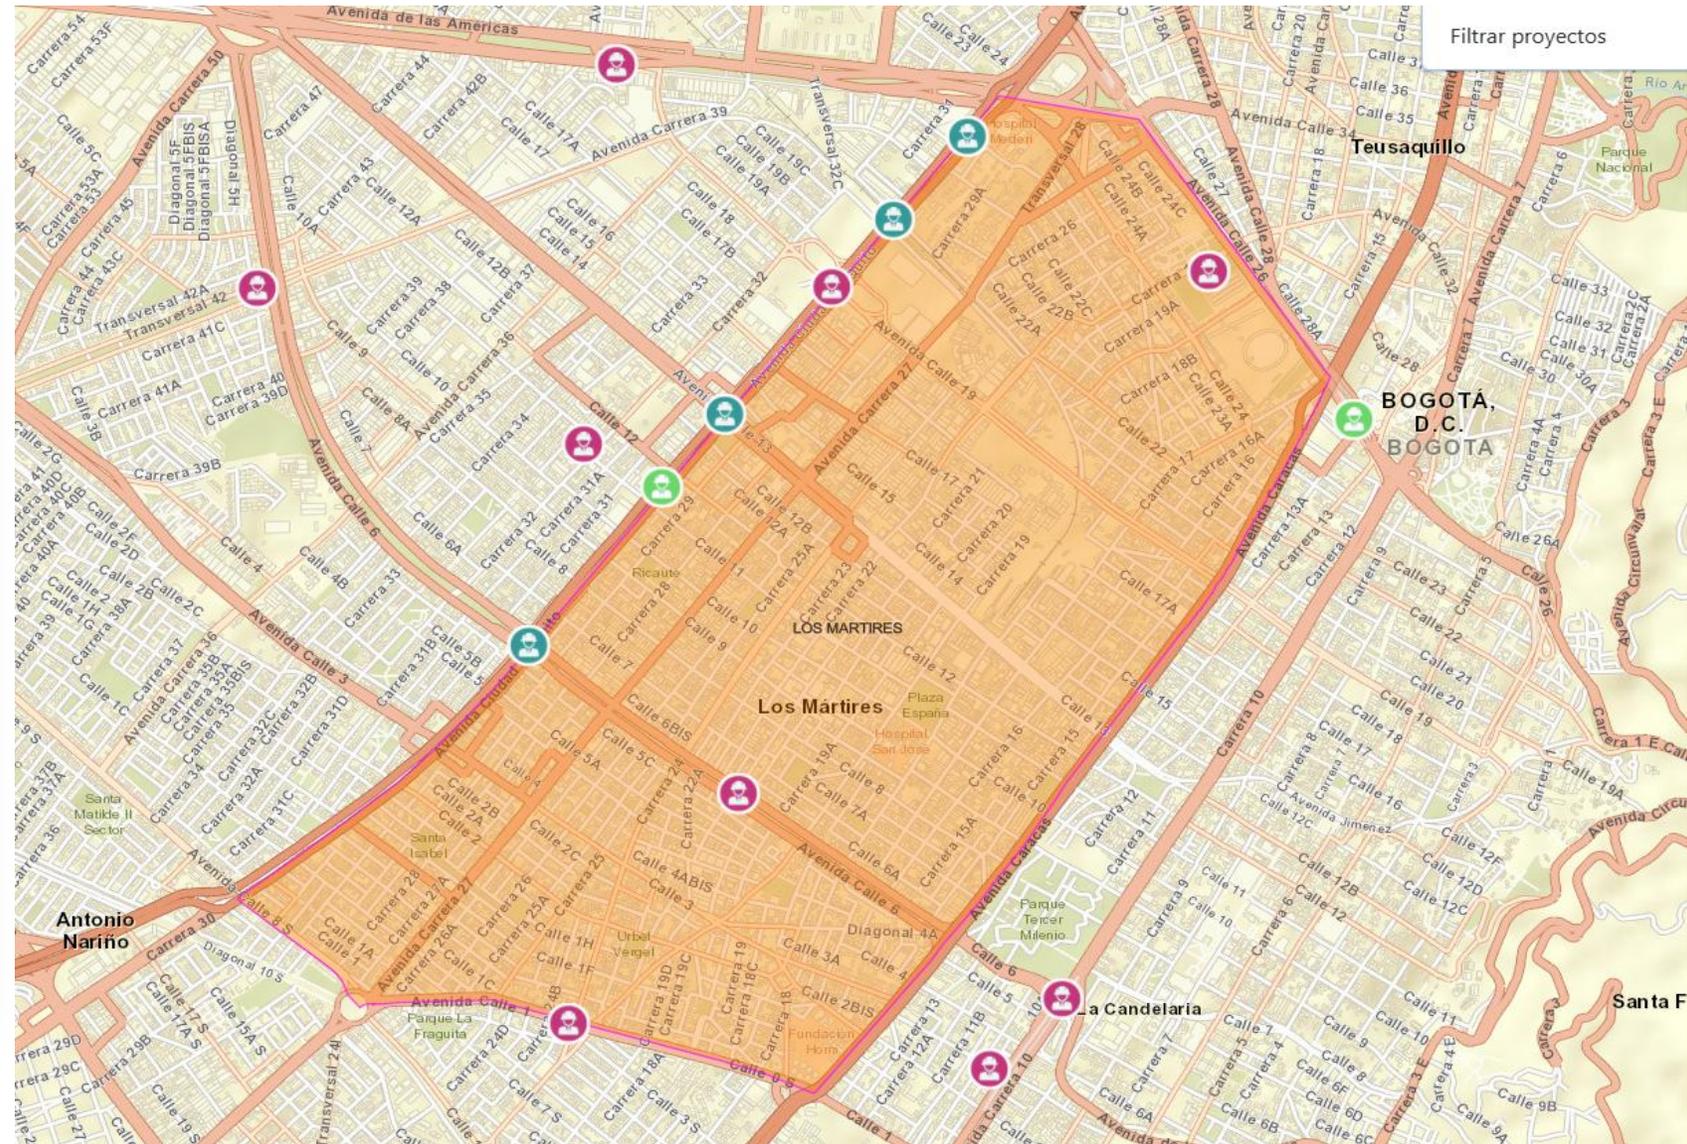

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Política Antisoborno



Política Antisoborno

 denuncia.soborno@idu.gov.co

El Instituto de Desarrollo Urbano estableció una estrategia que busca prevenir, detectar y enfrentar el soborno. Por medio de varios lineamientos institucionales se fortalece la cultura de transparencia entre todos los servidores públicos del IDU.

Para garantizar la debida ejecución de los recursos públicos que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, el IDU implementa la política antisoborno. A través de este abecé, usted conocerá en qué consiste esta estrategia y cómo puede tramitar una denuncia en caso de sospechar de una conducta indebida.

Diagnóstico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

idu
Instituto de
DESARROLLO URBANO




IDU




INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO



INVENTARIO ESTADO CICLORRUTAS

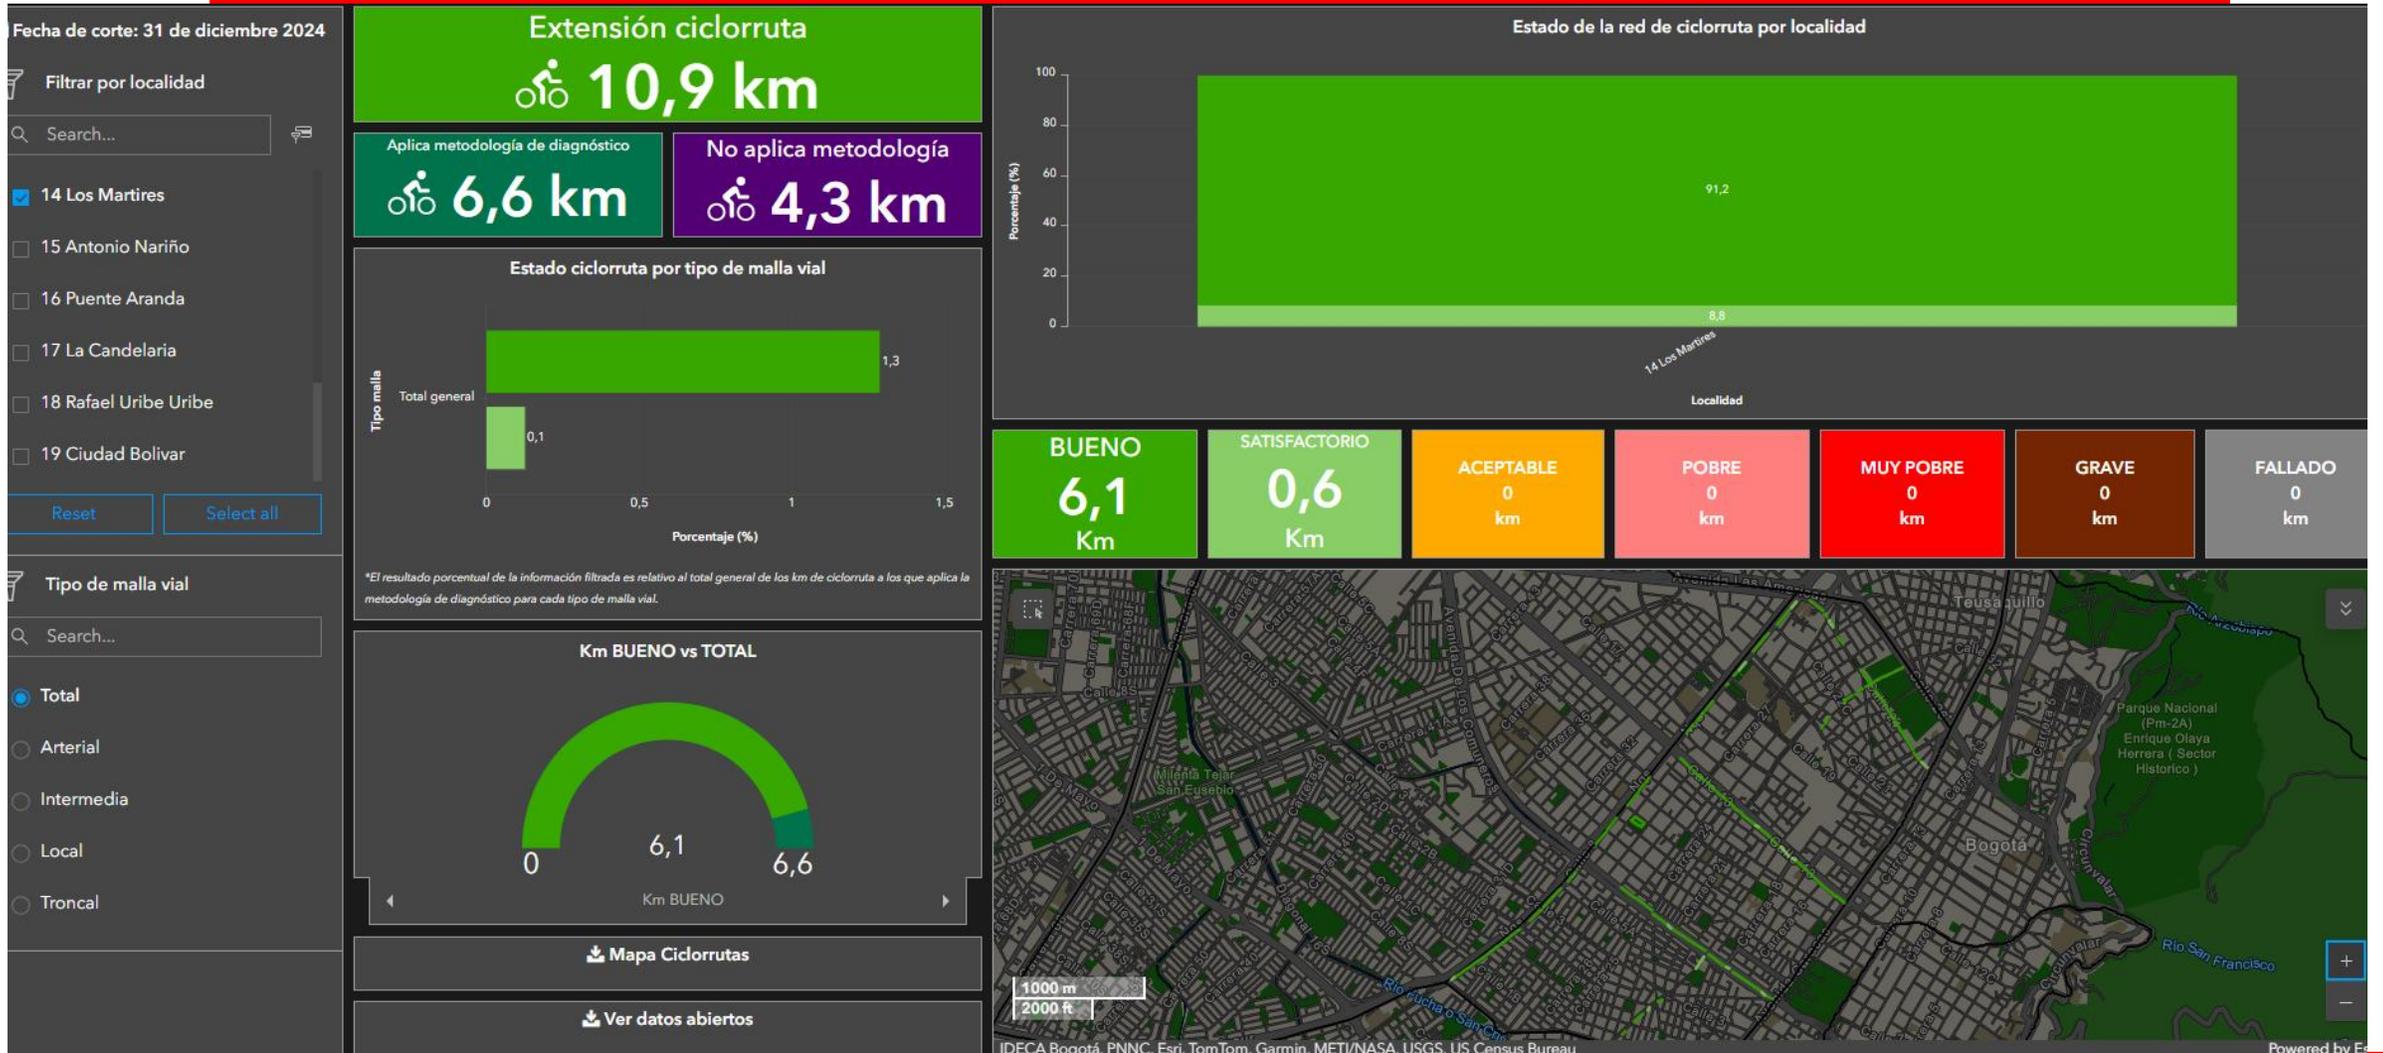


INVENTARIO DE ESTADO ESPACIO PÚBLICO- ANDENES

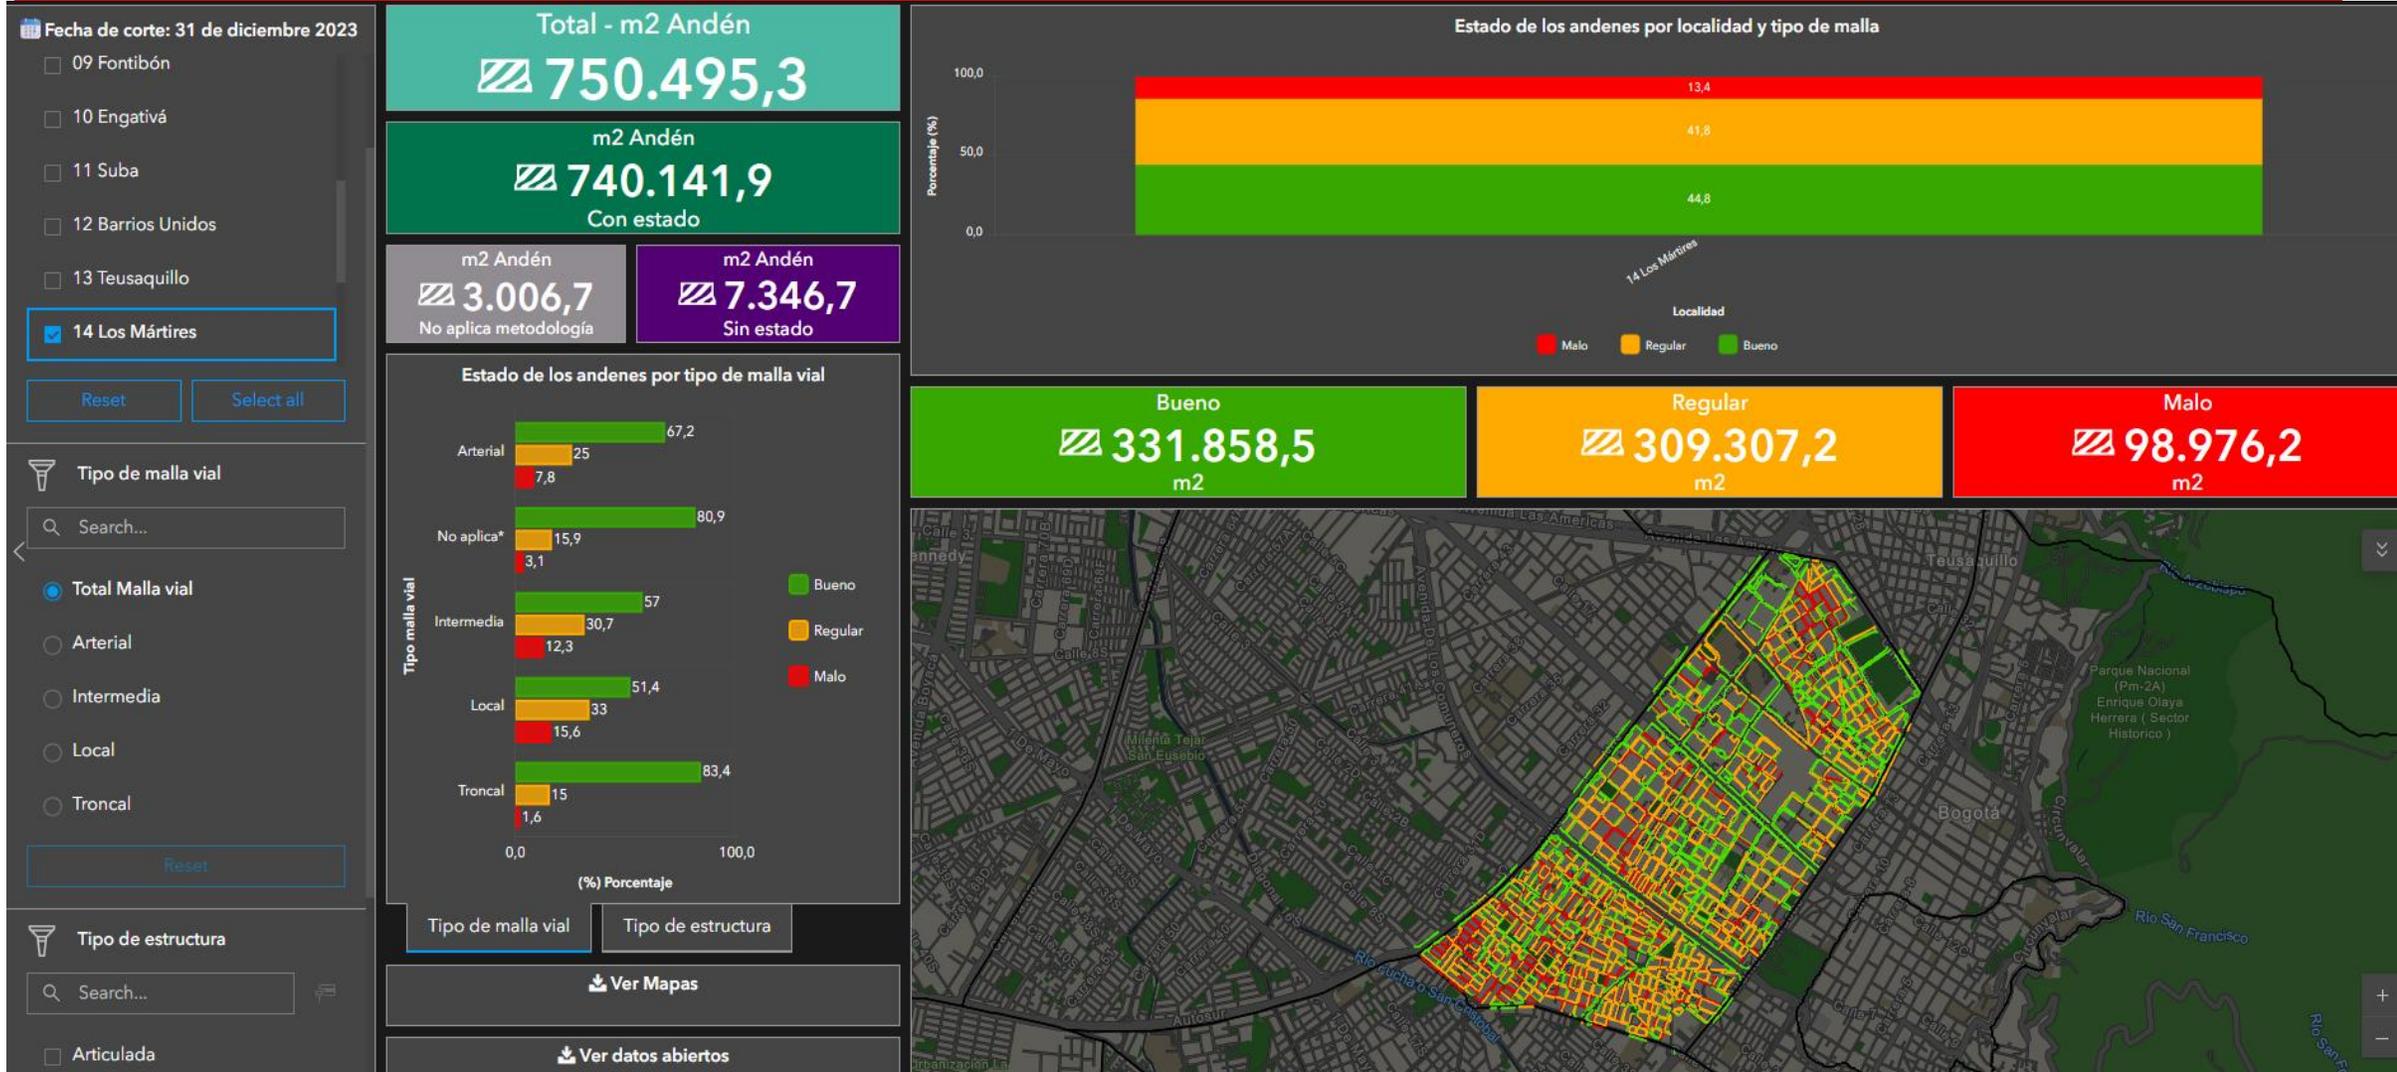


INVENTARIO DE MALLA VIAL TRONCAL

Estado de la malla vial troncal por localidad


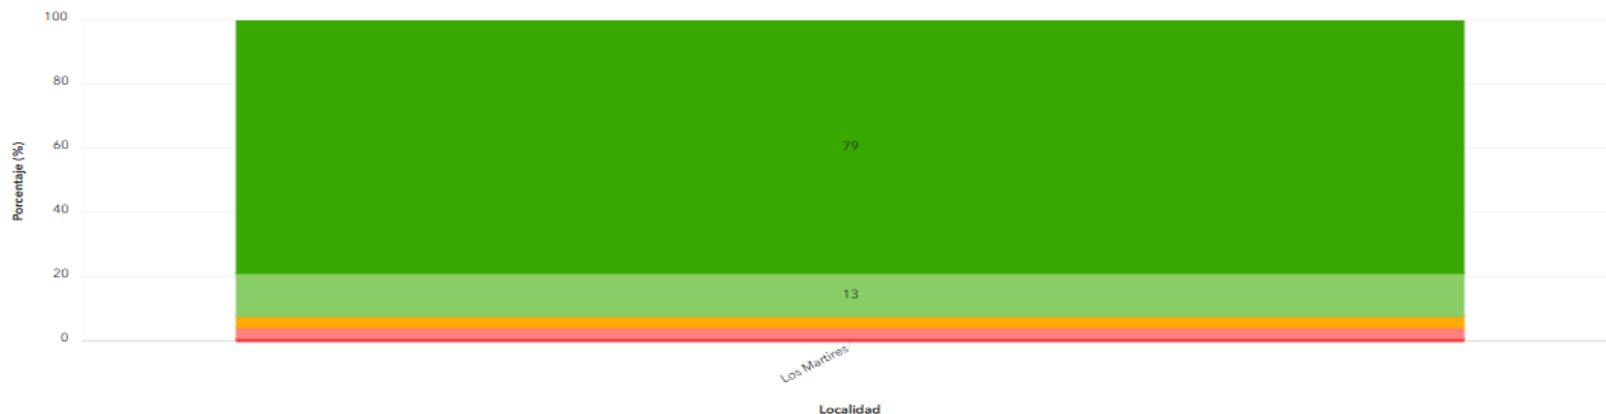


Estado malla vial troncal Bogotá

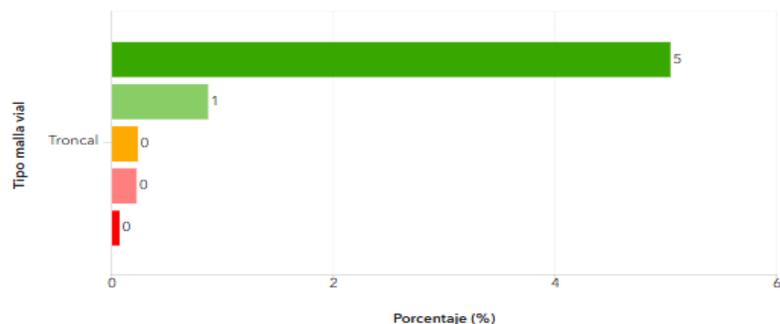


La gráfica muestra el porcentaje (%) del estado de la malla vial con respecto al total de la extensión relacionada con diagnóstico de la ciudad de Bogotá

KM-CARRIL BUENO vs TOTAL

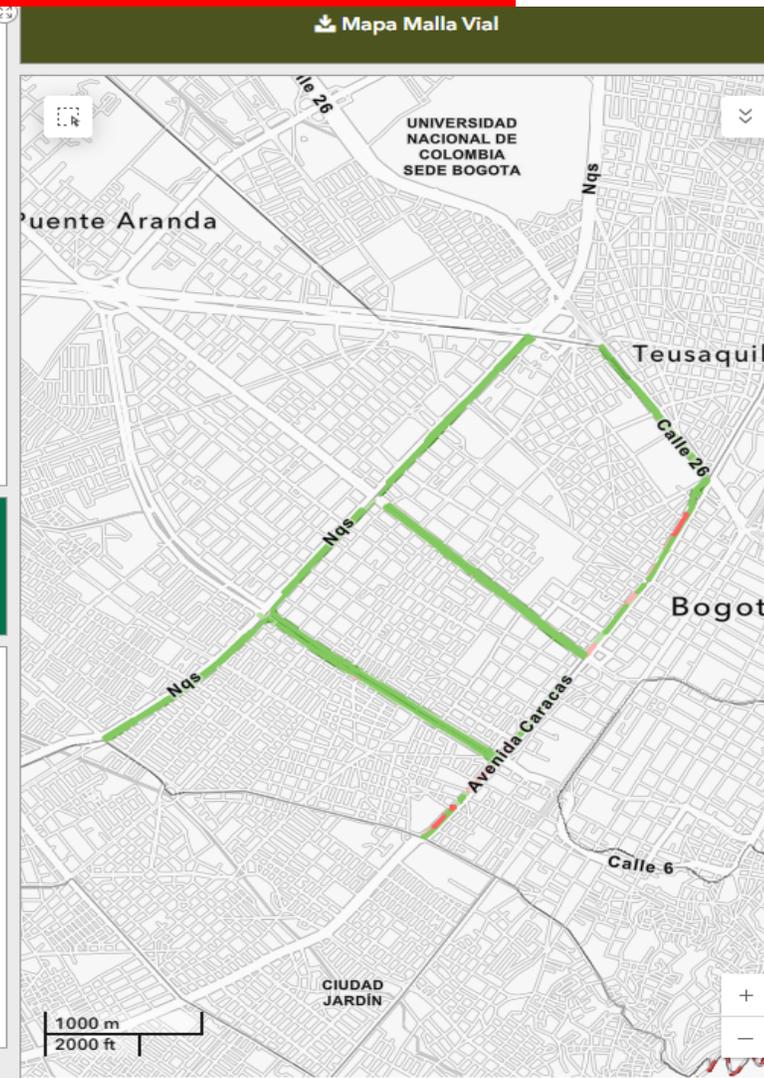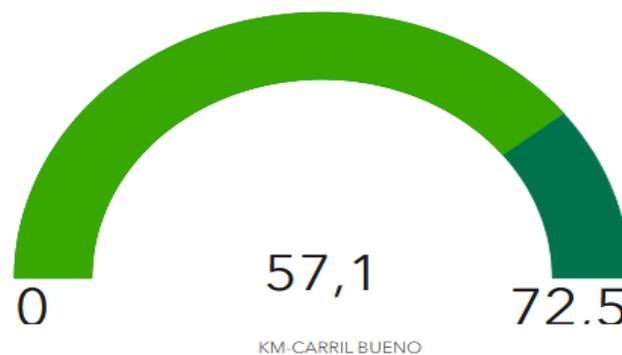


INVENTARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL

Estado de la malla vial arterial por localidad

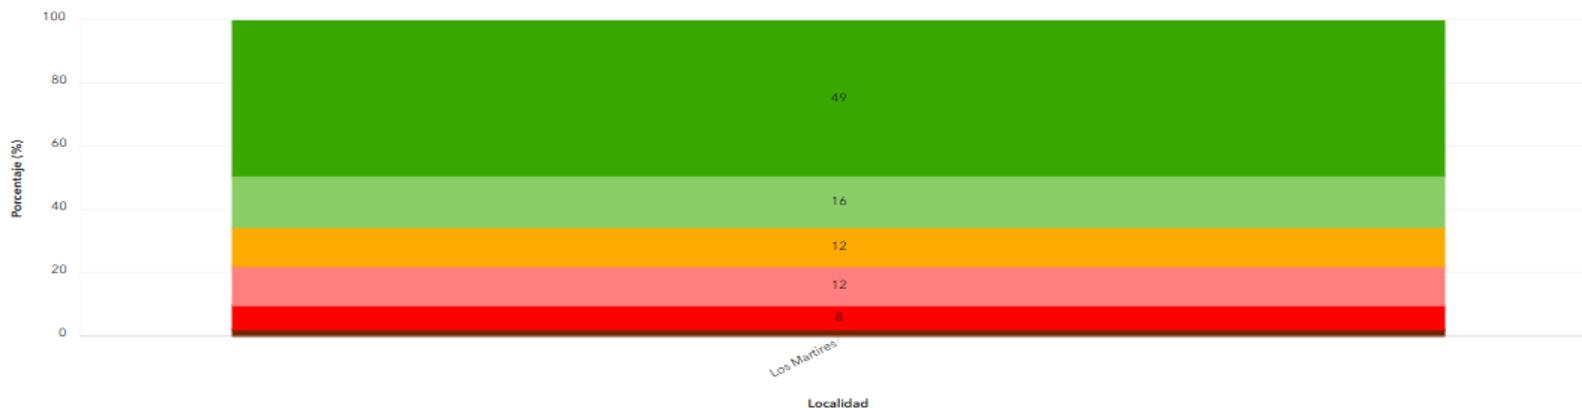


Estado malla vial arterial Bogotá

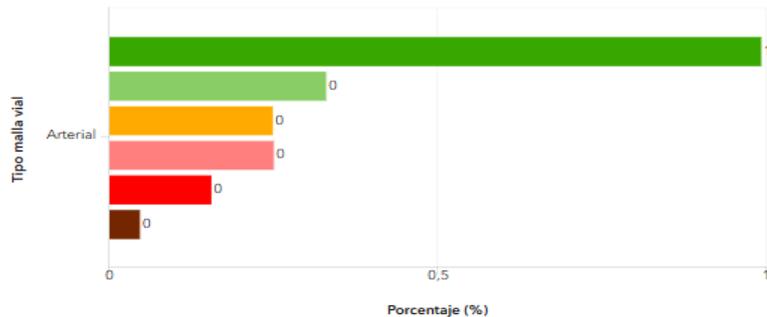


La gráfica muestra el porcentaje (%) del estado de la malla vial con respecto al total de la extensión relacionada con diagnóstico de la ciudad de Bogotá

KM-CARRIL BUENO vs TOTAL

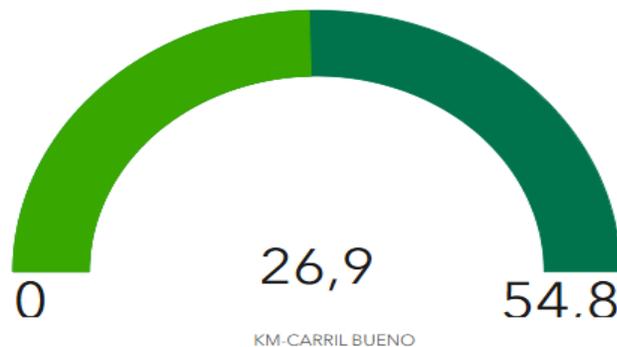

Mapa Malla Vial

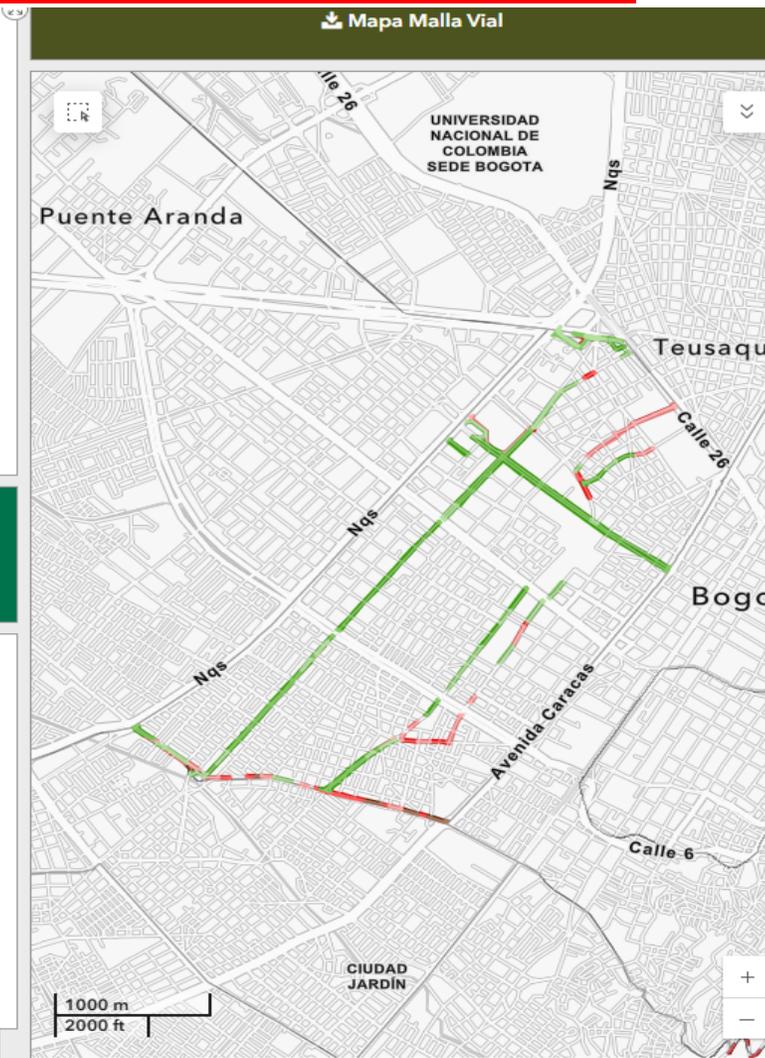



2

Proyecto



<https://www.instagram.com/reel/DH7TkmRMD8f/?igsh=MWI2ZXB6bXVzamM1NQ%3D%3D>

idu
Instituto de
DESARROLLO URBANO



INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO




Contrato: IDU-625-2023




Nombre del proyecto

Limpieza en los elementos segregadores y estructuras de las troncales del Sistema Transmilenio - 2023

Fecha de actualización: 31/12/2024

Avance programado: 100,0% 

Avance ejecutado: 100,0% 

Estado del contrato: TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION

Alcance del proyecto

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Limpieza elementos segregadores y estructuras	1441280.05 ml
Mantener m2 de Espacio público	39588.82 m2

Información contractual

Número de contrato: IDU-625-2023
Tipo: Convenio Interadministrativo
Contratista: AGUAS DE BOGOTA SA SP
Valor total: \$ 15.231.029.910,00
Fecha de inicio: 24/03/2023
Fecha de finalización: 02/01/2025
Empleos generados: 72

Número de contrato: NO APLICA
Tipo: Consultoría (Interventoría)
Contratista: No aplica
Valor total: \$ 0,00
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Empleos generados: 0

Contrato: IDU-1825-2021

Nombre del proyecto

Reforzamiento estructural puentes vehiculares Vigencia 2021 Grupo 1 - Construcción

Fecha de actualización: 09/06/2025

Avance programado: 58,52%

Avance ejecutado: 54,91%

Estado del contrato: EN EJECUCION

Alcance del proyecto

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES:

- AVENIDA VILLAVICENCIO POR AUTOPISTA SUR (CENTRAL)
- AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA CENTENARIO
- AVENIDA NQS POR AVENIDA COMUNEROS (AV. CALLE 6)

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Reforzar puentes vehiculares	3.0 Unidades

Información contractual

Número de contrato: IDU-1825-2021
Tipo: Contrato de Obra
Contratista: CONSORCIO REFORZAMIENTO PTCC 2022
Valor total: \$ 41.358.121.723,00
Fecha de inicio: 19/01/2022

Número de contrato: IDU-1824-2021
Tipo: Consultoría (Interventoría)
Contratista: CONSORCIO INTERPUENTES BOGOTA 2021
Valor total: \$ 7.901.999.080,00
Fecha de inicio: 19/01/2022



Contrato: IDU-1776-2021



Nombre del proyecto

Conservación puentes vehiculares Vigencia 2021

Fecha de actualización: 02/06/2025

Avance programado: 83,0%

Avance ejecutado: 88,0%

Estado del contrato: EN EJECUCION

Alcance del proyecto

Conservación puentes vehiculares Vigencia 2021

Metas físicas

Tipo

Cantidad

Mantener Puentes vehiculares

40.0 Unidades

Información contractual

Número de contrato: IDU-1776-2021
Tipo: Contrato de Obra
Contratista: CONSORCIO PROBOGOTA 22
Valor total: \$ 62.316.938.730,00
Fecha de inicio: 01/02/2022
Fecha de finalización: 31/03/2026
Empleos generados: 91

Número de contrato: IDU-1783-2021
Tipo: Consultoría (Interventoría)
Contratista: CONSORCIO VIAS AIRUG 2021
Valor total: \$ 10.539.243.985,00
Fecha de inicio: 01/02/2022
Fecha de finalización: 31/03/2026
Empleos generados: 31

Contrato: IDU-1848-2021

Nombre del proyecto

Ampliación estaciones TransMilenio Fase I y Fase II - Diseños y Construcción - Grupo 4

Fecha de actualización: 09/06/2025

Avance programado: 95,0%

Avance ejecutado: 96,89%

Estado del contrato: EN EJECUCION

Alcance del proyecto

ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Ampliar Estaciones Troncales existentes	8.0 Unidades
Construir Vagón Estaciones Troncales existentes	1.0 Unidades
Diseño	1.0 Unidades

Información contractual

Número de contrato: IDU-1848-2021
Tipo: Contrato de Obra
Contratista: COL PETROLEUM SERVICES S.A.S.
Valor total: \$ 49.395.539.674,00
Fecha de inicio: 27/01/2022
Fecha de finalización: 04/07/2025

Número de contrato: IDU-1853-2021
Tipo: Consultoría (Interventoría)
Contratista: CONSORCIO RUTA JAL
Valor total: \$ 4.138.107.894,00
Fecha de inicio: 27/01/2022
Fecha de finalización: 04/07/2025



https://webidu.idu.gov.co/visor_proyectos/

<https://experience.arcgis.com/experience/9eeacbcabe9149358a6fac80eda2d46b/page/MVUrbana>



Gracias

Síguenos en nuestras redes sociales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO

