



BOGOTÁ  
MI CIUDAD  
MI CASA

Instituto de Desarrollo Urbano

# Observatorio Localidad Teusaquillo

Rendición de cuentas nodo Movilidad

30 / 04 / 25



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DE  
DESARROLLO URBANO



# CONTENIDO

## 1 Presentación IDU

---


- Diagnóstico vial de la localidad de Teusaquillo
- Información general de los proyectos IDU en la localidad de Teusaquillo
- Etapa de construcción
- Etapa de E y D
- Etapa de conservación
- Preguntas e inquietudes



# Localización de proyectos IDU – Localidad de Teusaquillo

## Misión

El propósito del IDU (Instituto de Desarrollo Urbano), para el año 2025, es el de continuar mejorando la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, a través del desarrollo de infraestructura vial y de espacio público, con un enfoque en la movilidad segura, sostenible y eficiente. Se enfoca en la conservación de la infraestructura existente y en la ejecución de nuevos proyectos para cumplir con las metas del Plan Distrital de Desarrollo.

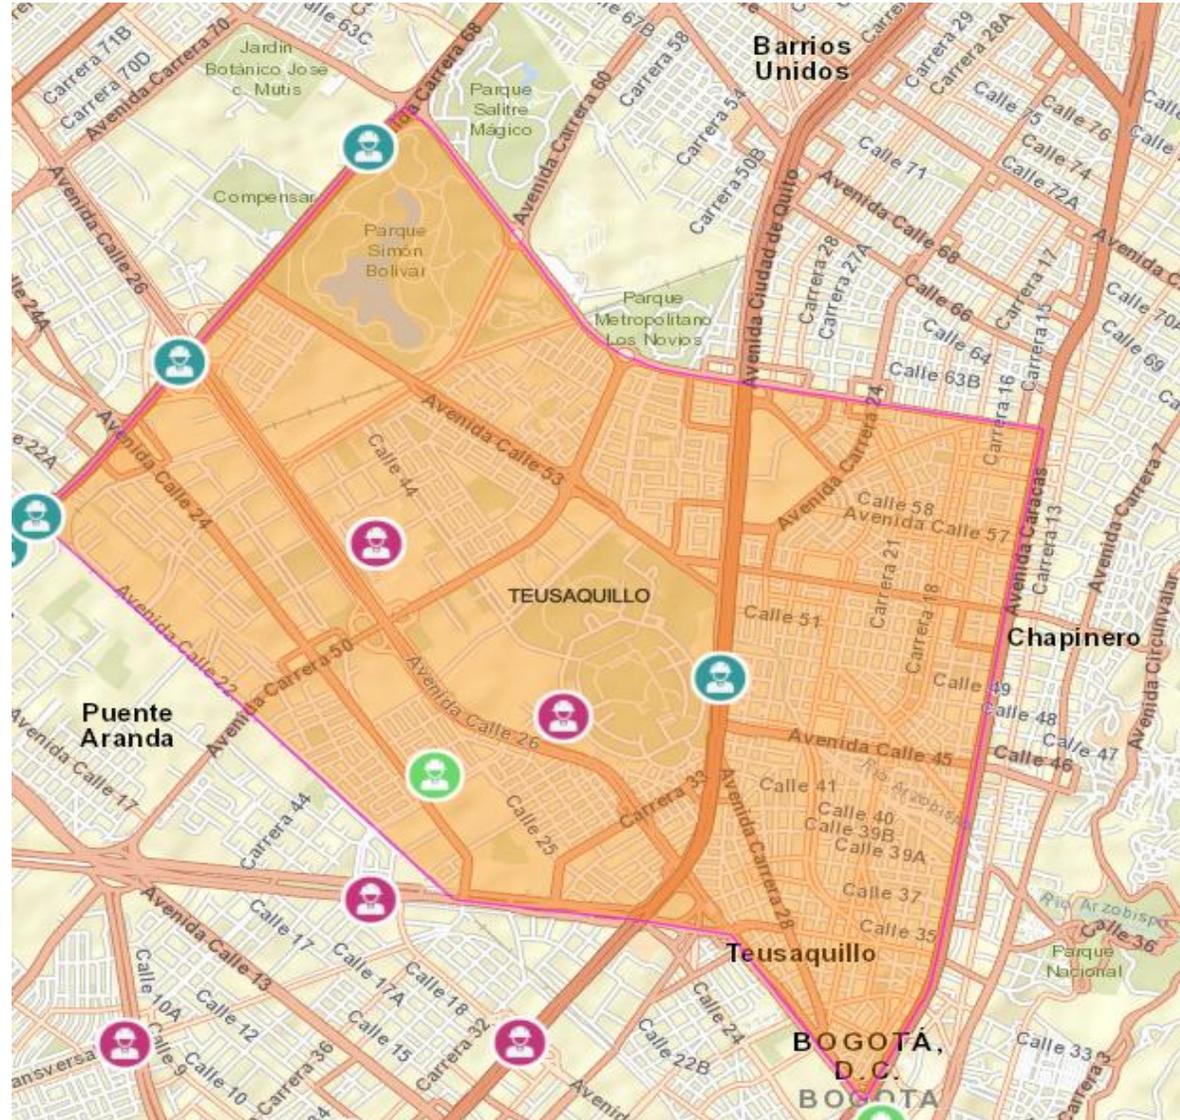

# ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

## Política Antisoborno



### Política Antisoborno

 [denuncia.soborno@idu.gov.co](mailto:denuncia.soborno@idu.gov.co)

El Instituto de Desarrollo Urbano estableció una estrategia que busca prevenir, detectar y enfrentar el soborno. Por medio de varios lineamientos institucionales se fortalece la cultura de transparencia entre todos los servidores públicos del IDU.

Para garantizar la debida ejecución de los recursos públicos que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, el IDU implementa la política antisoborno. A través de este abecé, usted conocerá en qué consiste esta estrategia y cómo puede tramitar una denuncia en caso de sospechar de una conducta indebida.

Diagnóstico

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**idu**  
Instituto de  
DESARROLLO URBANO



**IDU**



INSTITUTO DE  
DESARROLLO URBANO



## INVENTARIO ESTADO CICLORRUTAS

Estadísticas estado de la red de ciclorrutas de la ciudad de Bogotá D.C

Extensión ciclorruta

🚲 52,5 km


Aplica metodología de diagnóstico

🚲 37,0 km

No aplica metodología

🚲 15,5 km

Estado ciclorruta por tipo de malla vial




\*El resultado porcentual de la información filtrada es relativo al total general de los km de ciclorruta a los que aplica la metodología de diagnóstico para cada tipo de malla vial.

Km BUENO vs TOTAL



Estado de la red de ciclorruta por localidad

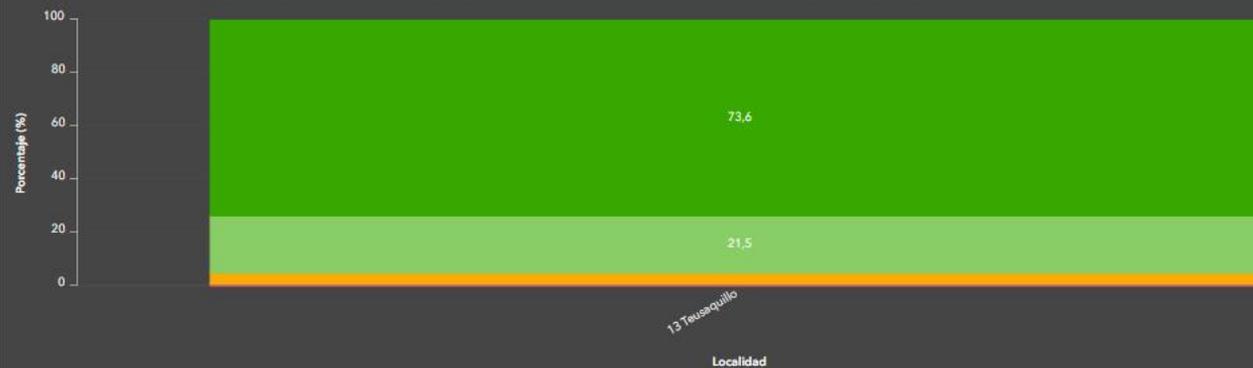

BUENO

27,2  
Km

SATISFACTORIO

8,0  
Km

ACEPTABLE

1,5  
Km

POBRE

0,4  
Km

MUY POBRE


0,0  
Km

GRAVE


0  
km

FALLADO


0  
km

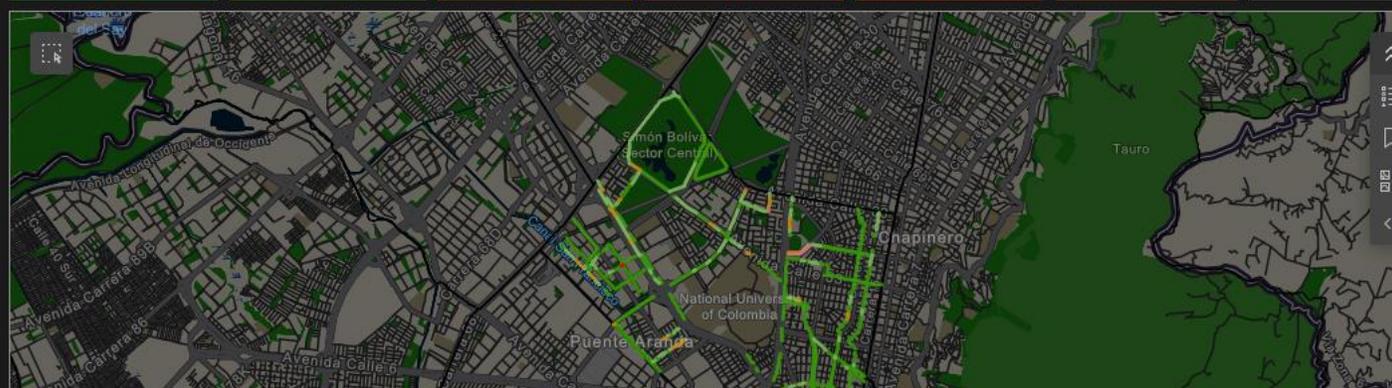


## INVENTARIO DE ESTADO ESPACIO PÚBLICO- ANDENES

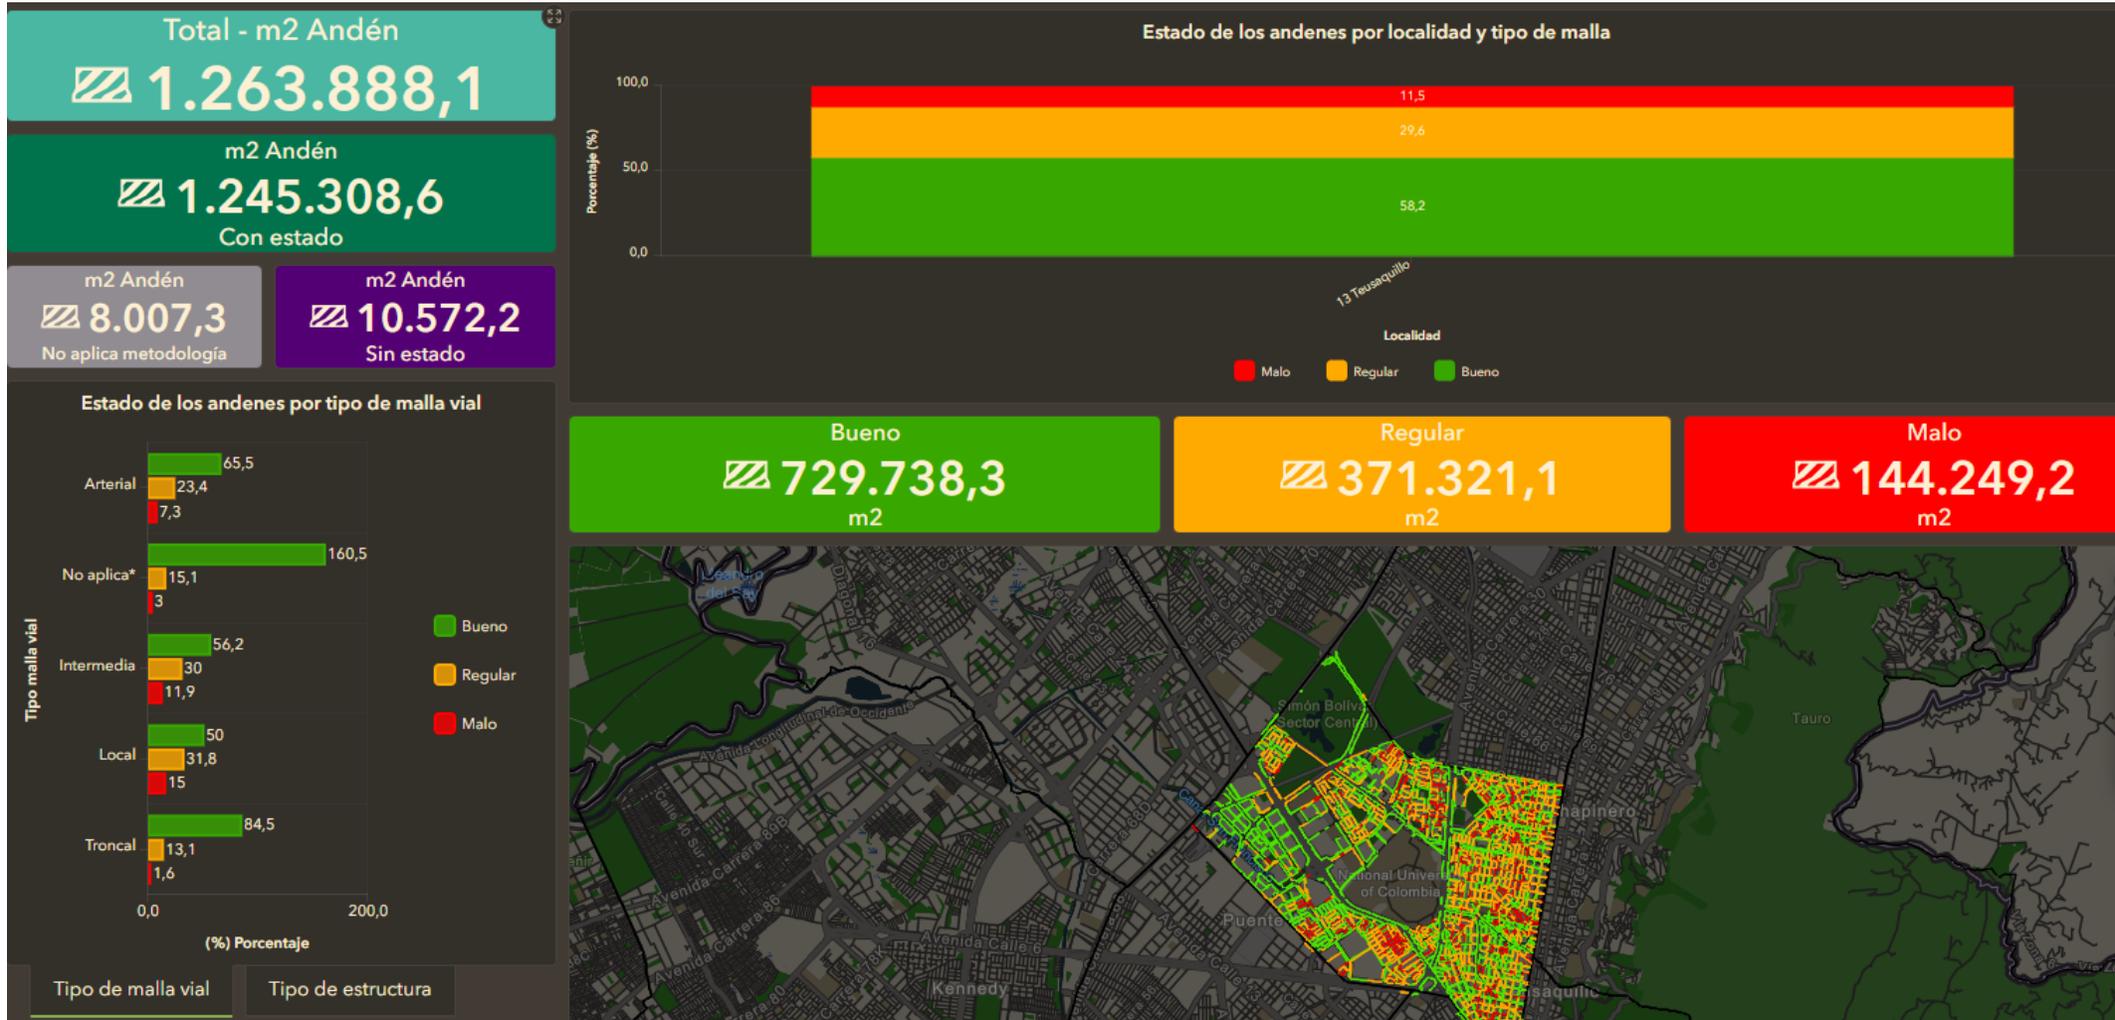

## INVENTARIO DE MALLA VIAL TRONCAL

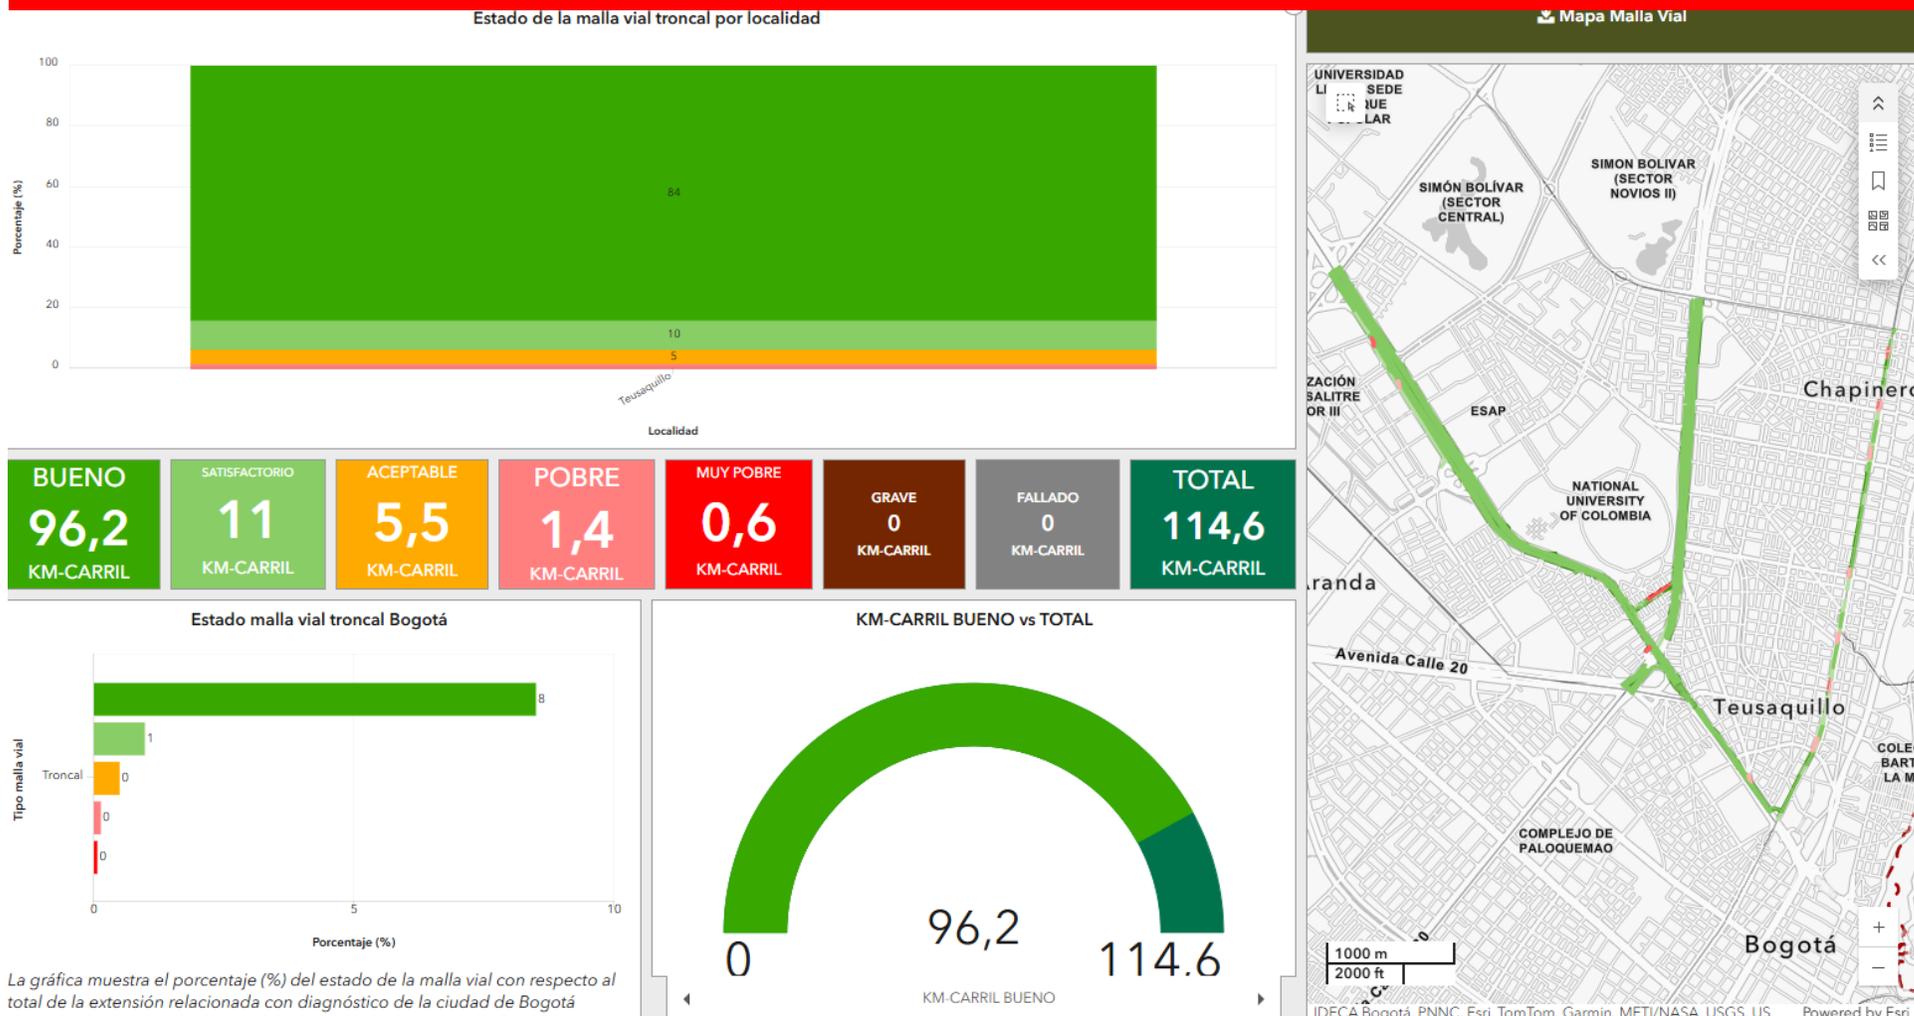

## INVENTARIO DE PIENTES

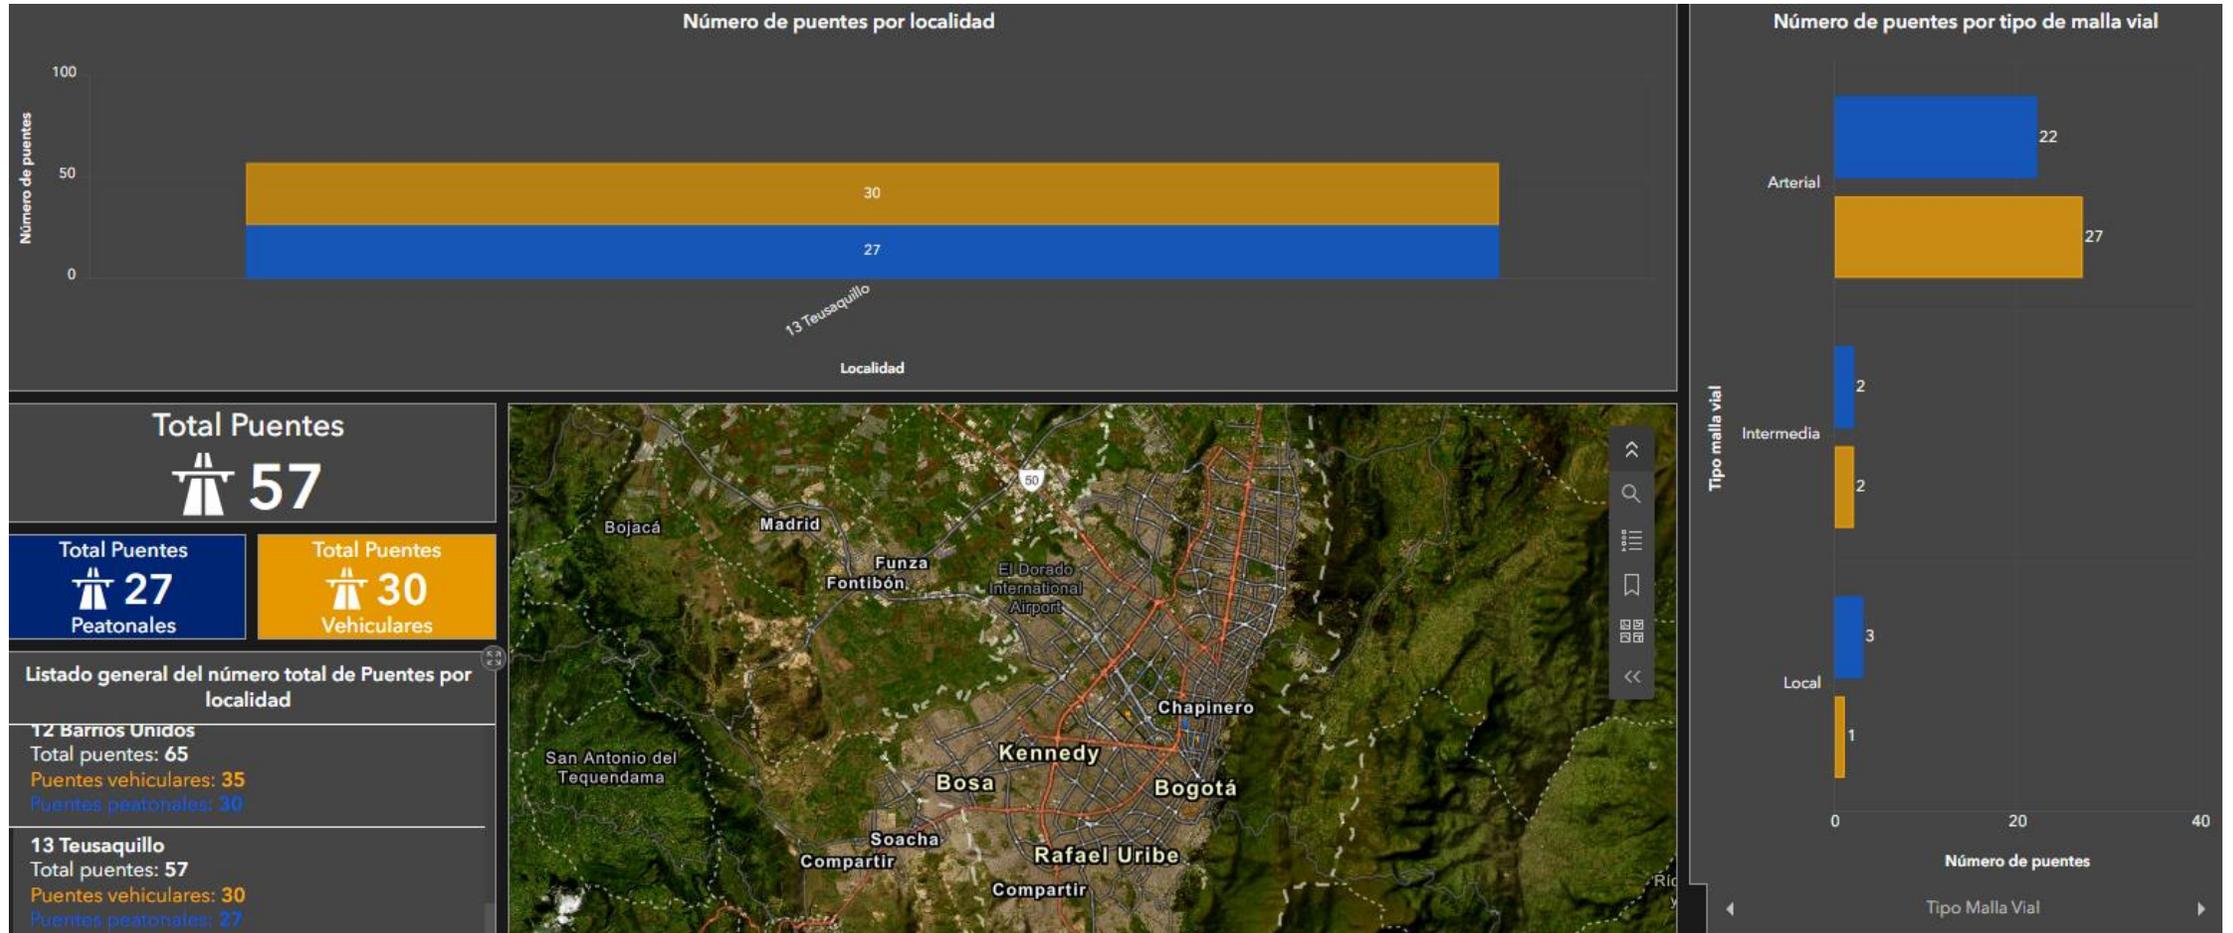

## INVENTARIO DE MALLA VIAL

Malla vial Bogotá

▲ 361,8  
Km-carril

Con estado

353,3  
Km-carril

Sin estado

8,6  
Km-carril


Malla vial Urbana

▲ 282,6  
Km-carril


Malla vial Rural

▲ 79,3  
Km-carril


% Km-carril total malla vial urbana

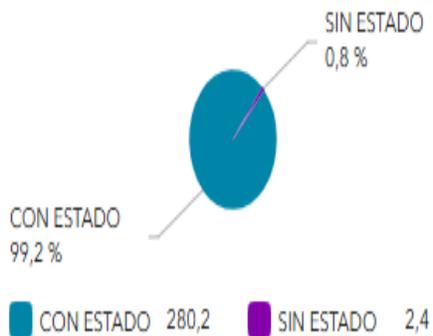

% Km-carril total malla vial rural

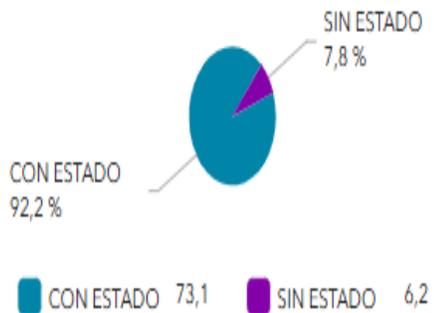

Extensión total por tipo de malla vial

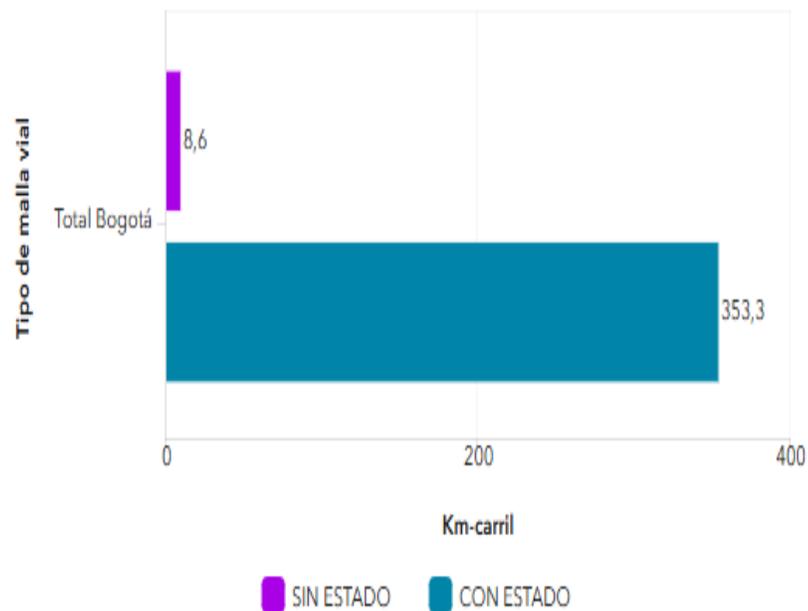

2

## Contratos

<https://www.instagram.com/reel/DH7TkmRMD8f/?igsh=MW12ZXB6bXVzamM1NQ%3D%3D>


# Proyecto estudios y diseños


Contrato: IDU-1787-2023

Nombre del proyecto

## Aceras y Ciclorruta Kr 40 entre Av Américas y Calle 26 - Ajustes EYD y Construcción

Fecha de actualización: 28/07/2025

Avance programado: 6,71% 

Avance ejecutado: 6,57% 

Estado del contrato: EN EJECUCION

### Alcance del proyecto

CICLORRUTA Y EL ESPACIO PÚBLICO PARA LA CARRERA 40 (AV. PEDRO LEÓN TRABUCHY), ENTRE LA AV. AMÉRICAS Y LA CALLE 26 Y LA CONEXIÓN CON LA CICLORRUTA EXISTENTE EN EL COSTADO NORTE DE LA AV CALLE 26

### Metas físicas

Tipo	Cantidad
Construir Km de Ciclorruta	2.98 Km
Espacio Público	18274.0 m2

### Información contractual

<b>Número de contrato:</b>	IDU-1787-2023	<b>Número de contrato:</b>	IDU-1785-2023
<b>Tipo:</b>	Contrato de Obra	<b>Tipo:</b>	Consultoría (Interventoría)
<b>Contratista:</b>	CONSORCIO CCA VIAS	<b>Contratista:</b>	EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS
<b>Valor total:</b>	\$ 26.500.000.000,00	<b>Valor total:</b>	\$ 4.281.864.763,00
<b>Fecha de inicio:</b>	27/02/2024	<b>Fecha de inicio:</b>	27/02/2024
<b>Fecha de finalización:</b>	17/09/2026	<b>Fecha de finalización:</b>	16/09/2026

# Proyecto Diseños y construcción

Contrato: IDU-1848-2021

## Ampliación estaciones TransMilenio Fase I y Fase II - Diseños y Construcción - Grupo 4

Fecha de actualización: 30/06/2025

Avance programado: 99,92% 

Avance ejecutado: 98,91% 

Estado del contrato: SUSPENDIDO

### Alcance del proyecto

ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4

### Metas físicas

Tipo	Cantidad
Ampliar Estaciones Troncales existentes	8.0 Unidades
Construir Vagón Estaciones Troncales existentes	1.0 Unidades
Diseño	1.0 Unidades

### Información contractual

**Número de contrato:** IDU-1848-2021  
**Tipo:** Contrato de Obra  
**Contratista:** COL PETROLEUM SERVICES S.A.S.  
**Valor total:** \$ 50.030.492.721,00  
**Fecha de inicio:** 27/01/2022  
**Fecha de finalización:** 05/08/2025  
**Empleos generados:** 116

**Número de contrato:** IDU-1853-2021  
**Tipo:** Consultoría (Interventoría)  
**Contratista:** CONSORCIO RUTA JAL  
**Valor total:** \$ 4.138.107.894,00  
**Fecha de inicio:** 27/01/2022  
**Fecha de finalización:** 05/08/2025  
**Empleos generados:** 19

# Proyecto conservación

Contrato: IDU-1719-2021

Nombre del proyecto

## Conservación de la Malla Vial Arterial Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 2

Fecha de actualización: 16/07/2024

Avance programado: 100,0% 

Avance ejecutado: 100,0% 

Estado del contrato: TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION

Alcance del proyecto

Conservación de la Malla Vial Arterial Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 2

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Mantener Km-Carril de Troncal	193.75 Km_Carril

Información contractual

**Número de contrato:** IDU-1719-2021  
**Tipo:** Contrato de Obra  
**Contratista:** CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC  
**Valor total:** \$ 72.672.315.735,00  
**Fecha de inicio:** 17/12/2021  
**Fecha de finalización:** 17/07/2024  
**Empleos generados:** 27

**Número de contrato:** IDU-1767-2021  
**Tipo:** Consultoría (Interventoría)  
**Contratista:** CONSORCIO INTERVIAS BGT  
**Valor total:** \$ 6.799.949.427,00  
**Fecha de inicio:** 17/12/2021  
**Fecha de finalización:** 16/07/2024  
**Empleos generados:** 15

# Proyecto de conservación

Contrato: IDU-625-2023

Nombre del proyecto

Limpieza en los elementos segregadores y estructuras de las troncales del Sistema Transmilenio - 2023

Fecha de actualización: 31/12/2024

Avance programado: 100,0% 

Avance ejecutado: 100,0% 

Estado del contrato: TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION

Alcance del proyecto

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Limpieza elementos segregadores y estructuras	1441280.05 ml
Mantener m2 de Espacio público	39588.82 m2

Información contractual

**Número de contrato:** IDU-625-2023  
**Tipo:** Convenio Interadministrativo  
**Contratista:** AGUAS DE BOGOTA SA SP  
**Valor total:** \$ 15.231.029.910,00  
**Fecha de inicio:** 24/03/2023  
**Fecha de finalización:** 02/01/2025

**Número de contrato:** NO APLICA  
**Tipo:** Consultoría (Interventoría)  
**Contratista:** No aplica  
**Valor total:** \$ 0,00  
**Fecha de inicio:**  
**Fecha de finalización:**

# Proyecto de Construcción

## Contrato: IDU-350-2020

Nombre del proyecto

Troncal Avenida 68 Grupo 6 - Cll. 46 a Av.  
Cll. 66 - Construcción

Fecha de actualización: 28/07/2025

Avance programado: 44,75% 

Avance ejecutado: 41,7% 

Estado del contrato: EN EJECUCION

### Alcance del proyecto

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 46 HASTA LA AVENIDA CALLE 66 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C

## Contrato: IDU-350-2020

### Información contractual

**Número de contrato:** IDU-350-2020  
**Tipo:** Contrato de Obra  
**Contratista:** CONSORCIO LHS  
**Valor total:** \$ 216.363.454.208,00  
**Fecha de inicio:** 12/06/2020  
**Fecha de finalización:** 11/06/2031  
**Empleos generados:** 417

**Número de contrato:** IDU-604-2020  
**Tipo:** Consultoría (Interventoría)  
**Contratista:** AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A  
**Valor total:** \$ 29.225.360.409,00  
**Fecha de inicio:** 12/06/2020  
**Fecha de finalización:** 11/06/2031  
**Empleos generados:** 49

# Proyecto de Construcción

Contrato: IDU-349-2020

Nombre del proyecto

Troncal Avenida 68 Grupo 5 - Av. Esperanza  
a Cl. 46 - Construcción

Fecha de actualización: 28/07/2025

Avance programado: 94,15%

Avance ejecutado: 90,95%

Estado del contrato: EN EJECUCION

Alcance del proyecto

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) HASTA LA CALLE 46 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C

Información contractual

**Número de contrato:** IDU-349-2020  
**Tipo:** Contrato de Obra  
**Contratista:** CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.  
**Valor total:** \$ 224.004.424.873,00  
**Fecha de inicio:** 18/06/2020  
**Fecha de finalización:** 17/09/2029  
**Empleos generados:** 94

**Número de contrato:** IDU-603-2020  
**Tipo:** Consultoría (Interventoría)  
**Contratista:** AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.  
**Valor total:** \$ 22.719.772.378,00  
**Fecha de inicio:** 18/06/2020  
**Fecha de finalización:** 17/09/2029  
**Empleos generados:** 14



# Gracias

Síguenos en nuestras redes sociales



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DE  
DESARROLLO URBANO

