



TransMiCable

Un sueño de volar
hecho realidad.

Gestión social y articulación
interinstitucional



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
**MEJOR
PARA TODOS**

TRANSMILENIO S.A.
CTO
381 de 2016

Estructuración Técnica,
Legal y Financiera

\$ 789,835,000

TRANSMILENIO S.A.
Licitación
operación

Proceso TMSA-LP-04-2018
-Adjudicado el 17/05/2018-Originó el
CTO 291-2018 firmado el 7/06/2018

\$91.510.511.779

TRANSMILENIO S.A.
CTO
interventoría
integral

En estructuración


Todos los contratos tienen componente de gestión social y cultura ciudadana



TRANSMICABLE




BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

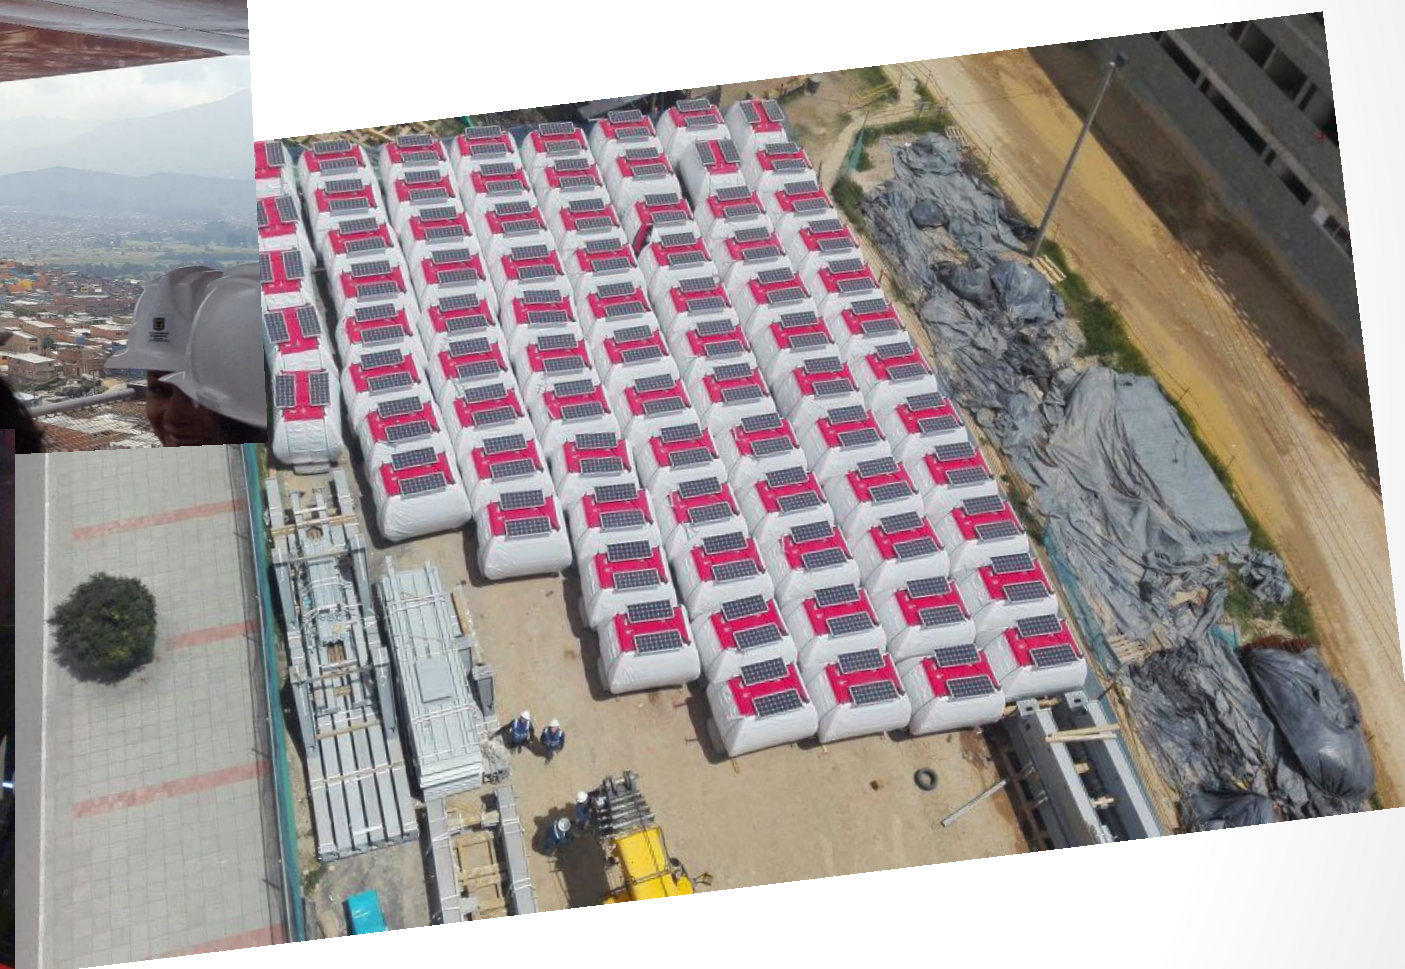

Estructuración Técnica, Legal y
Financiera de la Operación

Valor estimado de **\$91.510.511.779**

Duración = 5 años y 6 meses

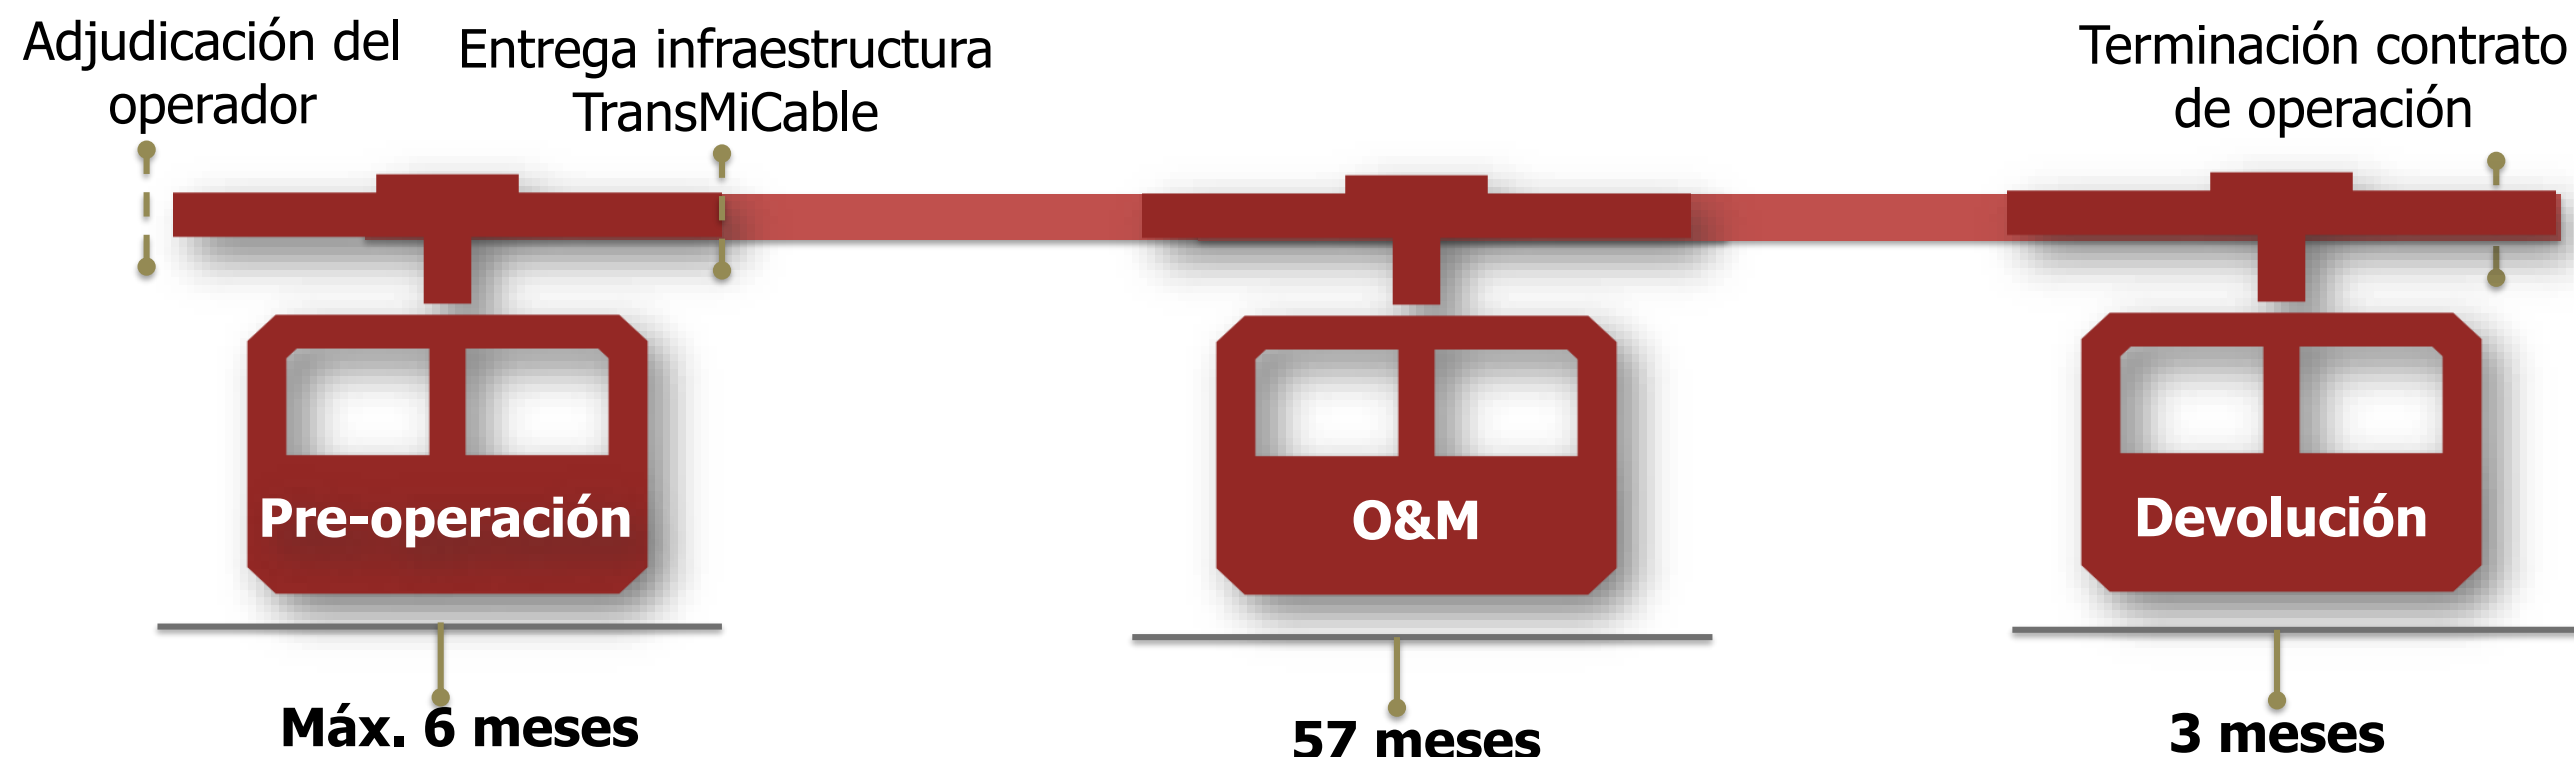

- Gestión social pre-operativa
- Habilitación y permiso de operación
- Asistencia a pruebas y capacitaciones
- Contratación equipo de trabajo

- Gestión social en operación
- Operación de TransMiCable
- Mantenimiento, aseo y vigilancia de toda la infraestructura (estaciones, pilonas y cabinas)
- Mantenimiento componente electromecánico

- Devolución de la infraestructura
- Acompañamiento en la entrega y empalme nuevo operador

☒ **Estructuración, operación y selección del operador (cumplido)**

- ☒ Estructuración técnica, legal y financiera
- ☒ Proceso licitatorio para la operación de TransMiCable (adjudicado)

Perfeccionamiento del contrato (en ejecución)

- ☒ Firma del contrato
- ☒ Presentación pólizas exigidas
 - Aprobación de pólizas (en revisión)
 - Firma acta de inicio (una vez se aprueben las pólizas)

Etapas preoperativa

Recibo definitivo de la infraestructura (entrega de obra por el IDU hasta el 24 de septiembre 2018)

- Recibo componente electromecánico
- Recibo de englobe de predios y cometidas servicios públicos definitivos
- Recibo infraestructura de obra

Despliegue elementos de operación y señalética (una vez se reciba infraestructura)


Diseño e instalación componente SIRCI (en ejecución)

Habilitación y permiso de operación TransMiCable

- ☒ Entrega preliminar de documentos para verificación al Ministerio de Transporte
 - Entrega definitiva de documentos a MinTransporte (una vez se firme acta de inicio)

Proceso de explotación comercial de los espacios remanentes dentro de las estaciones de TransMiCable

- ☒ Selección espacios para explotación comercial
 - Avalúo de áreas de explotación (en ejecución)
 - Factibilidad comercial - Selección de agentes comerciales (en ejecución)
 - Proceso de comercialización (adjudicación de agentes comerciales posterior a avalúo)
 - Arrendamiento y administración de áreas comerciales

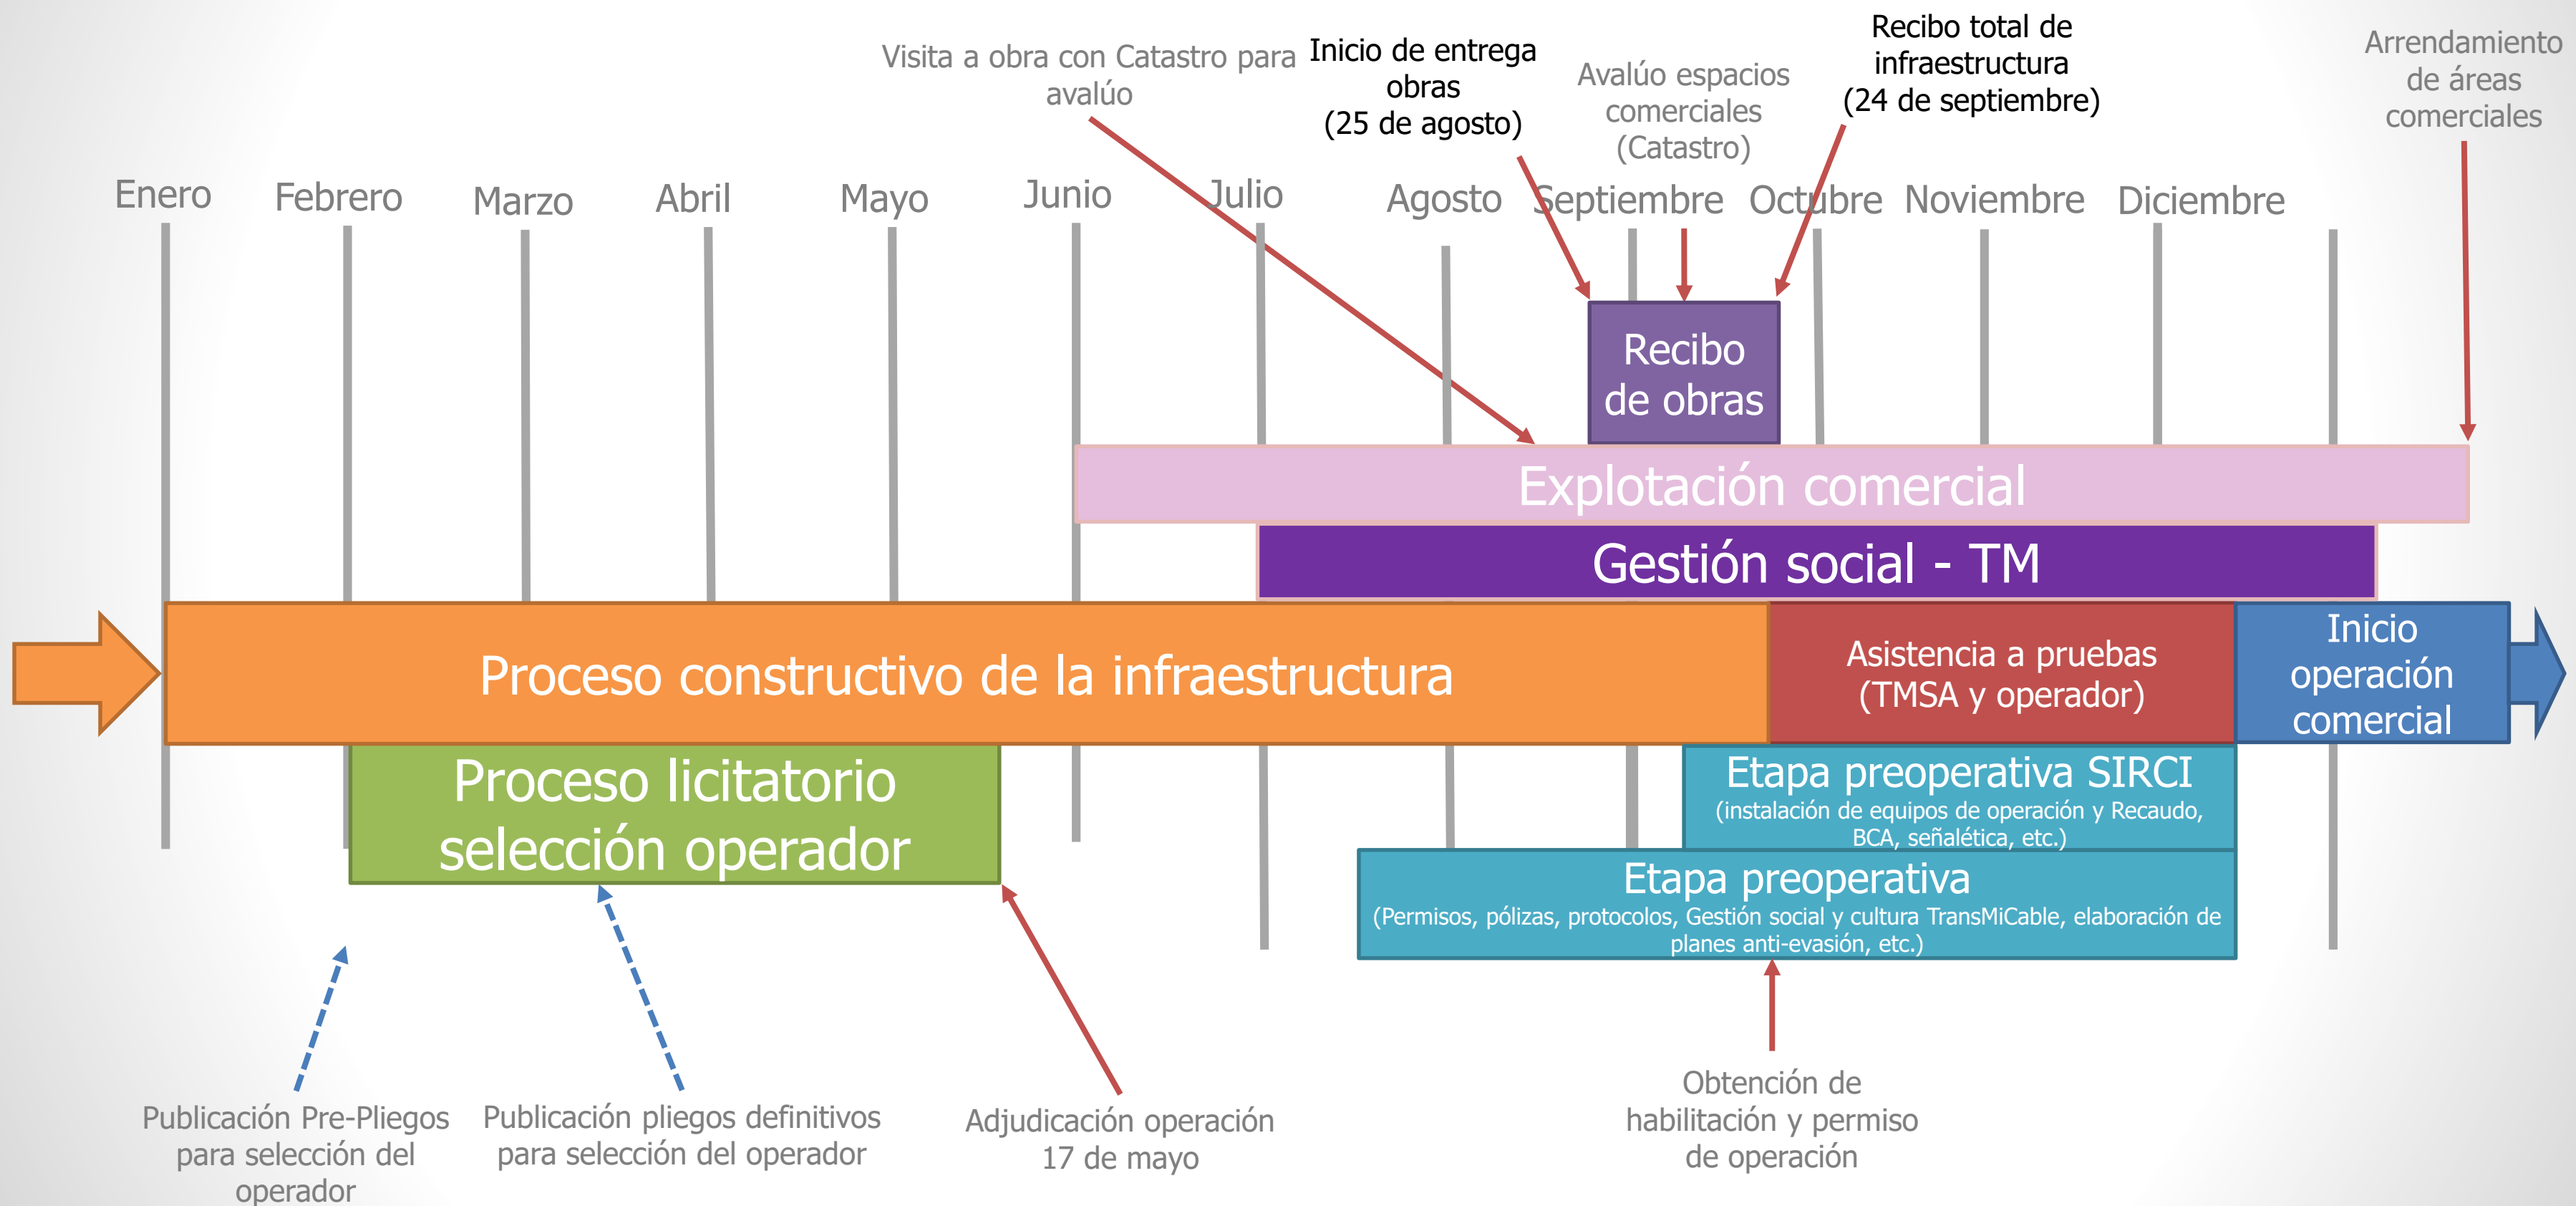

Objetivo: vincular el transporte público a un modelo de desarrollo urbano, social y económico que permita generar **apropiación social, sentido de pertenencia y orgullo** por el Sistema.

Públicos objetivo

Comunidad Educativa

Líderes Comunitarios

Primera Infancia
Personas con discapacidad

Colectivos Culturales



Portafolio de estímulos para la cultura

- 3 convocatorias

Hackatones y talleres de innovación

- Emprendimientos turísticos
- Colectivos Culturales
- Colegios
- Líderes comunitarios

Estrategia de comunicación 360°

- Web APP
- Branding and Marking
- Medios
- BTL


Medición e impacto

- Línea base
- Observatorio de Culturas



Pasillo motorizado

- Ingreso de personas con discapacidad
- Ingreso de bicicletas

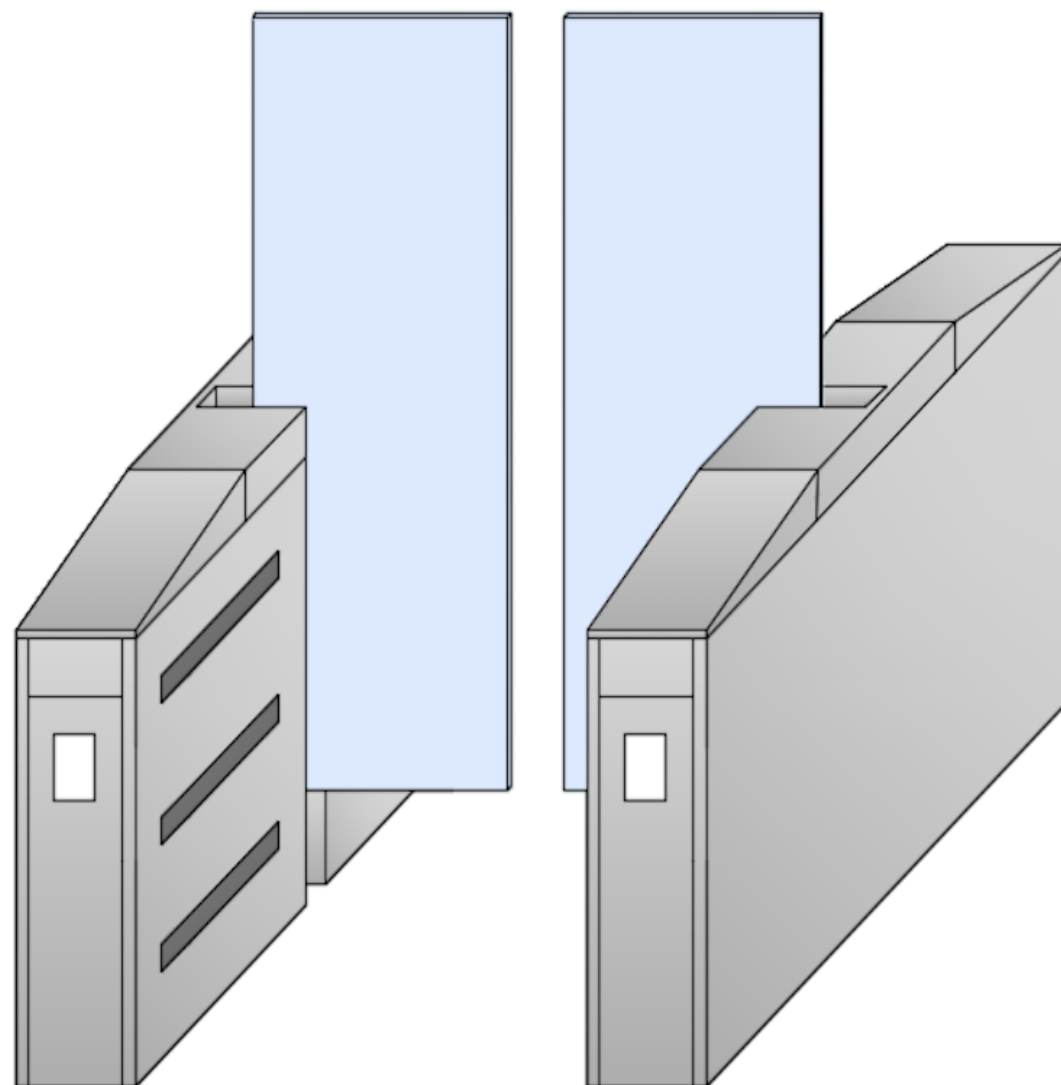

Barrera Piso - Techo

- Ingreso de peatones





Muchas Gracias
