SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE VIGENCIAS FUTURAS No 14 DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022

CONTRATO DE OBRA SDM 2021 – 2021

INTRODUCCIÓN

Con el fin de atender de manera integral las necesidades en materia de señalización vial en la ciudad de Bogotá, tanto en espacio público como privado de uso público tales como (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la SDM, entre otros), se lleva a cabo el Contrato de Obra No. 2021 – 2021 que tiene por objeto ***"Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.V.". Lote 3 – zona OCCIDENTE - NORTE***. Dicho contrato se realiza en los diferentes sitios que se encuentran a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), los cuales están definidos en las áreas de influencia de los diseños integrales aprobados y que requieran de señalización para la regulación, prevención e información a los usuarios del sistema de movilidad.

El presente documento corresponde al informe mensual No. 14 del contrato 2021 de 2021, con objeto mencionado con anterioridad, el cual se encuentra comprendido entre el 01 al 30 de OCTUBRE del 2022.

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de OCTUBRE del año 2022 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de obra SDM-2021-2021.

Objetivos Específicos Del Informe

• Relacionar el avance del Contrato de obra SDM-2021-2021 con corte al 30 de octubre de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto.

• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte al 30 de octubre de 2022 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2021

A continuación, se muestra la localización y los principales datos del contrato y las modificaciones y ajustes realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de octubre de 2022.

Figura 1. Localización y localidades Lote No. 3 – Zona Occidente – Norte

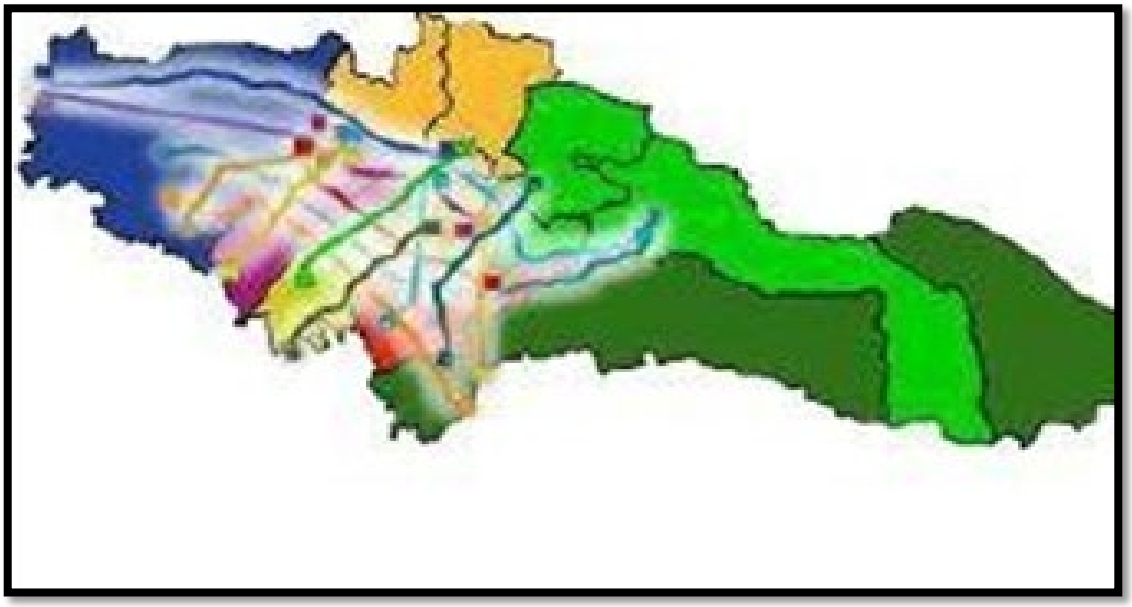

ZONA		LOCALIDADES
1	Norte	Usaquén, Suba.
2	Oriente Norte	Chapinero, Santa Fé, La Candelaria.
3	Occidente Norte	Engativá, Teusaquillo, Barrios Unidos.
4	Centro Norte	Fontibón, Los Mártires, Puente Aranda.
5	Centro Sur	Antonio Nariño, Kennedy, Tunjuelito.
6	Sur Oriente	Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal.
7	Sur Occidente	Bosa, Ciudad Bolívar, Sumapaz.

Fuente: Elaboración propia

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla 1. Datos del Contrato

<table>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>SDM 2021 – 2021</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>“Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.”. Lote 3 – zona OCCIDENTE - NORTE</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">CDPs</th></tr>
<tr><td>No.</td><td>FECHA</td><td>VALOR</td><td>VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>1224</td><td>23/02/2021</td><td>$ 2.829.999.937</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>10</td><td>16/05/2022</td><td>$ 7.499.519.218</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>12</td><td>13/08/2021</td><td>$ 7.499.519.195</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">RPs</th></tr>
<tr><td>No.</td><td>FECHA</td><td>VALOR</td><td>VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>1985</td><td>13/08/2021</td><td>$ 2.829.999.937</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>7</td><td>16/05/2022</td><td>$ 7.499.519.218</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>27</td><td>13/08/2021</td><td>$ 7.499.519.195</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>El valor del contrato es por DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($17.829.038.350), equivalentes a 19.624,13 SMLMV, para el año de suscripción del contrato (2021), suma que se discrimina de la siguiente manera:

Para la vigencia 2021: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINITINUEVE MILLONES NOVECEINTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.829.999.937).
Para la vigencia 2022: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 7.499.519.218).
Para la vigencia 2023: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 7.499.519.195).
Dichas sumas incluyen IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTINUEVE (29) MESES, contados a partir del acta de inicio, la cual se dio el 20 de agosto de 2021.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>20 de agosto de 2021</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>19 de enero de 2024</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA:</td><td>Consorcio Señalvial</td></tr>
<tr><td>IDENTIFICACION:</td><td>NIT: 901.498.594-9</td></tr>
</table>

Fuente: Elaboración propia

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista le corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 3- ZONA OCCIDENTE-NORTE.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

A continuación, en la tabla 2 se relacionan los diseños asignados por la entidad contratante e implementados por el CONSORCIO SEÑALVIAL, los cuales hacen parte de este periodo comprendido entre el 01 al 30 de octubre del 2022:

Tabla 2. Relación ID diseños asignados

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ID	IMPLEMENTACION	LOCALIDAD
EX_10_365_1842_12_V1 (PLANCHA 1)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_365_1842_12_V1 (PLANCHA 2)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_365_1842_12_V1 (PLANCHA 3)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_365_1842_12_V1 (PLANCHA 4)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_365_1842_12_V1 (PLANCHA 5)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_365_1842_12_V1 (PLANCHA 6)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_365_1842_12_V1 (PLANCHA 7)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_365_1842_12_V1 (PLANCHA 8)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_365_1842_12_V1 (PLANCHA 9)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_365_1842_12_V1 (PLANCHA 10)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_365_1842_12_V1 (PLANCHA 11)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_365_1842_12_V1 (PLANCHA 12)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_365_1842_12_V1 (PLANCHA 13)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_365_1842_12_V1 (PLANCHA 14)	HORIZONTAL	ENGATIVA
SH_SV_UMV_161_2022_KR29_CL39BIS_CL40A (P1)	HORIZONTAL	ENGATIVA
SH_SV_UMV_161_2022_KR29_CL39BIS_CL40A (P2)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 3)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 4)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 5)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 6)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 7)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_13_003_1556_10 (PLANCHA 8)	HORIZONTAL	ENGATIVA
CP_KR24_CL84	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_008_1560_10_(CP176)	VERTICAL	ENGATIVA
EX_10_039_1560_10_(CP179)	VERTICAL/HORIZONTAL	ENGATIVA
ID EX_10_377_1842_12_V4_(CP212)	VERTICAL	ENGATIVA
ID EX_10_352_1236_11_V5_(CP200)	VERTICAL	ENGATIVA
EX_13_185_1881_12_(CP109)	VERTICAL	ENGATIVA
EX_10_341_1236_11_(CP217)	VERTICAL	ENGATIVA

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

CP_150	VERTICAL	ENGATIVA
EX_13_003_1556_10_(CP174)	VERTICAL	ENGATIVA
	VERTICAL	ENGATIVA
CP_47	VERTICAL	ENGATIVA
	VERTICAL	ENGATIVA
EX_10_347_1236_11_(CP213)	VERTICAL	ENGATIVA
EX_10_105_1560_10_(CP265)	VERTICAL/HORIZONTAL	ENGATIVA
CP_192	VERTICAL	ENGATIVA
	VERTICAL	ENGATIVA
EX_12_158_1881_12	VERTICAL	BARRIO UNIDOS
EX_10_355 (CP_KR94G)	VERTICAL	ENGATIVA
EX_03_041_670_11	VERTICAL/HORIZONTAL	CHAPINERO
EX_03_078_1881_12	VERTICAL/HORIZONTAL	CHAPINERO
	VERTICAL/HORIZONTAL	CHAPINERO
EX_03_073_1881_12	VERTICAL/HORIZONTAL	CHAPINERO
	VERTICAL/HORIZONTAL	CHAPINERO
EX_13_157_1249_11	VERTICAL/HORIZONTAL	CHAPINERO
	VERTICAL/HORIZONTAL	CHAPINERO
EX_02_227_1794_10	VERTICAL/HORIZONTAL	CHAPINERO
EX_02_166_1249_11	VERTICAL	CHAPINERO
EX_12_157_1881_12 (PLANCHA 1)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS
EX_12_157_1881_12 (PLANCHA 2)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS
EX_12_157_1881_12 (PLANCHA 3)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS
EX_12_157_1881_12 (PLANCHA 4)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS
EX_13_171_1881_12(PLANCHA 1)	HORIZONTAL	TEUSAQUILLO
EX_13_171_1881_12(PLANCHA 3)	HORIZONTAL	TEUSAQUILLO
MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 9)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA
MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 10)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA
MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 11)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 13)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA
MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 14)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA
MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 16)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA
MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 17)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA
MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 19)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA
MV_10_183_1747_10 (PLANCHA 20)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA
MV_18_031_1561_10_V7(PLANCHA 1)	HORIZONTAL	CHAPINERO-SANTAFE
MV_18_031_1561_10_V7(PLANCHA 2)	HORIZONTAL	CHAPINERO-SANTAFE
MV_18_031_1561_10_V7(PLANCHA 3)	HORIZONTAL	CHAPINERO-SANTAFE
EX_13_002_1556_10 (PLANCHA 1)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_13_002_1556_10 (PLANCHA 2)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_13_002_1556_10 (PLANCHA 3)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_116_1560_10_(PLANCHA 1)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_116_1560_10_(PLANCHA 2)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_116_1560_10_(PLANCHA 3)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_116_1560_10_(PLANCHA 4)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_352_1236_11(PLANCHA 1)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_352_1236_11(PLANCHA 2)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_352_1236_11(PLANCHA 3)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_352_1236_11(PLANCHA 5)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_13_200_1881_12 (PLANCHA 1)	HORIZONTAL	TEUSAQUILLO
MV_12_281_941_09 AC 72 (PLANCHA 1)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA
MV_12_281_941_09 AC 72 (PLANCHA 2)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA
MV_12_281_941_09 AC 72 (PLANCHA 3)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA
MV_12_281_941_09 AC 72 (PLANCHA 4)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA
MV_12_281_941_09 AC 72 (PLANCHA 5)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA
MV_12_281_941_09 AC 72 (PLANCHA 6)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA
MV_12_281_941_09 AC 72 (PLANCHA 7)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

MV_12_281_941_09 AC 72 (PLANCHA 8)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA
MV_12_281_941_09 AC 72 (PLANCHA 9)	HORIZONTAL	BARRIOS UNIDOS-ENGATIVA
EX_10_360_1236_11_V5	VERTICAL	ENGATIVA
EX_10_110_1560_10_(PLANCHA 1)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_110_1560_10_(PLANCHA 2)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_110_1560_10_(PLANCHA 3)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_110_1560_10_(PLANCHA 4)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_110_1560_10_(PLANCHA 5)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_110_1560_10_(PLANCHA 6)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_001	VERTICAL	ENGATIVA
EX_13_374_1842_12(PLANCHA 4)	HORIZONTAL	ENGATIVA
		ENGATIVA
EX_10_353_1236_11	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_10_355 (CP_KR94G)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_02_227_1794_10 (PLANCHA 1)	HORIZONTAL	ENGATIVA
EX_12_143_1881_12 (CP KR58)	HORIZONTAL	ENGATIVA
SH_SV_IDU_1692_2020	HORIZONTAL	ENGATIVA

Así mismo, después de realizar la inspección en campo de cada uno de los ID mencionados anteriormente, y de acuerdo con el Anexo Técnico, se definen las etapas para la ejecución del proyecto de señalización vial.

Una vez terminada la inspección de los diseños asignados se realiza con el acompañamiento de la interventoría la elaboración de los presupuestos iniciales, así como las consultas de los estados actuales de las reservas según los enlaces http://uaermv.maps.arcgis.com https://idu.maps.arcgis.com.

Posterior a estas consultas, se coordina con la interventoría el inicio de las actividades de implementación una vez sea aprobado el COI-PMT solicitado ante la SDM.

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras.

De acuerdo a lo anterior, en la siguiente tabla se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla 3. Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VALOR	VIGENCIA CDP
1224	23/02/2021	13301160449000000000	Maquinaria y Equipo	$ 2.829.999.937	2021
10	16/05/2022	13301160449000000000	Maquinaria y Equipo	$ 7.499.519.218	2022
12	13/08/2021	13301160449000000000	Maquinaria y Equipo	$ 7.499.519.195	2023

CRP	FECHA DE CRP	CODIGO	CONCEPTO	VALOR	VIGENCIA
1985	13/08/2021	13301160449000000000	Maquinaria y Equipo	$ 2.829.999.937	2021
7	16/05/2022	13301160449000000000	Maquinaria y Equipo	$ 7.499.519.218	2022
27	13/08/2021	13301160449000000000	Maquinaria y Equipo	$ 7.499.519.195	2023

Fuente: Elaboración propia

A continuación, y con corte al 30 de octubre de 2022, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla.

Tabla 4. Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA DE CRP	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR CANCELADO	SALDO CRP
2021	1985	13/08/2021	$ 2.829.999.937	$2.829.999.937	$ 0
VIGENCIA 2021 AGOTADA, LA RETEGARANTIA ACUMULADA EN LA VIGENCIA 2021 SE TRASLADA A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO					
2022	7	16/05/2022	$ 7.499.519.218	$5.770.013.614	$ 1.729.505.604
LA RETEGARANTIA ACUMULADA EN LA VIGENCIA 2022 SE TRASLADA A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO					
2023	27	13/08/2021	$ 7.499.519.195	$0.00	$ 7.499.519.195
RETEGARANTIA (Acumulado) 5%				$430.000.677	

Secretaria Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con lo anterior, en la **Tabla** 5 se muestra el análisis financiero a corte del 30 de octubre de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla 5. Estado del Contrato con corte al 30 de septiembre de 2022

ÍTEM	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	$17.829.038.350
2	Valor Ejecutado	$ 8.600.013.551
3	Saldo por Ejecutar	$9.229.024.799
4	Valor pagado	$8.170.012.874
5	Saldo CRP 1985	$ 0
6	Saldo CRP 7	$ 1.729.505.604
7	Saldo CRP 27	$ 7.499.519.195

Fuente: Elaboración propia

6. CONCLUSIONES

Al corte del 30 de octubre de 2022, se realizaron recorridos e inspecciones de los IDS mencionados en la tabla 2, con el fin de determinar las condiciones físicas y operativas, de infraestructura, geométricas, señalización existente y demás aspectos que ayuden al correcto desarrollo de las actividades de implementación.

Así mismo se realizó un avance financiero de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/ CTE ($ 893,368,552), lo que indica un porcentaje de avance total del contrato de obra de 48.24% para el mes Catorce de ejecución.
