SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 2021-2013

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de febrero de 2022 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2013 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el **CONSORCIO SV BOGOTÁ** y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"- (LOTE 2)**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 28 de febrero del año 2022 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2013, quien ejerce la interventoría al contrato de obra 2021-2020 (CONSORCIO MYSV-OINCO) para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

- Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2013 con corte al 28 de febrero de 2022, quien ejerce la interventoría del contrato de obra 2021-2020 en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

- Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 28 de febrero de 2022 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2013

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizadas en la ejecución del contrato con corte al 28 de febrero de 2022:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 1 Datos del Contrato

<table>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>SDM-2021-2013</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”-(LOTE 2) ZONA ORIENTE - NORTE</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">CDPs</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>FECHA</th><th>VALOR</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>1681</td><td>19/04/2021</td><td>$ 4.466.297.584,00</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>11</td><td>10/03/2021</td><td>$ 11.006.732.000,00</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>11</td><td>10/03/2021</td><td>$ 11.006.732.000,00</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">RPs</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>FECHA</th><th>VALOR</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>1922</td><td>28/07/2021</td><td>$616.030.555,00</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>21</td><td>28/07/2021</td><td>$1.522.827.529,00</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>21</td><td>28/07/2021</td><td>$1.568.512.333,00</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>TRES MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ($3.707.370.417), Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,60 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021).</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2013</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>17 de agosto de 2021</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>16 de enero de 2024</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>CONSORCIO SV BOGOTÁ</td></tr>
<tr><td>IDENTIFICACION:</td><td>NIT: 901.499.776</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA DE OBRA</td><td>CONSORCIO MYSV - OINCO
CONTRATO SDM-2021-2020</td></tr>
</table>

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Interventor corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): **LOTE 2- ORIENTE NORTE.**

El interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de la propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Se realizará la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato de las obras conexas al contrato 2021-2020, el cual se desarrollará en las localidades de Santafé, la Candelaria y Chapinero y sobre el corredor de la Carrera 7, que se muestran de forma esquemática en la Ilustración1.

Las actividades relacionadas con el objeto del proceso serán ejecutadas en la ciudad Bogotá D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación y donde se requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren a cargo de la Entidad.

No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 1 Anexo Nº 1 – Anexo Técnico Definitivo, durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de la zona. Así mismo, es responsabilidad del contratista la señalización de las vías limítrofes de la zona asignada.

Para todos los efectos la Secretaría Distrital de Movilidad se reserva el derecho de intervención, el cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (Director de Ingeniería de Tránsito) y el Subdirector Técnico de Señalización, con el correspondiente seguimiento por parte de la interventoría y el acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría Distrital de Movilidad para el contrato de interventoría.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Ilustración 1: Localización del proyecto

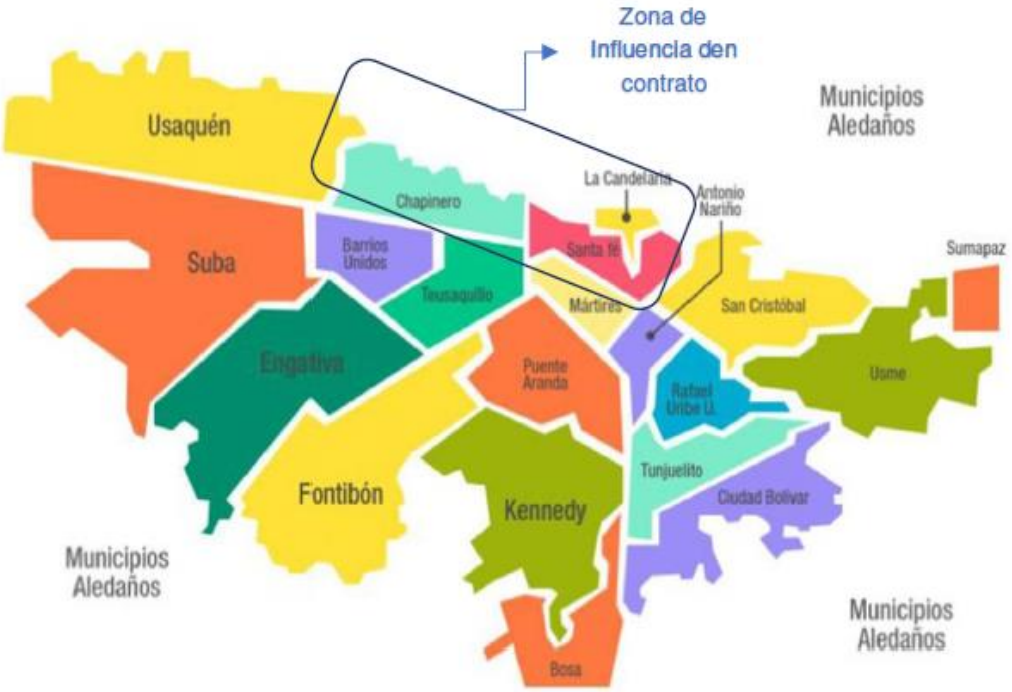

Fuente: ***https://tierracolombiana.org/localidades-de-bogota/***
Modificado por CONSORCIO SV BOGOTÁ.

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y la interventoría se relacionan a continuación, indicando estado de inspecciones y diagnósticos preliminares de conformidad con lo consagrado en los anexos técnicos SDM-LP-033-2021 y SDM-CMA-039-2021, correspondientes a los contratos de obra e interventoría, respectivamente, donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 2 – Diseños asignados para implementación con el contrato 2021-2020 (Zona Oriente – Norte) CTO Interventoría 2021-2013

No.	Id DISEÑO	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	% Avance	ESTADO
1	CPS_676_MV_01_04_V29_OBRA	AK 7 entre CL 32 y CL 85	Prioritario	$ 37.266.160,00	100%	Ejecutado
2	EX_03_001_1841_17_V0	CL 4 hasta DG 7 Sur entre KR 3 y KR 11B Este	Normal	$ 540.815.976,90	88,82%	En ejecución
3	EX_03_070_1881_12_V2	KR 2E y KR 8E desde CL 2 hasta CL 3B	Normal	$ 62.373.731,20	80,79%	En ejecución
4	EX_03_066_1881_12_V2	CL 9C y DG 3A desde KR 3 hasta KR 8A	Normal	$ 20.399.086,00	21,34%	En ejecución
5	EX_03_065_1881_12	CL 6 y CL 6D desde la KR 3E hasta 6A Este	Normal	$ 148.650.107,00	90,54%	En ejecución
6	EX_03_071_1881_12	CL 1F Y CL 3 desde KR 1 hasta KR 2E	Normal	$ 67.568.649,00	71,00%	En ejecución
7	EX_03_085_1881_12	CL 33B hasta la CL 26Bis entre KR 5 y KR 1	Normal	$ 430.241.128,24	121,42%	En ejecución
8	EX_02_356_946_10_V6	KR 18 entre CL 94 Y CL 93, CL 96B entre KR 18 y KR 15	Prioritario	$ 114.423.160,33	100%	Ejecutado
9	EX_17_034_1881_12	CL 12 hasta la CL 22 entre KR 3A y KR 5E	Normal	$ 82.873.640,46	50,92%	En ejecución
10	EX_02_033_1556_10_V20	Entre KR 11 y KR 13 desde la CL 88 hasta la CL 93B	Prioritario	$ 97.932.610,49	100%	Ejecutado
11	MV_01_033_1560_10	Autopista Norte entre CL 166 y CL 245	Normal	$ 371.427.059,05	93,79%	En ejecución
12	EX_03_041_670_11_V3	DG 40A a CL 33 entre AK 7 y AK 14	Normal	$ 80.601.015,06	73,79%	En ejecución
13	EX_03_078_1881_12_V4	KR 13 y KR 5 desde CL 36 hasta	Normal	$ 41.703.139,61	65,24%	En ejecución
14	EX_17_036_1881_12	CL 6A Bis hasta CL 1C entre KR 1A y AK 7	Normal	$ -	0%	Inspeccionado
15	EX_03_076_1881_12	AC 19 hasta la CL 26 entre KR 10 y KR 3	Normal	$ 49.571.425,19	32%	En ejecución
16	EX_17_001_1841_17	KR 3 Este y KR 7 Este desde CL 9B hasta CL 10	Normal	$ -	0%	Inspeccionado
17	MV_02_280_941_09	KR 5 entre CL 26A hasta CL 27	Normal	$ 99.612.151,31	93,01%	En ejecución
18	PMT Kra 6 " 1-43	KR 6 No. 1-43	Prioritario	$ 1.009.933,00	100%	Ejecutado
19	CPS_676_MV_01_04_V2 4-pasavia4	Sobre la calle 94 entre Carrera 7 y carrera 7A. Sentido Occidente-Oriente	Prioritario	$ 836.637,00	100%	Ejecutado
20	CPS_676_MV_01_04_V2 4-pasavia4	Sobre la calle 92 entre Carrera 7 y carrera 7A. Sentido Occidente-Oriente	Prioritario	$ 1.216.927,00	100%	Ejecutado
21	CP CALLE 83 ENTRE KRA 14 Y 15	Calle 83 entre KR 14 y 15	Prioritario	$ 101.365,00	100%	Ejecutado
22	CP RETIRO DE TACHONES	AK 7 con CL 92	Prioritario	$ 52.793	100%	Ejecutado
23	CPS-676-MV01-04-28-OBRA CLL 92	KR 6 con CL 1	Prioritario	$ 8.471.392,95	100%	Ejecutado

Continua abajo…

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

No.	Id DISEÑO	DIRECCIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	% Avance	ESTADO
24	PMT EMERGENCIA	KR 7A ESTE 2C 0513-12-2021	Prioritario	$ 582.376	100%	Ejecutado
25	PMT EMERGENCIA	Dg 44_Kr 3 Este y Tv 1 Este	Prioritario	$ 2.839.686,00	100%	Ejecutado
26	PMT EMERGENCIA	IDIGER- TV 2A_ SANTA FE	Prioritario	$ 1.511.845	100%	Ejecutado
27	CP SDM-SS-73925-2020 SR-29	Carrera 5 entre Calle 24 y Calle 26.	Prioritario	$ 873.564,00	100%	Ejecutado
28	CP EX_02_033_1556_10-20 LOT 2 Y 3	Carrera 13 entre Calle 93 y Calle 93A.	Normal	$ 7.369.974	100%	Ejecutado
29	MV_02_335_946_10-V12	Vía a la Calera entre AK 7 con CL 85 hasta K6+500 (Peaje)	Normal	$ -	0%	Inspeccionado
30	EX_02_203_1881_12_V2 ESTACIONAMIENTO	LA AV 100 Y CLL 98 - CL 98 ENTRE TV 21 Y TV 22 - CLL 98 ENTRE TV 22 Y TV 23 - TV 23 ENTRE CL 98 Y CL 97 - CL 97 ENTRE TV 23 Y AK 19 - TV 21 ENTRE CL 98 Y CL 97 9	Normal	$ 7.369.974,00	6,76%	En ejecución
31	EX_02_356_946_10_V7 ESTACIONAMIENTO	CL 95 ENTRE KR 17 Y KR 15 CALLE 97 ENTRE KR 17 Y KR 15 KR 16 ENTRE CALLE 95 Y CALLE 97	Normal	$ -	0%	Inspeccionado
32	CPS_676_MV_01_04_V2 9_OBRA.dwg	CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 32	Normal	$ -	0%	En inspección
33	CP Transversal 3 entre Calles 56 y 53	TV 3 entre CL 56 y CL 53	Prioritario	$ 2.323.005,27	100%	Ejecutado
34	CP PLANO PMT Km 9 vía Bogotá Choachí 27-01-2022	Km 9 vía Bogotá - Choachí	Prioritario	$ -	0%	Asignado
35	CP PLANO PMT Km 4 vía Bogotá Choachí	Km 4 vía Bogotá - Choachí	Prioritario	$ -	0%	Asignado
36	CP EX_ 02_335_946 CHEVRON	Av. Circunvalar con calle 87, sentido Sur-Norte	Prioritario	$ 0	0%	Asignado
37	CP EX _ 02_180_1881_12 NO PASE	Calle 74 No. 1-82	Prioritario	$ 291.188,00	100%	Ejecutado
38	CP EX_02_180_1881_ 12 Señal SR-01	Calle 81 con KR 6	Prioritario	$ -	0%	Asignado
39	CP EX_02_180_1881_12 Señal SR-28	Carrera 5 # 79-35	Prioritario	$ -	0%	Asignado
40	EX_02_102_1556_10_V2	CL 48 HASTA CL 62 ENTRE LA AK 14 Y KR 13	Normal	$ -	0%	Asignado
41	EX_02_166_1249_11_V1	CL 44 HASTA LA CL 40B ENTRE KR 13 Y AK 7	Normal	$ -	0%	Asignado
42	EX_02_171_1249_11	ENTRE AK 7 Y KR 3 DESDE LA DG 92 HASTA CL 93	Normal	$ -	0%	Asignado
43	EX_02_195_1881_12_V6	CL 64 HASTA LA CL 53 ENTRE KR 13 Y AK 7	Normal	$ -	0%	Asignado
44	EX_02_227_1794_10_V1	DG 40A HASTA CL 44 Y ENTRE LA AK 14 Y KR 13.	Normal	$ -	0%	Asignado
45	EX_02_240_575_11_V7	Kr 8a entre Cll 95 y Cl 97a (solo este sector)	Normal	$ -	0%	Asignado

Fuente: Consorcio SV BOGOTÁ – Informe No. 6 Interventoría

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 3 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2020

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
ENE-FEB/2022	Id EX_03_001_1841_17_V0	Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas, así mismo se realizó el retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
ENE-FEB/2022	Id EX_03_071_1881_12	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM, LCP, LC, LA, LB, LCN, LCA, LP, LIC, PAB, PP, PE, PPP, PTEXT, PVM, PZE, RV, SPT, TCH, ZB, ZBC, RPA, PSP47A, VCC, VMP. instalación de estoperoles, zonas de pacificación. Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas, así mismo se realizó el retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
ENE-FEB/2022	Id EX_03_085_1881_12	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM,LCP, LC, LA, LB, LCN, LCA, LP, LIC, PAB, PP, PE, PPP, PTEXT, PVM, PZE, RV, SPT, TCH, ZB, ZBC, RPA, PSP47A, VCC, VMP. instalación de estoperoles, zonas de pacificación. Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas, así mismo se realizó el retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
ENE-FEB/2022	EX_17_034_1881_12	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM,LCP, LC, LA, LB, LCN, LCA, LP, LIC, PAB, PP, PE, PPP, PTEXT, PVM, PZE, RV, SPT, TCH, ZB, ZBC, RPA, PSP47A, VCC, VMP, instalación de estoperoles, zonas escolares. Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas, así mismo se realizó el retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
ENE-FEB/2022	MV_01_033_1560_10	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: ACH, BA, FDI, FF, FGD, FGI, LA, LCA, LCE, LCM, LCN, LIC, LP, LPA, PC, PCE, PCP, PCP1, PTEX, RCI, SPT, TCH, TR, TR, VMP30.
ENE-FEB/2022	EX_03_041_670_11_V3	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: BA, FDD, FDI, FF, FGD, FGI, LAL, LB, LCA, LCN, LE, LIC, LP, LPA, PAB, PCC, PCP, PCP1, PE, PSP47A, PZE, RV, SPT, TR, VMP30, instalación de estoperoles, zonas escolares.
ENE-FEB/2022	EX_03_078_1881_12_V4	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: ACH, BA, FDD, FDI, FF, FGD, FGI, LA, LAL, LB, LC, LCA, LCM, LE, LIC, LP, LPA, PAB, PCP, PCP1, PE, PP, PSOLO, PSP47A, PZE, RCI, RV, SPT, TR, VMP30, instalación de estoperoles, zonas escolares.
ENE-FEB/2022	EX_03_076_1881_12	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: ACH, BA, BL, FDD, FDI, FF, LP, PAB, PC, PCP, PE, PP, PSP47A, PZE, RCD, SPT, TCH, VMP30, ZB, ZBC, instalación de estoperoles.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
ENE-FEB/2022	MV_02_280_941_09 CR 5	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: ACH, BA, CP, FDD, FDI, FF, FGD, FGI, LA, LAL, LB, LCA, LCM, LCN, LCP, LIC, LP, LPA, PAB, PCP, PCP1, PP, PSP47A, PZE, SPT, TCH, TR, VMP30, ZB, instalación de estoperoles, zonas escolares.
ENE-FEB/2022	EX_02_203_1881_12_V2	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: ACH, FDD, FDI, FF, FGD, LA, LE, LP, PP, PPP, PZE, RCD, SPT, VMP30, ZBC

Fuente: Informe Mensual No. 6 Contrato de Interventoría 2021-2013

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM-2021-2013, con corte mensual a 28 de febrero de 2022:

Tabla No. 4 Avance del Proyecto

ACTA DE PAGO N° 06
CONTROL PRESUPUESTAL MENSUAL Y ACUMULADO CUENTA No. 06
INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2021-2013

VR INICIAL CTO INTERVENTORÍA	$ 3,707,370,417
VR ADICIÓN	$ -
VR TOTAL	$ 3,707,370,417

ACTA No.	PERIODO A FACTURAR	VALOR 40% MENSUAL FIJO	% AVANCE OBRA DEL PERIODO	VALOR 50% AVANCE DE OBRA	% AVANCE DE CONSULTORÍA DEL PERIODO	VALOR 10% AVANCE CONSULTORÍA	VALOR A DESCONTAR A LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO	VALOR A FACTURAR	SALDO POR FACTURAR	CUENTA PAGADA / EN TRÁMITE
1	17/AGT./2021 - 16/SEP/2021	$ 51,136,144.00	0.35%	$ 6,487,898.00	0%	$ -	$ -	$ 57,624,042	$ 3,649,746,375	PAGADA
2	17/SEP/2021 - 16/OCT/2021	$ 51,136,144.00	1.21%	$ 22,429,591.00	0%	$ -	$ -	$ 73,565,735	$ 3,576,180,640	PAGADA
3	17/OCT/2021 - 16/NOV/2021	$ 51,136,144.00	2.81%	$ 52,088,554.00	0%	$ -	$ -	$ 103,224,698	$ 3,472,955,942	PAGADA
4	17/NOV/2021 - 16/DIC/2021	$ 51,136,144.00	2.57%	$ 47,639,710.00	0%	$ -	$ -	$ 98,775,854	$ 3,374,180,088	PAGADA
5	17/DIC/2021 - 16/ENE/2021	$ 51,136,144.00	3.04%	$ 56,352,030.00	0%	$ -	$ -	$ 107,488,174	$ 3,266,691,914	PAGADA
6	17/ENE/2022 - 16/FEB/2022	$ 51,136,144.00	3.76%	$ 69,698,564.00	0%	$ -	$ -	$ 120,834,708	$ 3,145,857,206	TRÁMITE
	TOTALES VALOR CONTRATO	$ 306,816,864	13.74%	$ 254,696,347	0.00%	$ -	$ -	$ 561,513,211		

RESUMEN VALORES DEL CONTRATO DE OBRA INTEGRAL Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		VALOR EJECUTADO EN EL MES POR COMPONENTE	% EJECUTADO PARA EL PERIODO	ONENTES PARA EL COBRO DE INTERVEN	VALOR A COBRAR POR LA INTERVENTORÍA
VALOR COMPONENTE DE OBRA CONTRATO INTEGRAL No. 2021-2013	$ -	$ -	3.76%	50% AVANCE OBRA	$ 69,698,564.00
VALOR COMPONENTE CONSULTORÍA CONTRATO INTEGRAL No.	$ -			10% AVANCE CONSULTORÍA	$ -
VALOR DEL CONTRATO INTEGRAL (OBRA + CONSULTORÍA)	$ -			40% MENSUAL FIJO	$ 51,136,144.00
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2013	$ 3,707,370,417			POR INTERVENTORÍA CTO No. 2021-2013	$ 120,834,708.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2013	$ 3,707,370,417			VALORES A DESCONTAR	$ -
				VALOR TOTAL A COBRAR	$ 120,834,708.00

JOSE ALEJANDRO MORENO FOGLIA
Representante Legal
CONSORCIO SV BOGOTÁ

NELSON RICARDO BELTRAN MOJICA
VoBo. Director de la Interventoría
CONSORCIO SV BOGOTÁ

Fuente: Elaboración Propia

adro contrato interventoría.

Fuente: Informe Mensual de Interventoría No. 6 CTO 2021-2013

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, aclarando que al 28 de febrero de está pendiente el pago del período de feb/ 2022, cuya presentación de cuenta se surten conforme con las directrices que remita la Subdirección Financiera de la SDM.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
1681	19/04/2021	133011604490000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2021	1922	**28/07/2021**	$ 616.030.555	$ 616.030.555
11	10/03/2021	133011604490000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2022	21	**28/07/2021**	$1.522.827.529	$1.522.827.529
11	10/03/2021	133011604490000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2023	21	**28/07/2021**	$1.568.512.333	$1.568.512.333
								$3.707.370.417

Tabla No. 6 Cortes de Obra (Interventoría) Vs Recursos asignados

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP (INICIAL/ ACUMULADO)	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR CRP	RETEGARANTÍA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	No. DOC. CONTABLE	FECHA
Ago/2021 a Sep/2021 – Mes 1	**1922**	**2021**	$ 616.030.555	$ 57.624.042	$ 558.406.513	**N/A.**	**$ 4.668.031**	**$ 52.956.011**	**3000757039**	**25/10/2021**
Sep/2021 a Oct/2021 – Mes 2	**1922**	**2021**	$ 558.406.513	$ 73.565.735	$ 484.840.778	**N/A.**	**$ 5.959.444**	**$ 67.606.291**	**3000836519**	**24/11/2021**
Oct/2021 a Nov/2021 Mes 3	**1922**	**2021**	$ 484.840.778	$ 103.224.698	**$ 381.616.080**	**N/A.**	**$ 8.362.068**	**$ 94.862.630**	**3000973212**	**27/12/2021**
Nov/2021 a Dic/2021 Mes 4	**1922**	**2021**	**$ 381.616.080**	$ 98.775.854	**$ 282.840.226**	**N/A.**	**$ 15.618.206**	**$ 83.157.648**	**3000109566**	**22/02/2022**

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP (INICIAL/ ACUMULADO)	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR CRP	RETEGARANTÍA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	No. DOC. CONTABLE	FECHA
Dic/2021 a Ene/2022 Mes 5	1922	2021	$ 282.616.080	$ 107.488.174	$ 175.352.052	N/A.	$ 8.866.420	$ 98.621.754	3000137900	3/03/2022
Ene/2022 a Feb/2022 Mes 6	1922	2021	$ 175.352.052	$ 120.834.708	$ 54.517.344	N/A.	EN PROCESO	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE

***La cuenta del mes de febrero de 2022 ($120.834.708) a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. La cuenta del mes de enero de 2021 (5 corte) por valor de $ 107.488.174 fue pagada el 03 de marzo de 2022.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 28 de febrero de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de diciembre 2021

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	$3.707.370.417
2	Valor Ejecutado	$561.513.211***
3	Saldo por Ejecutar	$3.145.857.206
4	Valor pagado	$440.678.503***
5	Saldo CRP 1922	$54.517.344
6	Saldo CRP 21	$1.522.827.529
7	Saldo CRP 21	$1.568.512.333

***La cuenta del mes de febrero de 2022 ($120.834.708) a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad. La cuenta del mes de enero de 2022 (5 corte) por valor de $107.488.174 fue pagada el 03 de marzo de 2022.

6. CONCLUSIONES

Con corte al 28 de febrero de 2022, en el marco del Contrato SDM-2021-2020 se realizó implementación de los componentes vertical y horizontal y suministros, tal como se muestra a continuación:

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
ENE-FEB/2022	Id EX_03_001_1841_17_V0	Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas, así mismo se realizó el retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
ENE-FEB/2022	Id EX_03_071_1881_12	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM, LCP, LC, LA, LB, LCN, LCA, LP, LIC, PAB, PP, PE, PPP, PTEXT, PVM, PZE, RV,

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
		SPT, TCH, ZB, ZBC, RPA, PSP47A, VCC, VMP. instalación de estoperoles, zonas de pacificación. Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas, así mismo se realizó el retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
ENE-FEB/2022	Id EX_03_085_1881_12	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM,LCP, LC, LA, LB, LCN, LCA, LP, LIC, PAB, PP, PE, PPP, PTEXT, PVM, PZE, RV, SPT, TCH, ZB, ZBC, RPA, PSP47A, VCC, VMP. instalación de estoperoles, zonas de pacificación. Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas, así mismo se realizó el retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
ENE-FEB/2022	EX_17_034_1881_12	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM,LCP, LC, LA, LB, LCN, LCA, LP, LIC, PAB, PP, PE, PPP, PTEXT, PVM, PZE, RV, SPT, TCH, ZB, ZBC, RPA, PSP47A, VCC, VMP, instalación de estoperoles, zonas escolares. Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas, así mismo se realizó el retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
ENE-FEB/2022	MV_01_033_1560_10	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: ACH, BA, FDI, FF, FGD, FGI, LA, LCA, LCE, LCM, LCN, LIC, LP, LPA, PC, PCE, PCP, PCP1, PTEX, RCI, SPT, TCH, TR, TR, VMP30.
ENE-FEB/2022	EX_03_041_670_11_V3	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: BA, FDD, FDI, FF, FGD, FGI, LAL, LB, LCA, LCN, LE, LIC, LP, LPA, PAB, PCC, PCP, PCP1, PE, PSP47A, PZE, RV, SPT, TR, VMP30, instalación de estoperoles, zonas escolares.
ENE-FEB/2022	EX_03_078_1881_12_V4	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: ACH, BA, FDD, FDI, FF, FGD, FGI, LA, LAL, LB, LC, LCA, LCM, LE, LIC, LP, LPA, PAB, PCP, PCP1, PE, PP, PSOLO, PSP47A, PZE, RCI, RV, SPT, TR, VMP30, instalación de estoperoles, zonas escolares.
ENE-FEB/2022	EX_03_076_1881_12	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: ACH, BA, BL, FDD, FDI, FF, LP, PAB, PC, PCP, PE, PP, PSP47A, PZE, RCD, SPT, TCH, VMP30, ZB, ZBC, instalación de estoperoles.
ENE-FEB/2022	MV_02_280_941_09 CR 5	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: ACH, BA, CP, FDD, FDI, FF, FGD, FGI, LA, LAL, LB, LCA, LCM, LCN, LCP, LIC, LP, LPA, PAB, PCP, PCP1, PP, PSP47A, PZE, SPT, TCH,

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
		TR, VMP30, ZB, instalación de estoperoles, zonas escolares.
ENE-FEB/2022	EX_02_203_1881_12_V2	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: ACH, FDD, FDI, FF, FGD, LA, LE, LP, PP, PPP, PZE, RCD, SPT, VMP30, ZBC

Fuente: Informe Mensual No. 6 Contrato de Interventoría 2021-2013 CONSORCIO SV BOGOTÁ

Las actividades anteriormente relacionadas, bajo el seguimiento y control a través del contrato de interventoría 2021-2013.

Se continua con inspecciones de zonas escolares y señalización vial integral en las localidades de Candelaria, Santafé y Chapinero.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195
