SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 2021-2013

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de noviembre de 2021 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2013 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el **CONSORCIO SV BOGOTÁ** y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"- (LOTE 2)**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de noviembre del año 2021 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2013, quien ejerce la interventoría al contrato de obra 2021-2020 (CONSORCIO MYSV-OINCO) para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

- Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2013 con corte al 30 de noviembre de 2021, quien ejerce la interventoría del contrato de obra 2021-2020 en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

- Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de noviembre de 2021 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2013

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de noviembre de 2021.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 1 Datos del Contrato

<table>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>SDM-2021-2013</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”-(LOTE 2) ZONA ORIENTE - NORTE</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">CDPs</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>FECHA</th><th>VALOR</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>1681</td><td>19/04/2021</td><td>$ 4.466.297.584,00</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>11</td><td>10/03/2021</td><td>$ 11.006.732.000,00</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>11</td><td>10/03/2021</td><td>$ 11.006.732.000,00</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">RPs</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>FECHA</th><th>VALOR</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>1922</td><td>28/07/2021</td><td>$616.030.555,00</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>21</td><td>28/07/2021</td><td>$1.522.827.529,00</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>21</td><td>28/07/2021</td><td>$1.568.512.333,00</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>TRES MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ($3.707.370.417), Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,60 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021).</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2013</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>17 de agosto de 2021</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>16 de enero de 2024</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>CONSORCIO SV BOGOTÁ</td></tr>
<tr><td>IDENTIFICACION:</td><td>NIT: 901.499.776</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA DE OBRA</td><td>CONSORCIO MYSV - OINCO
CONTRATO SDM-2021-2020</td></tr>
</table>

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Interventor corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): **LOTE 2- ORIENTE NORTE.**

El interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de la propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Se realizará la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato de las obras conexas al contrato 2021-2020, el cual se desarrollará en las localidades de Santafé, la Candelaria y Chapinero y sobre el corredor de la Carrera 7, que se muestran de forma esquemática en la Ilustración1.

Las actividades relacionadas con el objeto del proceso serán ejecutadas en la ciudad Bogotá D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación y donde se requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren a cargo de la Entidad.

No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 1 Anexo Nº 1 – Anexo Técnico Definitivo, durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de la zona. Así mismo, es responsabilidad del contratista la señalización de las vías limítrofes de la zona asignada.

Para todos los efectos la Secretaría Distrital de Movilidad se reserva el derecho de intervención, el cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (Director de Ingeniería de Tránsito) y el subdirector Técnico de Señalización, con el correspondiente seguimiento por parte de la interventoría y el acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría Distrital de Movilidad para el contrato de interventoría.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Ilustración 1: Localización del proyecto

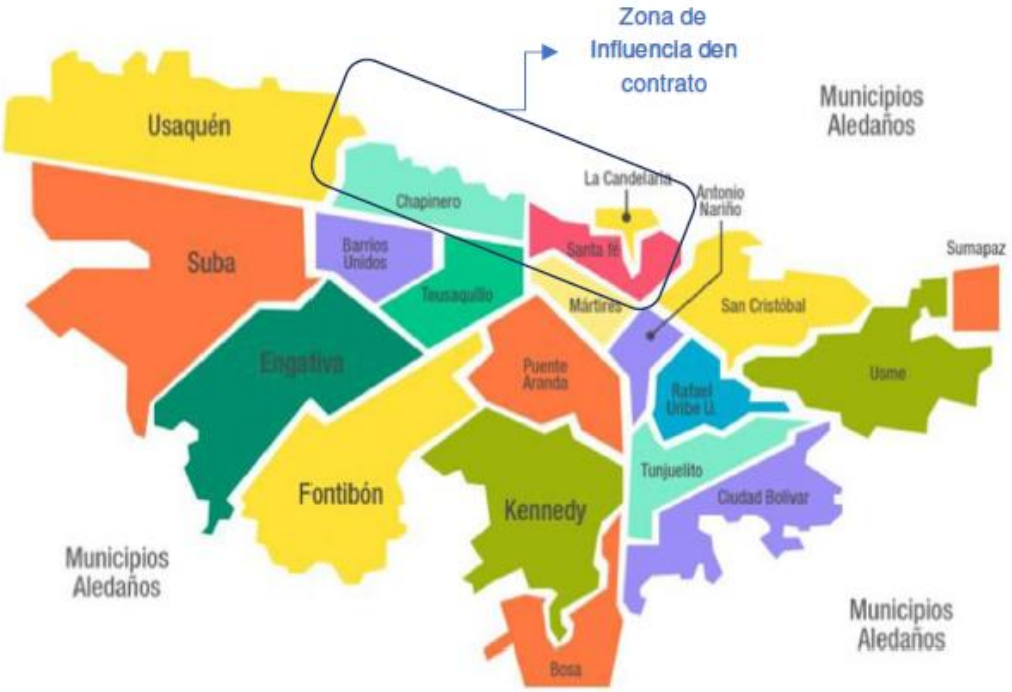

Fuente: ***https://tierracolombiana.org/localidades-de-bogota/***
Modificado por CONSORCIO SV BOGOTÁ.

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y la interventoría se relacionan a continuación, indicando estado de inspecciones y diagnósticos preliminares de conformidad con lo consagrado en los anexos técnicos SDM-LP-033-2021 y SDM-CMA-039-2021, correspondientes a los contratos de obra e interventoría, respectivamente, donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 2 – Diseños asignados para implementación con el contrato 2021-2020 (Zona Oriente – Norte) CTO Interventoría 2021-2013

N	ASIGNACIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO	AVANCE	% AVANCE	ESTADO
1	EX_03_001_1841_17_V0	Normal	$ 608.906.601,33	$258.124063.,47	42.39%	En Implementación
2	EX_03_070_1881_12_V2	Normal	$ 77.204.833,30	$48.994.061,85	63.46%	En Implementación
3	CPS_676_MV_01_04_V29_OBRA.dwg	Prioritario	$ 38.152.971,78	$31.112.554,73	100%%	Implementado
4	EX_03_066_1881_12_V2	Normal	$ 95.577.066,00	$ 0	0,00%	Inspeccionado
5	EX_03_078_1881_12_V4.dwg	Normal	$ -	$-	0,00%	Pendiente de Inspeccionado
6	MV_13_153_1249_11_V5.dwg	Normal	$ -	$ -	0,00%	Pendiente de Inspeccionado
7	TPD_PL_2342_V2.dwg	Normal	$ -	$-	0,00%	Pendiente de Inspeccionado
8	EX_03_065_1881_12	Normal	$164.186.167,90	$ -	0,00%	Inspeccionado
9	EX_03_071_1881_12	Normal	$95.171.492,00	$ -	0,00%	Inspeccionado
10	EX_03_076_1881_12	Normal	$ -	$ -	0,00%	Pendiente de Inspeccionado
11	EX_03_085_1881_12	Normal	$167.946.48,80	$ -	0,00%	Inspeccionado
12	EX_17_001_1841_17	Normal	$ -	$ -	0,00%	Pendiente de Inspeccionado
13	EX_17_034_1881_12	Normal	$ -	$-	0,00%	En Inspección
14	EX_17_036_1881_12	Normal	$ -	$-	0,00%	Pendiente de Inspeccionado
15	MV_02_280_941_09	Normal	$ -	$-	0,00%	Pendiente de Inspeccionado
16	EX_02_356_946_10_V6	Prioritario	$ 114.425.536,25	$112.388.260.83	98,22%	Implementado
17	EX_02_033_1556_10_V20	Prioritario	$ 133.966.172,60	$109.664.733,90	81.86%	En Implementación

Fuente: CONSORCIO SV BOGOTÁ.

Tabla No. 3 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2020

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
OCT-NOV DE 2021	Id EX_03_001_1841_17_V0	• Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM, LCP, LC, LA, LB, LCN, LCA, LP, LIC, PAB, PP, PE, PPP, PTEXT, PVM, PZE, RV, SPT, TCH, ZB, ZBC, RPA, PSP47A, VCC, VMP. Instalación de estoperoles, zonas de pacificación. • Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
		• Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
OCT-NOV DE 2021	Id EX_03_070_1881_12_V2	• Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM, LCP, LC, LA, LB, LCN, LCA, LP, LIC, PAB, PP, PE, PPP, PTEXT, PVM, PZE, RV, SPT, TCH, ZB, ZBC, RPA, PSP47A, VCC, VMP. Instalación de estoperoles, zonas de pacificación. • Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. • Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
OCT-NOV DE 2021	Id EX_02_356_946_10_V6	• Se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM, LC, LA, LB, LCA, LP, LE, PP, PBU, PC, PE, PPP, PVM, SPT, TR, TCH, ZB, ZBC, PSP47A, VMP. • Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. • Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
OCT-NOV DE 2021	Id EX_02_033_1556_10_V20	• Se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM, LC, LA, LB, LCA, LP, LE, PP, PBU, PC, PE, PPP, PVM, SPT, TR, TCH, ZB, ZBC, PSP47A, VMP. • Señalización Vertical: Se instalaron señales • reglamentarias y preventivas. • Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.

Fuente: Informe Mensual Contrato de Interventoría 2021-2013

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM-2021-2013, con corte mensual a 30 de noviembre de 2021.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 4 Avance del Proyecto

ACTA DE PAGO N° 03
CONTROL PRESUPUESTAL MENSUAL Y ACUMULADO CUENTA No. 03
INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2021-2013

VR INICIAL CTO INTERVENTORIA	$ 3.707.370.417
VR ADICIÓN	$ -
VR TOTAL	$ 3.707.370.417

ACTA No.	PERIODO A FACTURAR	VALOR 40% MENSUAL FIJO	% AVANCE OBRA DEL PERIODO	VALOR 50% AVANCE DE OBRA	% AVANCE DE CONSULTORÍA DEL PERIODO	VALOR 10% AVANCE CONSULTORÍA	VALOR A DESCONTAR A LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO	VALOR A FACTURAR	SALDO POR FACTURAR	CUENTA PAGADA / EN TRÁMITE
1	17/AGT/2021 - 16/SEP/2021	$ 51.136.144,00	0,35%	$ 6.487.896,00	0%	$ -	$ -	$ 57.624.042	$ 3.649.746.375	PAGADA
2	17/SEP/2021 - 16/OCT/2021	$ 51.136.144,00	1,21%	$ 22.429.591,00	0%	$ -	$ -	$ 75.565.735	$ 3.576.180.640	PAGADA
3	17/OCT/2021 - 16/NOV/2021	$ 51.136.144,00	2,81%	$ 52.088.554,00	0%	$ -	$ -	$ 103.224.698	$ 3.472.955.942	TRÁMITE
TOTALES VALOR CONTRATO		$ 153.408.432	4,57%	$ 81.006.043	0,00%	$ -	$ -	$ 234.414.475		

RESUMEN VALORES DEL CONTRATO DE OBRA INTEGRAL Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		VALOR EJECUTADO EN EL MES POR COMPONENTE	% EJECUTADO PARA EL PERIODO
VALOR COMPONENTE DE OBRA CONTRATO INTEGRAL No. 2021-2013	$ -	$ -	2,81%
VALOR COMPONENTE CONSULTORÍA CONTRATO INTEGRAL No.	$ -		
VALOR DEL CONTRATO INTEGRAL (OBRA + CONSULTORÍA)	$ -		
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2013	$ 3.707.370.417		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2013	$ 3.707.370.417		

IMPONENTES PARA EL COBRO DE INTERVENTO	VALOR A COBRAR POR LA INTERVENTORÍA
50% AVANCE OBRA	$ 52.088.554,00
10% AVANCE CONSULTORIA	$ -
40% MENSUAL FIJO	$ 51.136.144,00
A COBRAR POR INTERVENTORÍA CTO No. 20	$ 103.224.698,00
VALORES A DESCONTAR	$ -
VALOR TOTAL A COBRAR	$ 103.224.698,00

JOSÉ ALEJANDRO MORENO FOGLIA
Representante Legal
CONSORCIO SV BOGOTÁ

NELSON RICARDO BELTRAN MOJICA
VoBo. Director de la Interventoría
CONSORCIO SV BOGOTÁ

Fuente: Elaboración Propia

Nota: En caso de que las necesidades de la Entidad requieran una Adición se deberá agregar un espacio para el manejo de presupuesto de la adición del contrato, conservando el formato dicho espacio deberá incluirse igual al cuadro contrato interventor

Fuente: Informe Mensual de Interventoría No. 3 CTO 2021-2013

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, aclarando que al 30 de noviembre de 2021 está pendiente el pago del período de noviembre de 2021, cuya presentación de cuenta se surten a partir del 01 de diciembre y hasta el 10 de diciembre de 2021, conforme a la información remitida por la Subdirección Financiera de la SDM.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
1681	19/04/2021	13301160449000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2021	1922	**28/07/2021**	$ 616.030.555	$ 616.030.555
11	10/03/2021	13301160449000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2022	21	**28/07/2021**	$1.522.827.529	$1.522.827.529

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
11	10/03/2021	133011604490000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2023	21	**28/07/2021**	$1.568.512.333	$1.568.512.333
								$3.707.370.417

Tabla No. 6 Cortes de Obra (Interventoría) Vs Recursos asignados

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP (INICIAL/ ACUMULADO)	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR CRP	RETEGARANTÍA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	No. DOC. CONTABLE	FECHA
Ago/2021 a Sep/2021 – Mes 1	**1922**	**2021**	$ 616.030.555	$57.624.042	$ 558.406.513	**N/A.**	**$4.668.031**	**$52.956.011**	**3000757039**	**25/10/2021**
Sep/2021 a Oct/2021 – Mes 2	**1922**	**2021**	$ 558.406.513	$73.565.735	$ 484.840.778	**N/A.**	**$5.959.444**	**$67.606.291**	**3000836519**	**24/11/2021**
Oct/2021 a Nov/2021 Mes 3	**1922**	**2021**	$ 484.840.778	$103.224.698	**$381.616.080**	**N/A.**	**CUENTA EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**	**EN PROCESO**	**XX/XX/XXXX**

*** La cuenta del mes de noviembre de 2021 ($103.224.698) a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de noviembre de 2021 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de noviembre 2021

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	$3.707.370.417
2	Valor Ejecutado	$234.414.475***
3	Saldo por Ejecutar	$3.472.955.942
4	Valor pagado	$131.189.777***
5	Saldo CRP 1922	$381.616.080
6	Saldo CRP 21	$1.522.827.529
7	Saldo CRP 21	$1.568.512.333

*** La cuenta del mes de noviembre de 2021 ($103.224.698) a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de noviembre de 2021, en el marco del Contrato SDM-2021-2020 se realizó implementación de los componentes vertical y horizontal y suministros, tal como se muestra a continuación:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
OCT-NOV DE 2021	Id EX_03_001_1841_17_V0	• Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM, LCP, LC, LA, LB, LCN, LCA, LP, LIC, PAB, PP, PE, PPP, PTEXT, PVM, PZE, RV, SPT, TCH, ZB, ZBC, RPA, PSP47A, VCC, VMP. Instalación de estoperoles, zonas de pacificación. • Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. • Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
OCT-NOV DE 2021	Id EX_03_070_1881_12_V2	• Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM, LCP, LC, LA, LB, LCN, LCA, LP, LIC, PAB, PP, PE, PPP, PTEXT, PVM, PZE, RV, SPT, TCH, ZB, ZBC, RPA, PSP47A, VCC, VMP. Instalación de estoperoles, zonas de pacificación. • Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. • Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
OCT-NOV DE 2021	Id EX_02_356_946_10_V6	• Se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM, LC, LA, LB, LCA, LP, LE, PP, PBU, PC, PE, PPP, PVM, SPT, TR, TCH, ZB, ZBC, PSP47A, VMP. • Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. • Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
OCT-NOV DE 2021	Id EX_02_033_1556_10_V20	• Se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM, LC, LA, LB, LCA, LP, LE, PP, PBU, PC, PE, PPP, PVM, SPT, TR, TCH, ZB, ZBC, PSP47A, VMP. • Señalización Vertical: Se instalaron señales • reglamentarias y preventivas. • Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.

Fuente: Informe Mensual Contrato de Interventoría 2021-2013

Las actividades anteriormente relacionadas, bajo el seguimiento y control a través del contrato de interventoría 2021-2013.

Se continua con inspecciones de zonas escolares y señalización vial integral en las localidades de Candelaria y Santafé, adicionalmente culminando con la implementación de los diseños estacionamiento en vía en la localidad de Chapinero.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195
