SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2025

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de Noviembre de 2021 del Contrato de Obra SDM 2021-2025 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL BOGOTÁ y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto **"*REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.*" LOTE 7 - ZONA SUR-OCCIDENTE.**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de Noviembre del año 2021 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con Interventoría SDM-2021-2018 para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2025 con corte al 30 de Noviembre de 2021, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de Noviembre de 2021 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2025

A continuación, se muestra la localización y los principales datos del contrato y las modificaciones y ajustes realizados en la ejecución del contrato con corte al 30 de Noviembre de 2021.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Figura 1. Localización y localidades zona 7 - Sur-occidente

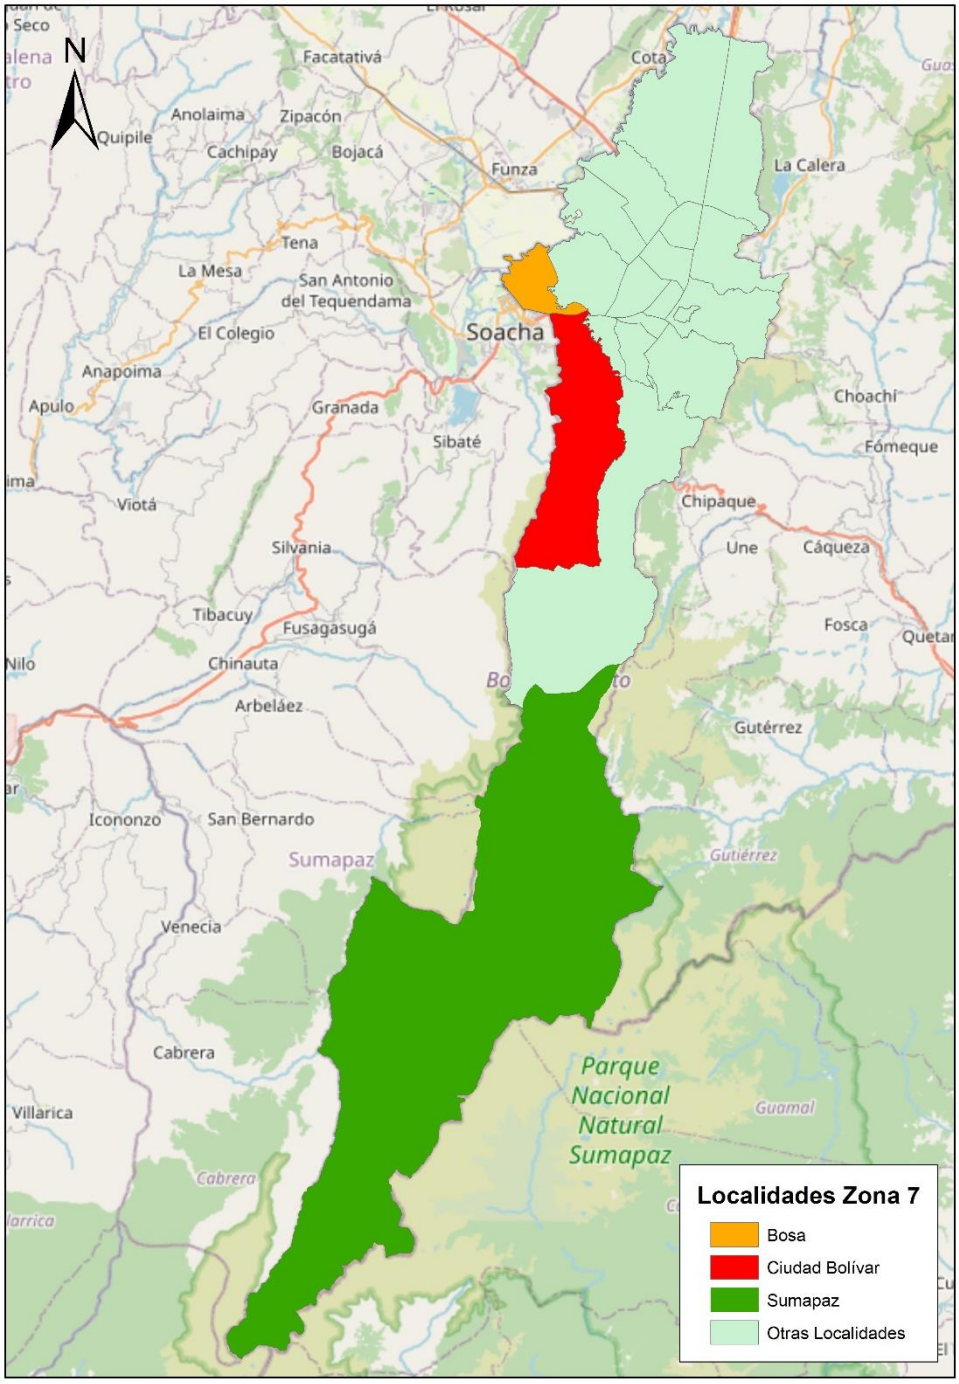

Fuente: Elaboración propia

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla 1. Datos del Contrato

<table>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>SDM-2021-2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” LOTE 7- ZONA SUR-OCCIDENTE.</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</td><td><table>
<tr><th colspan="4">CDPs</th></tr>
<tr><td>No.</td><td>FECHA</td><td>VALOR</td><td>VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>1224</td><td>23/02/2021</td><td>$ 19.810.000.000,00</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>12</td><td>12/03/2021</td><td>$ 26.248.317.500,00</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>13</td><td>12/03/2021</td><td>$ 26.248.317.500,00</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>12</td><td>12/03/2021</td><td>$ 26.248.317.500,00</td><td>2023</td></tr>
<tr><td>13</td><td>12/03/2021</td><td>$ 26.248.317.500,00</td><td>2023</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td><table>
<tr><th colspan="4">RPs</th></tr>
<tr><td>No.</td><td>FECHA</td><td>VALOR</td><td>VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>1921</td><td>28/07/2021</td><td>$ 2.829.999.937</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>20</td><td>28/07/2021</td><td>$ 7.499.519.218</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>20</td><td>28/07/2021</td><td>$ 7.499.519.195</td><td>2023</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2025.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>12 de Agosto de 2021</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>11 de enero de 2024</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL BOGOTÁ</td></tr>
<tr><td>IDENTIFICACION:</td><td>NIT: 901.500.183-3</td></tr>
<tr><td>INTERVENTORIA</td><td>CONSORCIO DCB SEGURIDAD VIAL 2021
CONTRATO SDM-2021-2018</td></tr>
</table>

Fuente: Elaboración propia

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): **LOTE 7 - ZONA SUR-OCCIDENTE.**

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, los precios cotizados en la oferta económica y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2025 corresponde al 12 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 30 de Noviembre de 2021; desde la SDM-DTI-SS se asignó a través del Contrato de Interventoría SDM-2021-2018 la implementación de los IDs relacionados en la **Tabla *2***, el Corredor vial de la Autopista Sur desde KR 77C Sur hasta KR 52 Sur Fase 1, Autopista Sur entre Carrera 52 y Carrera 39 Fase 2, ciclorruta en calzada de la Av. Suba, (calzada sur Carrera 91 hasta Avenida Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera 85) y el Lote No. 4 para el proyecto Estacionamiento en Vía que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento sobre las vías de estos proyectos.

Tabla 2. Relación ID diseños asignados para implementación a fecha 30 de Noviembre de 2021

ÍTEM	FECHA DE ASIGNACIÓN INTERVENTORÍA	ID	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
1	12/08/2021	EX_07_205_1244_11	Liceo Moderno Betania	KR 87 con CL 51B-36 Sur	Bosa
			Jardín Infantil Universo Mágico de los Exploradores	KR 86F No. 51B-04 Sur	
2	12/08/2021	EX_07_038_1561_10	Colegio Carlos Pizarro	CL 73 Sur entre KR 100 y KR 104	Bosa
			Jardín Infantil Pasitos de Gigante	KR 99 A No. 71 Sur – 39	
3	12/08/2021	EX_07_207_1244_11	Colegio Liceo Mixto Los Centauros	KR 87M No. 61A – 84 Sur	Bosa
4	12/08/2021	EX_19_219_1867_12	Colegio Distrital Ismael Perdomo, Instituto Orestes Sindici	KR 71 F entre DG 62G Sur hasta CL 64A S	Ciudad Bolívar
5	12/08/2021	EX_19_386_1561_10	Colegio Rogelio Salmona	CL 66 Sur con CL 59	Ciudad Bolívar
6	12/08/2021	MV_19_080_1561_10_V7	Colegio Rural Pasquilla IED Sede Bachillerato	TV 3 No. 3 – 19	Sumapaz
			Colegio Rural Pasquilla Sede Primaria	CL 4 No. 2 – 18	Sumapaz

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ÍTEM	FECHA DE ASIGNACIÓN INTERVENTORÍA	ID	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
			Colegio Rural Pasquilla IED Sede C - Km 13 vía Pasquilla	km 13 Vía Pasquilla	Sumapaz
7	24/08/2021	MV_19_173_1244_11_V12	Corredor Autopista Sur - Fase 1	Corredor Autopista Sur desde KR 77C Sur hasta KR 52	Bosa Ciudad Bolívar
8	17/09/2021	EX_19_220_1867_12	Ciudad de Montreal	KR 17B No. 64B – 45 Sur	Ciudad Bolívar
9	17/09/2021	MV_19_175_1244_11	IED Santa Bárbara	Sede A: Carrera 18 T No. 65A – 27 Sur	Ciudad Bolívar
10	17/09/2021	EX_07_218_1867_12	IED Alfonso Reyes Echandia	KR 86 No. 74 – 00 Sur	Bosa
11	17/09/2021	MV_07_293_943_10	IED Luis López de Mesa	CL 65H No. 78A – 03 Sur	Bosa
12	17/09/2021	CPS_937_ZE_07_200	IED Nuevo Chile	CL 56 Sur No. 72G – 20	Bosa
13	17/09/2021	MV_19_292_1561_10	IED Villamar	Sede A: KR 18 M No. 69J-25 Sur Sede B: CL 68 D Sur No. 18Z–18 Sede C: CL 69I Sur No. 18M – 09	Ciudad Bolívar
14	27/09/2021	EX_07_208_1244_11	IED Kimi Pernía Domicó	CL 82 Sur No. 89 - 21	Bosa
15	27/09/2021	EX_07_204_1244_11	IED Brasilia	CL 53 Bis Sur No. 87 - 08	Bosa
16	27/09/2021	EX_07_231_1867_12	IED El Porvenir	CL 51 Sur No. 91D - 56	Bosa
17	27/09/2021	EX_07_011_1561_10	IED Villas del Progreso	KR 102A No. 56F - 34 Sur	Bosa
18	21/10/2021	EX_19_148_1244_11	Colegio Distrital María Mercedes Carranza	CL 66 y CL 67 entre KR 71 y KR 72 y TV 70G entre CL 66 y CL 63A Sur - TV 70G No. 65-02 Sur	Ciudad Bolívar
19	21/10/2021	EX_19_193_1867_12	Solicitud de reductores de velocidad, mantenimiento señalización	Calle 62 Sur No. 19BSur	Ciudad Bolívar
20	21/10/2021	MV_19_175_1244_11	Colegio Santa Bárbara - Jardín Infantil Los Robles	Colegio Santa Bárbara IED Sede B - CL 69 S #18 C-65, Jardín Infantil Los Robles - CL 66C Sur # 18Y-03	Ciudad Bolívar
21	21/10/2021	EX_19_371_1561_10	Colegios IED Ciudad Bolívar y el Colegio El Nogal	Transversal 54 con Diagonal 70 Sur	Ciudad Bolívar
22	19/11/2021	MV_19_080_1561_10_V7	Varias Zonas de Influencia	Varias Zonas de Influencia	Sumapaz
23	03/11/2021	MV_11_352_1236_11_V7	Ciclorruta en calzada de la Av. Suba, calzada sur Carrera 91 hasta Avenida Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera 85	Ciclorruta en calzada de la Av. Suba, calzada sur Carrera 91 hasta Avenida Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera 85	Suba
24	10/11/2021	MV_07_293_943_10_V13	Transversal 80I entre Calle 86 Sur y límite con Soacha	Transversal 80I entre Calle 86 Sur y límite con Soacha	Bosa
25	18/11/2021	EX_19_342_943_10_V5	CL 59C Sur y CL 58A Sur entre AK 51 y KR 38	CL 59C Sur y CL 58A Sur entre AK 51 y KR 39	Ciudad Bolívar
26	22/11/2021	EX_02_038_1556_10_V16	Lote No. 4 para el proyecto Estacionamiento en Vía	Lote No. 4 para el proyecto Estacionamiento en Vía	Chapinero

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ÍTEM	FECHA DE ASIGNACIÓN INTERVENTORÍA	ID	NOMBRE PROYECTO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
27	23/11/2021	EX_19_142_1244_11_V8	AC 61 Sur y CL 64 Sur entre KR 22F y KR 45	AC 61 Sur y CL 64 Sur entre KR 22F y KR 46	Ciudad Bolívar
28	23/11/2021	MV_19_178_1244_11_V8	Av. Villavicencio entre KR 47A y KR 45C	Av. Villavicencio entre KR 47A y KR 45C	Ciudad Bolívar
29	23/11/2021	MV_19_173_1244_11_V12	Autopista Sur entre Carrera 52 y Carrera 39	Autopista Sur entre Carrera 52 y Carrera 39	Puente Aranda, Antonio Nariño, Tunjuelito

Fuente: Elaboración propia

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista corresponden a 28 IDs asignados, 23 IDs inspeccionados, 7 IDs en implementación, 09 IDs implementados y 5 IDs pendientes por Inspección conforme a la información relacionada en la **Tabla *3***, de conformidad con lo consagrado en el Anexo Técnico SDM-LP-033-2021 donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.

Tabla 3. Relación ID diseños asignados y ejecutados a fecha 30 de Noviembre de 2021

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN					
ESTADO	**DISEÑOS NORMALES**	**SUMINISTROS**	**MEDIDAS DE GESTIÓN**	**COMPROMISOS PRIORITARIOS**	**EMERGENCIAS**
Asignados	28	2	0	33	1
Inspeccionados	23	0	0	26	1
No se ejecutan	4	0	0	4	0
En implementación	7	1	0	1	1
Implementados	9	1	0	7	0
Pendientes por inspección	5	0	0	7	0

Fuente: Contrato de Interventoría 2021-2018

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla 4. Relación ID diseños en ejecución a fecha 30 de Noviembre de 2021

IDS EN EJECUCIÓN					
ID Diseño	**Proyecto**	**Dirección**	**Localidad**	**UPZ**	**Estado**
MV_19_173_1244_11_V12	Autopista Sur Fase 1	Autopista Sur	Bosa	Bosa Central	En ejecución
EX_02_038_1556_10_V16	Estacionamiento en vía	Desde CL 84BIS y CL 77 entre KR 15 Y KR 11	Chapinero	Chico Lago	En ejecución
CPS_937_ZE_07_200	IED Nuevo Chile	Entre KR 73A hasta KR 72C y desde CL 54A Sur hasta CL 56B Sur	Bosa	Apogeo	En ejecución
EX_07_011_1561_10_V9	Gimnasio Enrique Dussel	Desde la KR 103A hasta KR 100A entre CL 59 Sur Y CL 56F Sur	Bosa	El Porvenir	En ejecución
EX_07_204_1244_11_V3	Centro Educativo Distrital Brasilia Bosa	Desde KR 87D hasta KR 88 entre DG 54 Sur hasta CL 50B Sur	Bosa	Bosa Occidental	En ejecución
MV_11_352_1236_11_V7	Cicloruta en calzada Avenida Suba	Calzada sur Carrera 91 hasta Avenida Calle 127 y calzada norte Calle 128B hasta Carrera 85	Suba	La Alhambra Los Andes Niza La Floresta	En ejecución
EX_19_220_1867_12_V2	Colegio Ciudad de Montreal IED	Desde DG 64A Bis Sur hasta CL 66 Sur y desde KR 17G hasta TV 17	Ciudad Bolívar	Lucero	En ejecución
EX_19_148_1244_11_V3	Colegio Distrital María Mercedes Carranza	KR 73D a KR 72 X CLL 63 Sur a CLL 64 Sur	Ciudad Bolívar	Ismael Perdomo	En Ejecución

Fuente: Contrato de Interventoría 2021-2018

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2025, en donde se registran los valores ejecutados durante el desarrollo del proyecto en el periodo del 12 de agosto de 2021 al 11 de Noviembre de 2021 con corte mensual a 30 de Noviembre de 2021.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla 5. Relación Avance proyecto contrato 2021-2025 periodo 12/08/2021 – 11/11/2021 con corte a 30 de Noviembre de 2021

VALOR EJECUTADO MENSUAL				
CUENTA	**VALOR VERTICAL**	**VALOR HORIZONTAL**	**VALOR TOTAL (Incluido A.I.U.)**	ESTADO
ACTA MES 1	$56.990.754	$279.588.752	$336.579.506	CANCELADO
ACTA MES 2	$102.663.244	$480.200.048	$582.863.292	CANCELADO
ACTA MES 3	$78.288.774	$445.946.185	$524.234.959	EN TRÁMITE

Fuente: Contrato de Interventoría 2021-2018

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, conforme a los cortes de obra aprobados por la Interventoría según la ejecución relacionada en el numeral anterior con corte al 30 de Noviembre de 2021.

En razón de lo anterior, en las siguientes tablas se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla 6. Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP
1224	23/02/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2021
12	12/03/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2022
13	12/03/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2022
12	12/03/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2023
13	12/03/2021	133011604490000007587	Maquinaria y Equipo	2023

CRP	FECHA	VALOR APROBADO POR VIGENCIA	VALOR TOTAL
1921	28/07/2021	$ 2,829,999,937.00	$ 2,829,999,937.00
20	28/07/2021	$ 7,499,519,218.00	$ 7,499,519,218.00
20	28/07/2021	$ 7,499,519,195.00	$ 7,499,519,195.00

Fuente: Elaboración propia

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

En la **Tabla 7** se presenta el estado de los cortes realizados, según la ejecución mostrada en la **Tabla 5**, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la **Tabla 6** "*Recursos asignados como vigencias futuras*".

Tabla 7. Cortes de Obra Vs Recursos asignados

MES EJECUTADO	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP INICIAL	SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	REGARANTÍA	VALOR PAGADO	FACTURA No.	FECHA
12 de agosto a 11 de Septiembre Mes 1	1921	2021	$ 2,829,999,937	$ 2,829,999,937	$ 336,579,506	$ 16,828,975	$ 336,579,506	CSV1	30/09/2021
12 de Septiembre a 11 Octubre Mes 2	1921	2021			$ 582,863,292	$ 29,143,165	$ 582,863,292	CSV002	30/10/2021
12 de Octubre a 11 de Noviembre Mes 3	1921	2021			$ 524.234.959	$ 26.211.748	$ 524.234.959	CSV003	30/11/2021

Fuente: Elaboración propia

La cuenta del periodo del 12 Octubre al 11 de Noviembre de 2021 a la fecha se encuentra en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

A continuación, y con corte al 30 de Noviembre de 2021, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 8. Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR CANCELADO	SALDO CRP	No. DE CUENTA
2021	1921	28/07/2021	$2,829,999,937	$336.579.506	$ 2.493.420.431	1
				$582.863.292	$1.910.557.139	2
				$524.234.959	$1.386.322.180	3
2022	20	28/07/2021	$7,499,519,218	$0.00	$ 7,499,519,218	
2023	20	28/07/2021	$7,499,519,195	$0.00	$ 7,499,519,195	

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con lo anterior, en la **Tabla *9*** se muestra el análisis financiero a corte del 30 de Noviembre de 2021 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla 9. Estado del Contrato con corte al 30 de Noviembre de 2021

ÍTEM	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	$ 16.909.595.552.00
2	Valor Ejecutado	$1.443.677.757.00
3	Saldo por Ejecutar	$15.465.917.795.00
4	Valor pagado	$919.442.798.00
5	Saldo CRP 1921	$1.386.322.180.00
6	Saldo CRP 20	$7,499,519,218.00
7	Saldo CRP 20	$7,499,519,195.00

Fuente: Elaboración propia

La cuenta del periodo del 12 Octubre al 11 de Noviembre de 2021 a la fecha se encuentra en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de Noviembre de 2021, en el Marco del Contrato SDM-2021-2025 se realizó implementación de los componentes de señalización vertical y horizontal de los IDs relacionados en la **Tabla 5** localizados en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, Suba y Chapinero.

Se continua con la implementación de señalización de los IDs y CPs asignados en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Sumapaz, el corredor de la Autopista Sur, Ciclorruta en Calzada de la Av. Suba y Lote 4 Estacionamiento en vía en la localidad de Chapinero.

Al corte del 30 de Noviembre de 2021, se han realizado dos pagos de la primera y segunda cuenta de cobro del contrato de obra 2021-2025 por valor de $ 919.442.798.00 y se encuentra en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad un tercer pago por valor de $524.234.959.00

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195
