SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2022
CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2569

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de mayo de 2022 del Contrato de Obra SDM 2021-2569 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el LA UNIÓN TEMPORAL SEÑALIZANDO ZONA NORTE y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - ZONA NORTE"**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución 01 de mayo al 30 de mayo de 2022 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-2569 con Interventoría SDM-2021-2012 (JOYCO SAS. BIC.) para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

- Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2569 del 01 de mayo al 30 de mayo de 2022, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

- Relacionar el estado financiero del proyecto del 01 de mayo al 30 de mayo de 2022, relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2569

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizadas en la ejecución del contrato del 01 de mayo al 30 de mayo de 2022:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 1 Datos del Contrato

CONTRATO No.	SDM-2021-2569
OBJETO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - ZONA NORTE"
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP N° 2672 del 07 de octubre de 2021 -$ 2.249.886.492 vigencia del 2021 CDP N° 30 del 29 de septiembre de 2021 - $ 7.499.519.218 vigencia del 2022 CDP N° 30 del 29 de septiembre de 2021 - $ 7.499.519.195 vigencia del 2023
CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**CRP No** 2593 Rubro 133011604490000007587 de 13 de diciembre de 2021 por valor: ($2.249.886.492) **CRP No** 38, Rubro 133011604490000007587 de 13 de diciembre de 2021 por valor: ($7.499.477.768) **CRP No** 38, Rubro 133011604490000007587 de 13 de diciembre de 2021 por valor: ($5.249.674.077)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	El valor del Contrato es por la suma de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($14.999.038.337) suma que incluye: IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTICUATRO (24) MESES, contados a partir del acta de inicio.
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de enero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de enero de 2024
CONTRATISTA:	LA UNIÓN TEMPORAL SEÑALIZANDO ZONA NORTE
IDENTIFICACION:	NIT: 901.546.189-9
INTERVENTORIA	JOYCO SAS. BIC., CONTRATO SDM-2021-2012

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP-107-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): **LOTE 1- ZONA NORTE.**

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

4. AVANCE DEL PROYECTO

Se realizará las actividades inherentes a la implementación de señalización vial a través del contrato de obra 2021-2569, el cual se desarrollará en las localidades de Usaquén y Suba que se muestran de forma esquemática en la Ilustración 1.

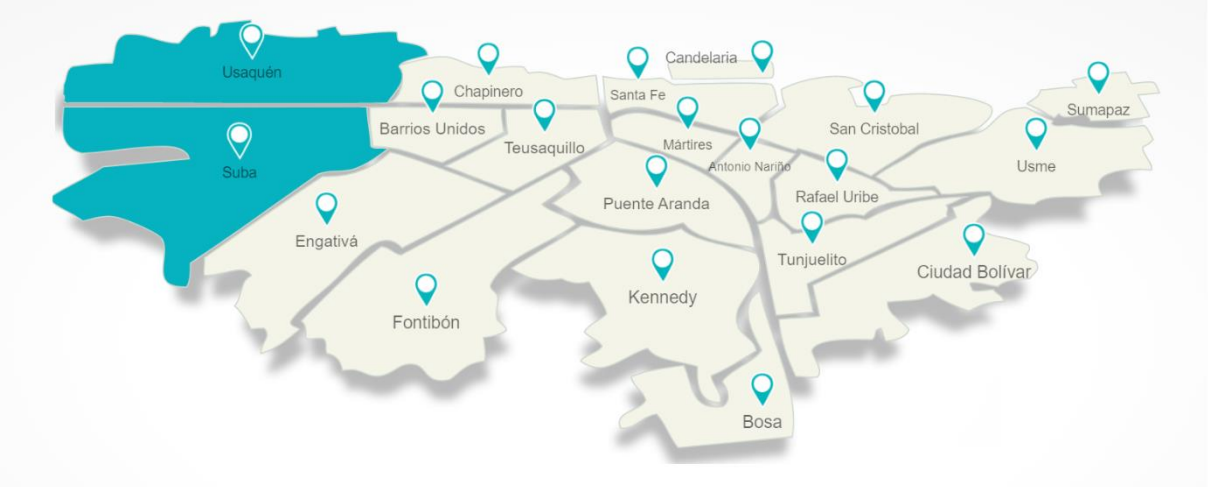

Las actividades relacionadas con el objeto del proceso serán ejecutadas en la ciudad Bogotá D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación y donde se requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren a cargo de la Entidad.

No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 1 Anexo N.º 1 – Anexo Técnico Definitivo, Durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de la zona. Así mismo, es responsabilidad del contratista la señalización de las vías limítrofes de la zona asignada.

Para todos los efectos la Secretaría Distrital de Movilidad se reserva el derecho de intervención, el cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (director de Ingeniería de Tránsito) y el subdirector Técnico de Señalización, con el correspondiente seguimiento por parte de la interventoría y el acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría Distrital de Movilidad para el contrato de interventoría.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2569 correspondiente al 26 de enero de 2022 y de acuerdo con el corte mensual a 26 de abril al 25 de mayo de 2022 (cuarto corte mensual), desde la SDM-DTI-SS se asignó a través del Contrato de Interventoría SDM-2021-2012 la implementación de los diseños relacionados en la Tabla No. 2 que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento.

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y la interventoría se relacionan a continuación, indicando estado de inspecciones y diagnósticos preliminares de conformidad con lo consagrado en los anexos técnicos SDM-LP-107-2021 y SDM-CMA-039-2021, correspondientes a los contratos de obra e interventoría, respectivamente, donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.

Tabla No. 2 – Diseños asignados para implementación con el contrato 2021-2569 (Zona Norte) CTO Interventoría 2021-2012

ID Diseño	Dirección	Estado	No. CP	Avance de ejecutado %
PMT emergencia	CL 129C entre Carreras 99A y 100_ Suba	TERMINADO	Emergencia	100%
ZE_01_326_1236_11	el cual corresponde a la calle 192 entre Carrera 8B y Carrera 19.	IMPLEMENTACION	Diseño Normal	99%
EX_12_007_1249_11_V9	Av. Suba Se debe implementar lo correspondiente a la señalización que se encuentra dentro de la polilínea color rojo.	INSPECCIONADO	Diseño Normal	0%
MV_11_352_1236_11	Av. Suba Se debe implementar la totalidad del corredor, excepto la zona dentro de la polilínea color magenta, la cual ya está siendo intervenida por el contrato de la zona 7	EN EJECUCION	Diseño Normal	20%
EM_12_140_V6	Av. Suba Se debe implementar lo correspondiente a la señalización que se encuentra dentro de la polilínea color rojo.	INSPECCIONADO	Diseño Normal	0%
CP 11-317	(IMPLEMENTACIÓN) - Av. Suba-Cota (entre KR 92 y Río Bogotá)	TERMINADO	Emergencia	100%
EX_11_388_1842_12_V2	EL RINCON el cual corresponde a la actualización realizada parcialmente y está resaltada la zona de influencia en color rojo, por favor verificar la versión 2, las planchas de la 1 a la 18	EN EJECUCION	Diseño Normal	100%
EX_02_038_1556_10	Estacionamiento en vía	TERMINADO	Compromiso Prioritario	100%
EX_02_202_1881_12	Estacionamiento en vía	TERMINADO	Compromiso Prioritario	100%
MV_01_032_945_10	Autopista Norte	EN EJECUCION	Diseño Normal	20%
EX_11_422_1842_12_V2	LA ALHAMBRA el cual corresponde a implementar el área dentro de la polilínea de color rojo. Por favor dar prioridad al iniciar las actividades de implementación en las zonas escolares que contiene este proyecto	EN EJECUCION	Diseño Normal	20%

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ID Diseño	Dirección	Estado	No. CP	Avance de ejecutado %
EX_11_364_1236_11_V2	Desde la SDM se asigna el diseño EX_11_364_1236_11_V2 el cual corresponde a implementar el área dentro de la polilínea de color rojo. Por favor dar prioridad al iniciar las actividades de implementación en las zonas escolares que contiene este proyecto. De las zonas que deben ser implementadas debemos asignar mayor prioridad a los siguientes sectores: Carrera 99 con calle 154-26 y Carrera 99 con calle 155-11 (Colegio Juan Lozano Lozano) Calle 156 A # 98-46 (Colegio Gimnasio Infantil) Carrera 98 #156 B -10 (Jardín Juego de Colores) - Solo implementar señalización vertical en el segmento vial. Carrera 97 B # 156 B -42, Calle 157 A # 98 A - 20 Carrera 99 entre Calle 153 y Calle 159 Calle 156A entre Carrera 97 B y Carrera 99 Carrera 97 B entre Calle 156A y Calle 157A Calle 157A entre Carrera 98 y Carrera 99 Carrera 98 entre Calle 155D y Calle 157A - Solo implementar señalización vertical en el segmento vial.	EN INSPECCION	Diseño Normal	0%
EX_01_343_1842_12_V4	(Diseño completo). De las zonas que deben ser implementadas se debe dar mayor prioridad a la zona escolar de la Carrera 16 No.134 A- 81.	EN EJECUCION	Diseño Normal	20%
EX_01_107_1794_10_V5	Bella Suiza (Diseño completo), este diseño se encuentra como propuesta para presentar en el Consejo Distrital de Gobierno que se desarrolla con la Alcaldía Mayor, el cual debe tener una implementación del 95% para el día 24 de marzo	EN EJECUCION	Diseño Normal	100%
MV_01_355_988_09_V3	San Andresito del Norte (Diseño completo). De las zonas que deben ser implementadas se debe dar mayor prioridad al tramo vial de la Carrera 21 entre Calle 195 y Calle 197, este tramo debe tener una implementación del 95% para el día 24 de marzo	EN EJECUCION	Diseño Normal	80%
PASACALLES	Pasacalles Pico y Placa Regional	TERMINADO	Emergencia	100%
EX_02_195_1881_12_V7	Estacionamiento en vía 2	NO EJECUTAR	Compromiso Prioritario	-
EX_01_341_1842_12_V4	ALCALA (Polilínea Roja). De las zonas que deben ser implementadas se debe dar mayor prioridad al tramo vial de la Carrera 20 entre Calle 136 y Calle 137	EN EJECUCION	Diseño Normal	90%
MV_02_335_946_10_V13	Corredor de Avenida Circunvalar polígono rojo entre calle 85 y peaje la calera	EN EJECUCION	Compromiso Prioritario	25%
MV_03_010_V25	Corredor de Avenida Circunvalar polígono rojo versión 25	EN EJECUCION	Compromiso Prioritario	98%
Suministro	SUMINISTRO SE ENTREGA PARCIALMENTE EL VIERNES	ENTREGADO	Suministro	75%
EX_01_351_1842_12_V9	Estacionamiento en vía 3	NO EJECUTAR	Diseño Normal	-

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ID Diseño	Dirección	Estado	No. CP	Avance de ejecutado %
MV_01_318_1236_11_V3	Estacionamiento en vía 3	NO EJECUTAR	Diseño Normal	-
EX_01_340_1842_12_V4	Asignación Plazoleta Verbenal	PARA INSPECCIONAR	Diseño Normal	0%
MV_01_019_1560_10	Estacionamiento en vía 4 EN CL 109 ENTRE KR 15 Y KR 18C	INSPECCIONADO	Compromiso Prioritario	1%
EX_01_298_1236_11_V5	Estacionamiento en vía 4 EN KR 17 Y KR 21 Y CL 106 Y CL 104	INSPECCIONADO	Compromiso Prioritario	1%
EX_11_319_1236_11_V7	CL 109 ENTRE KR 15 Y KR 18C	EN INSPECCION	Diseño Normal	0%
EX_11_415_1842_12_V1	LA AC 191 HASTA LA AC 183 ENTRE LA KR 57A Y LA AK 45	EN INSPECCION	Diseño Normal	0%

Tabla No. 3 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2569

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
26 de abril al 25 de mayo de 2022	MV_02_335_946_10_V13.	Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal
26 de abril al 25 de mayo de 2022	MV_11_352_1236_11	Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal
26 de abril al 25 de mayo de 2022	MV_03_010_V25	Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal
26 de abril al 25 de mayo de 2022	EX_11_388_1842_12_V2	Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal
26 de abril al 25 de mayo de 2022	EX_107_1794_10_V5	Para el presente periodo se realizó Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas. Se realizó Señalización horizontal
26 de abril al 25 de mayo de 2022	EX_01_343_1842_12	Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal
26 de abril al 25 de mayo de 2022	EX_11_422_1842_12	Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal
26 de abril al 25 de mayo de 2022	MV_01_355_988_09_V3	Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal
26 de abril al 25 de mayo de 2022	EX_01_341_1842_12_V4	Para el presente periodo se realizó Señalización horizontal

Fuente: Informe Mensual Contrato de Interventoría 2021-2012

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2569, donde se registran las cantidades de elementos de señalización instalados durante el desarrollo del proyecto con el cuarto corte mensual:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Fuente: Acta Parcial No. 1 – Contrato 2021-2569 (Obra)

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2022			ACTA N° 4	
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ACTA	VR. ACTA
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	39	$ 376.803	$ 14.695.317	29,88	$ 11.257.329
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	23	$ 177.121	$ 4.073.783	2,00	$ 354.242
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UND	104	$ 204.853	$ 21.304.712	54,00	$ 11.062.062
4	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría ó informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, poste de tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 1,9 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120 cm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	UND	217	$ 475.185	$ 103.115.145	0,00	$ 0
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UND	217	$ 350.272	$ 76.009.024	59,00	$ 20.666.048
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UND	217	$ 522.931	$ 113.476.027	45,00	$ 23.531.895
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	75	$ 610.863	$ 45.814.725	20,00	$ 12.217.260
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2	84	$ 388.832	$ 32.661.888	0,59	$ 229.411
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	100	$ 583.037	$ 58.303.700	0,00	$ 0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2022			ACTA N° 4	
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ACTA	VR. ACTA
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo cumpliendo con normatividad vigente.	UND	54	$ 436.343	$ 23.562.522	3,00	$ 1.309.029
11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en ángulo SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	UND	18	$ 731.107	$ 13.159.926	0,00	$ 0
12	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó Informativa de 90 cm, material reflectivoTipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo normatividad vigente.	UND	14	$ 513.282	$ 7.185.948	0,00	$ 0
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 40 x 50 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	27	$ 266.445	$ 7.194.015	0,00	$ 0
14	Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva horizontal de 76 x 50 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	53	$ 339.433	$ 17.989.949	0,00	$ 0
15	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Chevron) 90X40 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	5	$ 342.497	$ 1.712.485	0,00	$ 0
16	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Dol) 90X20 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	0	$ 261.437	$ 0	0,00	$ 0
17	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble TIPO SI26 - SR39/SR-38, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	2	$ 426.533	$ 853.066	0,00	$ 0
18	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 40x75 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	17	$ 308.668	$ 5.247.356	0,00	$ 0
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	21	$ 269.352	$ 5.656.392	5,00	$ 1.346.760

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2022			ACTA N° 4	
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ACTA	VR. ACTA
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente.	UND	28	$ 425.412	$ 11.911.536	0,00	$ 0
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UND	14	$ 467.201	$ 6.540.814	0,00	$ 0
22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	32	$ 106.371	$ 3.403.872	3,00	$ 319.113
23	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	16	$ 177.828	$ 2.845.248	0,00	$ 0
24	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	32	$ 215.282	$ 6.889.024	0,00	$ 0
25	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaría e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivotipo IV o superior, película antigraffiti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UND	9	$ 123.678	$ 1.113.102	0,00	$ 0
26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UND	24	$ 44.599	$ 1.070.376	5,00	$ 222.995
27	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)	UND	5	$ 19.272	$ 96.360	0,00	$ 0
28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	185	$ 23.703	$ 4.385.055	34,00	$ 805.902
29	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	10	$ 53.882	$ 538.820	0,00	$ 0
30	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	815	$ 1.094	$ 891.610	0,00	$ 0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2022			ACTA N° 4	
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ACTA	VR. ACTA
31	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	20527	$ 1.305	$ 26.787.735	10.857,81	$ 14.169.442
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	249	$ 1.679	$ 418.071	350,69	$ 588.809
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	3646	$ 1.897	$ 6.916.462	681,81	$ 1.293.394
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	8672	$ 9.411	$ 81.612.192	7.120,60	$ 67.011.967
35	Suministro y Aplicación de Pintura de tráfico base agua negra m2. espesor seco 9 mils y 60% de solidos por volumen	M2	1089	$ 16.615	$ 18.093.735	0,00	$ 0
36	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen	ML	2951	$ 1.862	$ 5.494.762	10.857,81	$ 20.217.242
37	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen	ML	382	$ 2.235	$ 853.770	350,69	$ 783.792
38	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen	ML	248	$ 2.908	$ 721.184	559,51	$ 1.627.055
39	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	762	$ 20.532	$ 15.645.384	0,00	$ 0
40	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	52	$ 17.874	$ 929.448	0,00	$ 0
41	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas viales sin microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	106	$ 19.421	$ 2.058.626	0,00	$ 0
42	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	6505	$ 1.517	$ 9.868.085	0,00	$ 0
43	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen	ML	2168	$ 1.873	$ 4.060.664	0,00	$ 0
44	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	1083	$ 2.471	$ 2.676.093	0,00	$ 0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2022			ACTA N° 4	
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ACTA	VR. ACTA
45	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales con microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	726	$ 17.673	$ 12.830.598	0,00	$ 0
46	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	726	$ 16.341	$ 11.863.566	0,00	$ 0
47	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	701	$ 17.669	$ 12.385.969	0,00	$ 0
48	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	ML	2197	$ 1.616	$ 3.550.352	0,00	$ 0
49	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua marcas viales sin microesfera de demarcación de bahías, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M2	544	$ 20.527	$ 11.166.688	0,00	$ 0
50	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 12 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	3629	$ 9.614	$ 34.889.206	0,00	$ 0
51	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	3629	$ 11.944	$ 43.344.776	0,00	$ 0
52	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 20 cm, para líneas de demarcación, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	ML	363	$ 15.683	$ 5.692.929	0,00	$ 0
53	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, sin microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	181	$ 79.471	$ 14.384.251	0,00	$ 0
54	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, con microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	181	$ 85.288	$ 15.437.128	0,00	$ 0
55	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	ML	2539	$ 4.307	$ 10.935.473	0,00	$ 0
56	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	2164	$ 6.866	$ 14.858.024	0,00	$ 0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2022			ACTA N° 4	
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ACTA	VR. ACTA
57	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	2981	$ 8.507	$ 25.359.367	0,00	$ 0
58	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	1588	$ 42.151	$ 66.935.788	0,00	$ 0
59	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	390	$ 38.200	$ 14.898.000	0,00	$ 0
60	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	2297	$ 6.278	$ 14.420.566	0,00	$ 0
61	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	391	$ 7.416	$ 2.899.656	0,00	$ 0
62	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	ML	91	$ 9.317	$ 847.847	0,00	$ 0
63	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	121	$ 55.221	$ 6.681.741	0,00	$ 0
64	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	10	$ 52.563	$ 525.630	0,00	$ 0
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	1896,00	$ 77.172	$ 146.318.112	2.531,36	$ 195.350.114
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	172	$ 74.513	$ 12.816.236	1.631,62	$ 121.576.901
67	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	984	$ 76.723	$ 75.495.432	0,00	$ 0
68	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	M2	7537	$ 2.875	$ 21.668.875	2.897,33	$ 8.329.809

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2022			ACTA N° 4	
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ACTA	VR. ACTA
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	3633	$ 8.874	$ 32.239.242	90,00	$ 798.660
70	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	5489	$ 10.127	$ 55.587.103	378,00	$ 3.828.006
71	Suministro e instalación de estoperoles plásticos de 10 cm de diámetro y 2 cm de altura (NTC 4745)	UND	2834	$ 5.937	$ 16.825.458	0,00	$ 0
72	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	UND	8460	$ 7.007	$ 59.279.220	8.044,00	$ 56.364.308
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	UND	2213	$ 12.518	$ 27.702.334	11.669,00	$ 146.072.542
74	Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	104	$ 50.780	$ 5.281.120	0,00	$ 0
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	131	$ 59.298	$ 7.768.038	237,00	$ 14.053.626
76	Suministro y anclaje de bordillo traspasable metálico de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	72	$ 80.225	$ 5.776.200	0,00	$ 0
77	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	321	$ 137.274	$ 44.064.954	0,00	$ 0
78	Suministro e instalación de Boya metálica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base)	UND	2	$ 52.287	$ 104.574	0,00	$ 0
79	Suministro e instalación de Boya plástica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 10 cm de altura y 24 cm de base)	UND	2	$ 48.740	$ 97.480	0,00	$ 0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2022			ACTA N° 4	
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ACTA	VR. ACTA
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	267	$ 58.721	$ 15.678.507	26,00	$ 1.526.746
81	Suministro e instalación de delineador de corona (hitos de arista) construido en material sintético flexible de color blanco, franja negra y material retroflectivo tipo XI (Tipo "A", fijado en concreto, altura mínima de 75 cm y máxima de 120 cm de acuerdo con la figura 5-2 y 5-3 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación. 8 (SEGUN DISEÑO)	UND	5	$ 114.441	$ 572.205	0,00	$ 0
82	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 1 cm de altura, construida con gravilla MONA 2 1/2 pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	9	$ 299.207	$ 2.692.863	0,00	$ 0
83	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	129	$ 321.138	$ 41.426.802	124,23	$ 39.894.974
84	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	54	$ 341.110	$ 18.419.940	0,00	$ 0
85	Suministro y anclaje de banda alertadora en resina con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 25 cm y altura máxima de 2 cm. Incluye materiales para la fijación.	ML	29	$ 481.649	$ 13.967.821	0,00	$ 0
86	Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	ML	94	$ 229.725	$ 21.594.150	0,00	$ 0
87	Suministro e instalación de hito de vértice en resina poliéster de color azul con alta resistencia al impacto y material retrorreflectivo tipo XI en la parte superior (Tipo semicilindrico con incrustación al pavimento, altura máxima de 1,20 m a 1,35 m, , ancho de 1,0 m a 1,2 m de acuerdo con la figura 5-13 Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	0	$ 2.201.362	$ 0	0,00	$ 0
88	Suministro e instalación de Baliza iluminada elevada (luz intermitente de color amarillo) dimensiones de acuerdo con la figura 6.1-4 de resolución 1885 de 2015.	UND	3	$ 247.665	$ 742.995	0,00	$ 0
89	Suministro, instalación y lastrado (con material granular mínimo a ¼ de su altura) de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo XI color blanco, incluye transportes, instalación y lastrado.	UND	12	$ 515.694	$ 6.188.328	0,00	$ 0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2022			ACTA N° 4	
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ACTA	VR. ACTA
90	Suministro, instalación y lastrado (con material granular al tope de su altura) de delineador Tubular Tipo Canalizador de 140 cm de altura, incluye transportes, instalación y lastrado con material granular al tope de su altura.	UND	14	$ 53.604	$ 750.456	0,00	$ 0
91	Suministro e instalación de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	ML	93	$ 98	$ 9.114	0,00	$ 0
92	Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	M2	64	$ 106.318	$ 6.804.352	0,00	$ 0
93	Suministro e instalación de cierre con polisombra al 65% mixta (azul traslucido-verde) de altura 2,1 metros.	M2	2	$ 17.182	$ 34.364	0,00	$ 0
94	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UND	76	$ 6.146	$ 467.096	0,00	$ 0
95	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UND	585	$ 2.209	$ 1.292.265	0,00	$ 0
96	Retiro de bandas en agregado.	M2	5	$ 11.942	$ 59.710	0,00	$ 0
97	Retiro de pasacalle, incluye transporte a patios de la SDM	UND	2	$ 35.486	$ 70.972	0,00	$ 0
98	Desmonte y retiro a nivel de Estructura metálica, tableros y/o lamas existentes de señales con pedestal de 4" a 12" de diámetro, Incluye transporte a patios de la SDM	UND	1	$ 1.120.720	$ 1.120.720	0,00	$ 0
99	Limpieza con hidrolavado	UND	71	$ 8.052	$ 571.692	0,00	$ 0
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	98	$ 33.223	$ 3.255.854	1.996,02	$ 66.313.772
101	Transporte de materiales	TON	200	$ 36.509	$ 7.301.800	0	$ 0
102	Suministro e instalacion de material granular (recebo)para lastrado de dispositivos de señalizacion (incluye transporte)	M3	87	$ 177.388	$ 15.432.756	0	$ 0
103	Suministro e instalación de resalto trapezoidal o pompeyano, material con alta resistencia al impacto, largo min 2,5 m, 2 rampas de acceso largo 1 m pendiente 15% máx. y altura 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-26 Resolución 1885 de 2015). (Por metro de ancho vial)	M2	1	$ 3.641.222	$ 3.641.222	0	$ 0
104	Suministro e instalación de marcador cilíndrico o hito tubular, color amarillo, material sintético flexible, dos bandas de min 10 cm en material reflectivoblanco tipo IV o superior, altura entre 70 y 80 cm, diámetro 20 cm (figura 5-10 Resolución 1885 de 2015), incluye elementos de sujeción	UND	111	$ 73.495	$ 8.157.945	0	$ 0
105	Suministro e instalación resalto parabólico y circular, material con alta resistencia al impacto, largo entre 3,7 y 6,7 m y altura máx. 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-27 Resolución 1885 de 2015) (por metro de ancho vial)	M2	2	$ 3.281.674	$ 6.563.348	0	$ 0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2022			ACTA N° 4	
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ACTA	VR. ACTA
106	Suministro e instalación resalto tipo cojín en caucho con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción)	M2	0	$ 3.733.788	$ 0	0	$ 0
107	Suministro e instalación resalto tipo cojín en plástico con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción)	M2	3	$ 4.081.304	$ 12.243.912	0	$ 0
108	Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,2 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.1-1 imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 2015)	UND	1	$ 11.200.055	$ 11.200.055	0	$ 0
109	Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,5 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.1-1 imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 2015)	UND	0	$ 24.079.441	$ 0	0	$ 0
110	Suministro e instalación caneca vial de señalización en PVC o similar, color naranja, cuatro franjas horizontales (2 blancas, 2 naranja de material reflectivo tipo IV o superior), altura 140 cm, figura 4-17 Resolución 1885 de 2015	UND	2	$ 380.066	$ 760.132	0	$ 0
111	Baliza destellante de color amarillo, de acuerdo con la figura 3-40 de Resolución 1885 de 2015.	UND	9	$ 173.138	$ 1.558.242	0	$ 0
112	Tope vehicular vertical, material con alta resistencia al impacto, altura min 60 cm con una banda de 15 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, diámetro min 60 mm (figura 5-21 Resolución 1885 de 2015), incluye elementos de sujeción	UND	2	$ 54.061	$ 108.122	0	$ 0
113	Islas peatonales ancho min 1,8 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.1-1 imagen 1 o 3 Resolución 1885 de 2015)	UND	0	$ 25.233.446	$ 0	0	$ 0
114	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mils	M2	39	$ 244.274	$ 9.526.686	0	$ 0
115	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 125 mils	M2	39	$ 270.024	$ 10.530.936	0	$ 0
116	Hito luminoso, con sistema de iluminación interno, luz continua, blanco o amarillo, altura de 70 cm, ancho mín. 30 cm (figura 5-14 resolución 1885 de 2015) provisto de un sistema de energización	UND	6	$ 1.088.081	$ 6.528.486	0	$ 0
117	Suministro e instalación tachas iluminadas bidireccionales internamente (luz continua)	UND	176	$ 244.316	$ 42.999.616	0	$ 0
118	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 90 mils	M2	188	$ 227.202	$ 42.713.976	0	$ 0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2022			ACTA N° 4	
			CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT. ACTA	VR. ACTA
119	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 125 mils	M2	72	$ 274.221	$ 19.743.912	0	$ 0
120	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 90 mils	M2	49	$ 260.853	$ 12.781.797	0	$ 0
121	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 125 mils	M2	36	$ 302.728	$ 10.898.208	0	$ 0
122	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 90 mils	M2	36	$ 252.919	$ 9.105.084	0	$ 0
123	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 125 mils	M2	36	$ 289.931	$ 10.437.516	0	$ 0
124	Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para paso vehicular de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina epóxica.	M2	624,168	$ 307.517	$ 191.942.330	0	$ 0
125	Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para ciclorrutas; de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina epóxica.	M2	363	$ 212.728	$ 77.220.264	0	$ 0
			VALOR TOTAL		**$ 2.249.886.492**	VALOR TOTAL ACTA 4	**$ 843.123.204**
			AIU (33,40%)		**$ 563.314.908,72**	AIU (33,40%)	**$ 211.096.814**
			VALOR BASICO		**$ 1.686.571.583**	VALOR BASICO ACTA 9	**$ 632.026.390**
			ANTICIPO		**$0**	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ -
					$ 2.249.886.492,00	**RETENCIÓN 5%**	**$ 42.156.160**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	COSTO DIRECTO	SUBTOTAL	CANT. ACTA	SUBTOTAL
1S	Suministro de cono vial construido en material sintético flexible con tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura 90 cm.	UND	143	$ 78.455	$ 11.219.065		$ -

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	COSTO DIRECTO	SUBTOTAL	CANT. ACTA	SUBTOTAL
2S	Suministro de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color blanco.	UND	72	$ 332.596	$ 23.946.912		$ -
3S	Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 140 cm de altura.	UND	43	$ 32.063	$ 1.378.709		$ -
4S	Suministro de Resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm.	ML	7	$ 144.003	$ 1.008.021	3	$ 432.009
5S	Suministro de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	ROLLO	22	$ 32.472	$ 714.384	108	$ 3.506.976
6S	BARRICADA, ANCHO 2,4 M, 3 LISTONES DE 20 CM DE ANCHO EN MATERIAL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR (BLANCO Y NARANJA), ALTURA MIN 1,5M, FIGURA 4-15 RESOLUCIÓN 1885 DE 2015	UND	1	$ 392.684	$ 392.684		$ -
7S	SEÑAL PARE/SIGA EN PAPEL RETROREFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR (30 CM)	UND	29	$ 52.955	$ 1.535.695	262	$ 13.874.210
8S	VALLA DE APERTURA TIPO A	UND	3	$ 395.069	$ 1.185.207		$ -
9S	DISPOSITIVOS LUMINOSOS TIPO FLASHER PARA CONO	UND	29	$ 71.700	$ 2.079.300		$ -
10S	BASTON LUMINOSO BICOLOR	UND	29	$ 97.807	$ 2.836.403	10	$ 978.070
11S	SEÑALES TEMPORALES SR- SP CON APOYO TRIPODE	UND	1	$ 360.302	$ 360.302		$ -
12S	DISPOSITIVOS LUMINOSOS TIPO FLASHER PARAVALLA PUESTO DE CONTROL	UND	3	$ 75.838	$ 227.514		$ -
13S	VALLA ROMPETRAFICO DE 0,80 X 1,20 MTS, CONSTRUIDA EN TUBO CUADRADO DE 1" C-18 Y LAMINA GALVANIZADA C-20 (APLICACIÓN Y EL USO DE LA MARCA CIUDAD)	UND	4	$ 447.819	$ 1.791.276		$ -
14S	SUMINISTRO DE BANNER 1,20 M X 1,20 M CON IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR, EN LONA VINILICA (APLICACIÓN Y EL USO DE LA MARCA CIUDAD) CON OJALES	UND	8	$ 103.334	$ 826.672		$ -

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	COSTO DIRECTO	SUBTOTAL	CANT. ACTA	SUBTOTAL
			TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)		$ 49.502.144	TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA) ACTA 9	$ 18.791.265
						RETENCIÓN 5%	939.563
			TOTAL OBRA + SUMINISTROS		$ 2.299.388.636	TOTAL OBRA + SUMINISTROS ACTA 9	$ 861.914.469

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, aclarando que al 26 de enero de 2022 de dio acta de inicio del contrato.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 4 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	VALOR TOTAL
2672	07 de octubre de 2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2021	$ 2.249.886.492
30	29 de septiembre de 2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2022	$ 7.499.519.218
30	29 de septiembre de 2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2023	$ 7.499.519.195
					$ 17.248.924.905

CRP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	CDP Y VIGENCIA	VALOR TOTAL
2593	13 de diciembre de 2021	13301160449000007587	Maquinaria y equipo	2672	$ 2.249.886.492
38	13 de diciembre de 2021	13301160449000007587	Maquinaria y equipo	30 y 2022	$ 7.499.477.768
38	13 de diciembre de 2021	13301160449000007587	Maquinaria y equipo	30 y 2023	$ 5.249.674.077
					$ 14.999.038.337

En la tabla siguiente se muestran el estado del corte realizado, según la ejecución mostrada Acta Parcial No. 4 – Contrato 2021-2569 (Obra) versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 4. Recursos asignados como vigencias futuras.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados

MES EJECUCIÓN	Abr/22 – May/22 (MES 4)
CRP INICIAL	2593
VIGENCIA	2021
VALOR CRP INICIAL	$2.249.886.492
SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	$865.792.850
VALOR EJECUTADO	$1.384.073.342
RETEGARANTÍA	$69.203.682
DESCUENTOS EFECTUADOS	**EN PROCESO**
VALOR PAGADO	**$ 1.384.073.342**
No. DOCUMENTO CONTABLE	**06**
FECHA DE PAGO	**EN TRÁMITE**

A continuación, y desde 01 de mayo al 30 de mayo, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 6 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR X PAGADO	ACUMULADO RETEGARANTIA	SALDO CRP
-	2593	**13/12/21**	$ 2.249.886.492	$1.384.073.342	$69.203.682	$ 865.792.850
2022	38	**13/12/21**	$ 7.499.477.768	$0.00	$0.00	$ 7.499.477.768
2023	38	**13/12/21**	$ 5.249.674.077	$0.00	$0.00	$ 5.249.674.077
						$ 14.091.067.713

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de mayo de 2022, conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de mayo 2022

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	$ 14.999.038.337
2	Valor Ejecutado	$ 2.245.988.111
3	Saldo por Ejecutar	$ 12.753.050.226
4	Valor pagado	$ 1.384.073.342
5	Saldo CRP 2593	$ 865.792.850
6	Saldo CRP 38 (vigencia 2022)	$ 7.499.477.768
7	Saldo CRP 38 (vigencia 2023)	$ 5.249.674.077

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

6. CONCLUSIONES

Desde 01 de mayo al 30 de mayo de 2022, en el marco del Contrato SDM-2021-2569 se realizó implementación de los componentes vertical y horizontal y suministros, tal como se muestra a continuación:

N°	ID DE DISEÑO IMPLEMENTADO	TIPO DE IMPLEMENTACIÓN	LOCALIDAD
1	MV_02_335_946_10_V13.	Horizontal	01-Usaquen
2	MV_11_352_1236_11	Horizontal	11-Suba
3	MV_03_010_V25	Horizontal	01-Usaquen
4	EX_11_388_1842_12_V2	Horizontal	11-Suba
5	EX_01_107_1794_10_V5	Horizontal y Vertical	01-Usaquen
6	EX_01_343_1842_12	Horizontal	01-Usaquen
7	EX_11_422_1842_12	Horizontal	11-Suba
8	MV_01_355_988_09_V3	Horizontal	01-Usaquen
9	EX_01_341_1842_12_V4	Horizontal	01-Usaquen
10	SUMINISTRO SEÑALES ESTACIONAMIENTOS	Vertical	
11	SUMINISTRO 1 (ENTREGA PARCIAL)	Vertical	
12	SUMINISTRO 2	Vertical	

Fuente: Informe Mensual No. 1 Contrato de Interventoría 2021-2012

Las actividades anteriormente relacionadas, bajo el seguimiento y control a través del contrato de interventoría 2021-2012.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195
