SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2021

CONTRATO DE OBRA SDM 2021-2020

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de octubre de 2021 del Contrato de Obra SDM 2021-2020 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el CONSORCIO MYSV - OINCO y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto **"REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 2- ZONA ORIENTE-NORTE"**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de octubre del año 2021 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Obra SDM-2021-2020 con Interventoría SDM-2021-2013 (CONSORCIO SV BOGOTÁ) para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

• Relacionar el avance del Contrato de Obra SDM-2021-2020 con corte al 30 de octubre de 2021, en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

• Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de octubre de 2021 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2020

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de octubre de 2021.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 1 Datos del Contrato

CONTRATO No.	SDM-2021-2020
OBJETO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." LOTE 2 - ZONA ORIENTE - NORTE
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**CDPs**

No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA
1224	23/02/2021	$ 19.810.000.000,00	2021
12	12/03/2021	$ 26.248.317.500,00	2022
13	12/03/2021	$ 26.248.317.500,00	2022
12	12/03/2021	$ 26.248.317.500,00	2023
13	12/03/2021	$ 26.248.317.500,00	2023

CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL: **RPs**

No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA
1961	04/08/2021	$ 2.829.999.937	2021
25	05/08/2021	$7.499.519.218	2022
25	05/08/2021	$7.499.519.195	2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($17.829.038.350), equivalente a 19.624,13 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021), dichas sumas incluyen IVA, administración, imprevistos y utilidad (AIU), impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2020.
FECHA DE INICIACIÓN:	17 de agosto de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de enero de 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO MYSV - OINCO
IDENTIFICACION:	NIT: 901.499.929
INTERVENTORIA	CONSORCIO SV BOGOTÁ CONTRATO SDM-2021-2013

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SDM-LP-033-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Contratista corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): **LOTE 2- ZONA ORIENTE-NORTE.**

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Se realizará las actividades inherentes a la implementación de señalización vial a través del contrato de obra 2021-2020, el cual se desarrollará en las localidades de Santafé, la Candelaria y Chapinero sobre el corredor de la Carrera 7, que se muestran de forma esquemática en la Ilustración1.

Las actividades relacionadas con el objeto del proceso serán ejecutadas en la ciudad Bogotá D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación y donde se requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren a cargo de la Entidad.

No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 1 Anexo Nº 1 – Anexo Técnico Definitivo, Durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de la zona. Así mismo, es responsabilidad del contratista la señalización de las vías limítrofes de la zona asignada.

Para todos los efectos la Secretaría Distrital de Movilidad se reserva el derecho de intervención, el cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (director de Ingeniería de Tránsito) y el subdirector Técnico de Señalización, con el correspondiente seguimiento por parte de la interventoría y el acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría Distrital de Movilidad para el contrato de interventoría.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Ilustración 1: Localización del proyecto

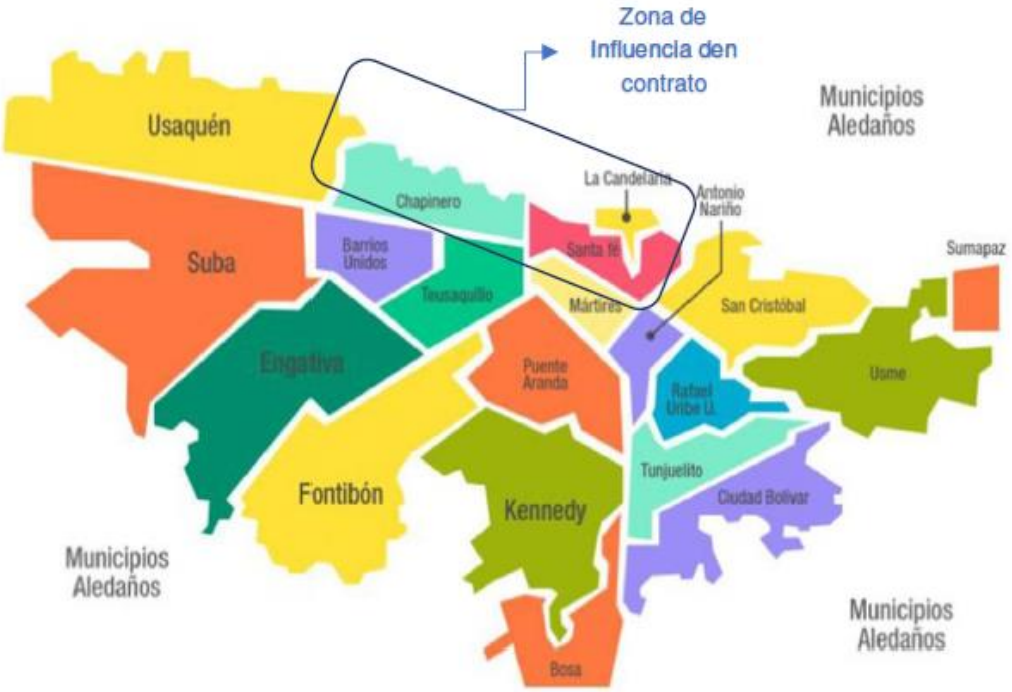

Fuente: ***https://tierracolombiana.org/localidades-de-bogota/***
Modificado por CONSORCIO SV BOGOTÁ.

Teniendo en cuenta la fecha de inicio del Contrato de Obra SDM-2021-2020 correspondiente al 17 de agosto de 2021 y de acuerdo con el corte mensual a 16 de octubre de 2021; desde la SDM-DTI-SS se asignó a través del Contrato de Interventoría SDM-2021-2013 la implementación de los diseños relacionados en la Tabla No. 2 que hace parte de los proyectos estratégicos de la SDM en términos de señalización y seguridad vial buscando garantizar la adecuada información de todos los usuarios durante su desplazamiento.

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y la interventoría se relacionan a continuación, indicando estado de inspecciones y diagnósticos preliminares de conformidad con lo consagrado en los anexos técnicos SDM-LP-033-2021 y SDM-CMA-039-2021, correspondientes a los contratos de obra e interventoría, respectivamente, donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 2 – Diseños asignados para implementación con el contrato 2021-2020 (Zona Oriente – Norte) CTO Interventoría 2021-2013

N	ASIGNACIÓN	CLASIFICACIÓN	PRESUPUESTO	AVANCE	% AVANCE	ESTADO
1	EX_03_001_1841_17_V0	Normal	$ 608.906.601,33	$104.272.116,43	17,12%	**En implementación**
2	EX_03_070_1881_12_V2	Normal	$ -	$ -	0,00%	Inspeccionado
3	CPS_676_MV_01_04_V29_OBRA.dwg	Prioritario	$ 31.226.137,78	$31.112.554,73	99,64%	**Implementado**
4	EX_03_066_1881_12_V2	Normal	$ 95.577.066,00		0,00%	Inspeccionado
5	EX_03_078_1881_12_V4.dwg	Normal	$ -	$ -	0,00%	Pendiente de Inspeccionado
6	MV_13_153_1249_11_V5.dwg	Normal	$ -	$ -	0,00%	Pendiente de Inspeccionado
7	TPD_PL_2342_V2.dwg	Normal	$ -	$ -	0,00%	Pendiente de Inspeccionado
8	EX_03_065_1881_12	Normal	$ -	$ -	0,00%	Inspeccionado
9	EX_03_071_1881_12	Normal	$ -	$ -	0,00%	Inspeccionado
10	EX_03_076_1881_12	Normal	$ -	$ -	0,00%	Pendiente de Inspeccionado
11	EX_03_085_1881_12	Normal	$ -	$ -	0,00%	Inspeccionado
12	EX_17_001_1841_17	Normal	$ -	$ -	0,00%	Pendiente de Inspeccionado
13	EX_17_034_1881_12	Normal	$ -	$ -	0,00%	En Inspección
14	EX_17_036_1881_12	Normal	$ -	$ -	0,00%	Pendiente de Inspeccionado
15	MV_02_280_941_09	Normal	$ -	$ -	0,00%	Pendiente de Inspeccionado
16	EX_02_356_946_10_V6	Prioritario	$ 114.425.536,25	$69.025.717,92	60,32%	**En implementación**
17	EX_02_033_1556_10_V20	Prioritario	$ 133.966.172,60	$72.500.246,40	54,12%	**En implementación**

Fuente: CONSORCIO SV BOGOTÁ.

Tabla No. 3 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2020

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEP-OCT DE 2021	Id CPS_676_MV_01_04_V29	• Instalación de pasacalles en la KR 7 con CL 92 y CL 94 a la altura de la KR 7. • Retiro de tachones en la KR 7 con CL 92.
SEPT-OCT DE 2021	Id EX_03_001_1841_17_V0	• Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM, LCP, LC, LA, LB, LCN, LCA, LP, LIC, PAB, PP, PE,

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
		PPP, PTEXT, PVM, PZE, RV, SPT, TCH, ZB, ZBC, RPA, PSP47A, VCC, VMP. Instalación de estoperoles, zonas de pacificación. • Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. • Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
SEPT – OCT DE 2021	Id EX_02_356_946_10_V6	• Se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM, LC, LA, LB, LCA, LP, LE, PP, PBU, PC, PE, PPP, PVM, SPT, TR, TCH, ZB, ZBC, PSP47A, VMP. • Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. • Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
SEPT – OCT DE 2021	Id EX_02_033_1556_10_V20	• Se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM, LC, LA, LB, LCA, LP, LE, PP, PBU, PC, PE, PPP, PVM, SPT, TR, TCH, ZB, ZBC, PSP47A, VMP. • Señalización Vertical: Se instalaron señales • reglamentarias y preventivas. • Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
SEPT – OCT DE 2021	CP_CL 83 CON KR 15	• Retiro de señal no reglamentaria.
SEPT – OCT DE 2021	CP_CL 83 ENTRE KR 14 Y KR 15	• Retiro de señales no reglamentarias.

Fuente: Informe Mensual Contrato de Interventoría 2021-2013

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución de los componentes que hacen parte del Contrato SDM-2021-2020, en donde se registran las cantidades de elementos de señalización instalados durante el desarrollo del proyecto con el primer corte mensual:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

		CONDICIONES INICIALES _AÑO VIGENCIA_2021		ACTA No. 2	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE AIU)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 291.188,00	25,00	$ 7.279.700,00
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UND	$ 438.409,00	2,00	$ 876.818,00
15	Fabricación, suministro e instalación de delineador de obstáculo (Chevron) 90X40 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo limón fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 296.069,00	1,00	$ 296.069,00
18	Fabricación, suministro e instalación de señal informativa SI-27 de 40x75 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo cumpliendo normatividad vigente.	UND	$ 253.139,00	2,00	$ 506.278,00
28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UND	$ 20.273,00	25,00	$ 506.825,00
31	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	$ 1.224,00	6630,56	$ 8.115.805,44
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	$ 1.649,00	377,16	$ 621.936,84
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	ML	$ 1.874,00	109,40	$ 205.015,60
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	$ 9.345,00	1958,22	$ 18.299.565,90
55	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	ML	$ 4.617,00	6630,56	$ 30.613.295,52
56	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	$ 5.888,00	377,16	$ 2.220.718,08
57	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	ML	$ 7.758,00	109,40	$ 848.725,20
58	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	$ 46.187,00	272,93	$ 12.605.817,91
59	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	$ 41.997,00	356,92	$ 14.989.569,24
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	$ 75.479,00	359,64	$ 27.145.267,56
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	$ 73.011,00	224,91	$ 16.420.904,01
67	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) sin microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	$ 74.176,00	180,07	$ 13.356.872,32
68	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	M2	$ 3.663,00	1394,48	$ 5.107.980,24
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	$ 8.498,00	60,00	$ 509.880,00
70	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UND	$ 11.955,00	295,00	$ 3.526.725,00
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,5 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación.	UND	$ 12.603,00	2336,00	$ 29.440.608,00
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura mínima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-18 de la Resolución 1885 de 2015). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	$ 64.530,00	32,00	$ 2.064.960,00
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (Hito - Figura 5-17A) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivo blanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UND	$ 71.000,00	16,00	$ 1.136.000,00
92	Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	M2	$ 79.227,00	25,92	$ 2.053.563,84
94	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UND	$ 4.061,00	13,00	$ 52.793,00
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	$ 32.092,00	30,52	$ 979.447,84
					$ 199.781.141,54
			COSTO DIRECTO		$ 149.760.975,67
			ADMINISTRACIÓN		$ 41.034.507,33
			IMPREVISTO		$ 2.995.219,51
			UTILIDAD		$ 5.990.439,03
					$ 199.781.141,54

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (INCLUYE IVA)	ACTA No. 2 CANTIDAD	ACTA No. 2 VALOR TOTAL
1S	Suministro de cono vial construido en material sintético flexible con tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura 90 cm.	UND	$ 83.231,00	166,00	$ 13.816.346,00
3S	Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 140 cm de altura.	UND	$ 30.543,00	33,00	$ 1.007.919,00
5S	Suministro de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	ROLLO	$ 30.837,00	4,00	$ 123.348,00
10S	BASTON LUMINOSO BICOLOR	UND	$ 100.191,00	5,00	$ 500.955,00
					$ 15.448.568,00
		COSTO DIRECTO			$ 12.981.989,92
			19%		$ 2.466.578,08
					$ 15.448.568,00

TOTAL OBRA + SUMINISTRO PRESENTE ACTA		**$ 215.229.709,54**
RETENCIÓN 5% OBRAS SUMINISTROS		**$ 10.761.485,48**
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**$ 204.468.224,06**
AJUSTE A DECIMALES		**-$ 0,06**
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**$ 204.468.224,00**
Valor de pago Total en letras	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO	

Fuente: Acta Parcial No. 2 – Contrato 2021-2020 (Obra)

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, aclarando que al 30 de octubre de 2021 está pendiente el pago del período de octubre, cuya presentación de cuenta se surten a partir del 29 de octubre y hasta el 11 de noviembre de 2021, conforme a la información remitida por la Subdirección Financiera de la SDM.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 4 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
1224	23/02/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2021	1961	**04/08/2021**	$2.829.999.937	$2.829.999.937
12	12/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2022	25	**05/08/2021**	$7.499.529.218	$7.499.529.218
13	12/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2022	-	-	-	-
12	12/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2023	25	**05/08/2021**	$7.499.519.195	$7.499.519.195
13	12/03/2021	13301160449000007587	Maquinaria y Equipo	2023	-	-	-	-
								$17.829.038.350

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

En la tabla siguiente se muestran el estado de cortes realizados, según la ejecución mostrada en la Tabla No. 3, versus los Certificados de Registro Presupuestal asignados y relacionados en la Tabla No. 4. Recursos asignados como vigencias futuras.

Tabla No. 5 Cortes de Obra Vs Recursos asignados

MES EJECUCIÓN	Ago/2021 – Sep/2021 (MES 1)	Sep/2021 – Oct/2021 (MES 2)
CRP INICIAL	1961	1961
VIGENCIA	2021	2021
VALOR CRP INICIAL	$2.829.999.937	$2.829.999.937
SALDO CRP INICIAL ACUMULADO	$2.829.999.937	$2.771.503.939
VALOR EJECUTADO	**$58.495.998**	**$204.468.225**
RETEGARANTÍA	**$3.078.737**	**$10.761.485**
DESCUENTOS EFECTUADOS	$7.259.663	**EN PROCESO**
VALOR PAGADO	**$51.236.335**	**EN TRÁMITE**
No. DOCUMENTO CONTABLE	**3000757045**	**EN TRÁMITE**
FECHA DE PAGO	25/10/2021	**EN TRÁMITE**

*** La cuenta del mes de octubre de 2021 a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

A continuación, y con corte al 30 de octubre de 2021, se tienen los saldos de los Certificados de Registro Presupuestal relacionados en la siguiente tabla:

Tabla No. 6 Pagos realizados Vs Recursos asignados

VIGENCIA CRP	CRP	FECHA	VIGENCIAS FUTURAS	VALOR X PAGADO	SALDO CRP
2021	1961	**04/08/2021**	$2.829.999.937	$262.964.223***	$2.567.035.714
2022	25	**05/08/2021**	$7.499.529.218	$0.00	$7.499.519.218
2023	25	**05/08/2021**	$7.499.519.195	$0.00	$7.499.519.195
					$17.829.038.350

*** La cuenta del mes de octubre de 2021 ($204.468.225) a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de octubre de 2021 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 31 de agosto 2021

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	$17.829.038.350
2	Valor Ejecutado	$262.964.223***
3	Saldo por Ejecutar	$17.566.074.127
4	Valor pagado	$58.495.998
5	Saldo CRP 1961 (vigencia 2021)	$2.567.025.714
6	Saldo CRP 25 (vigencia 2022)	$7.499.519.218
7	Saldo CRP 25 (vigencia 2023)	$7.499.519.195

*** La cuenta correspondiente al período de octubre de 2021 por valor de $204.468.225, a la fecha está en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de octubre de 2021, en el marco del Contrato SDM-2021-2020 se realizó implementación de los componentes vertical y horizontal y suministros, tal como se muestra a continuación:

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
SEP-OCT DE 2021	Id CPS_676_MV_01_04_V29	• Instalación de pasacalles en la KR 7 con CL 92 y CL 94 a la altura de la KR 7. • Retiro de tachones en la KR 7 con CL 92.
SEPT-OCT DE 2021	Id EX_03_001_1841_17_V0	• Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM, LCP, LC, LA, LB, LCN, LCA, LP, LIC, PAB, PP, PE, PPP, PTEXT, PVM, PZE, RV, SPT, TCH, ZB, ZBC, RPA, PSP47A, VCC, VMP. Instalación de estoperoles, zonas de pacificación. • Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. • Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
SEPT – OCT DE 2021	Id EX_02_356_946_10_V6	• Se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM, LC, LA, LB, LCA, LP, LE, PP, PBU, PC, PE, PPP, PVM, SPT, TR, TCH, ZB, ZBC, PSP47A, VMP. • Señalización Vertical: Se instalaron señales reglamentarias y preventivas. • Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
SEPT – OCT DE 2021	Id EX_02_033_1556_10_V20	• Se realizó señalización horizontal: FF, FGD, FGI, FDD, FDI, FDG, RCI/RCD, LCM, LC, LA, LB, LCA, LP, LE, PP, PBU, PC, PE, PPP, PVM, SPT, TR, TCH, ZB, ZBC, PSP47A, VMP. • Señalización Vertical: Se instalaron señales

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
		• reglamentarias y preventivas. • Retiro de señales verticales en mal estado y obsoletas.
SEPT – OCT DE 2021	CP_CL 83 CON KR 15	• Retiro de señal no reglamentaria.
SEPT – OCT DE 2021	CP_CL 83 ENTRE KR 14 Y KR 15	• Retiro de señales no reglamentarias.
SEPT – OCT DE 2021	Suministros	• 166 unidades de cono vial sintético. • 33 unidades de delineador tipo tubular. • 4 rollos de cinta de señalización. • 5 Unidades de Bastón luminoso bicolor. Los anteriores suministros, cumpliendo especificaciones indicadas en el contrato.

Las actividades anteriormente relacionadas, bajo el seguimiento y control a través del contrato de interventoría 2021-2013.

Se continua con inspecciones de zonas escolares en las localidades de Candelaria y Santafé, adicionalmente culminando con la implementación de los diseños estacionamiento en vía en la localidad de Chapinero.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195
