SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 2021-2013

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el resumen del avance en la ejecución para el mes de abril de 2022 del Contrato de Interventoría SDM 2021-2013 correspondiente a las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, celebrado entre el **CONSORCIO SV BOGOTÁ** y la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SDM, el cual tiene por objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"- (LOTE 2)**

1. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance en la ejecución con corte al 30 de abril del año 2022 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas del Contrato de Interventoría SDM-2021-2013, quien ejerce la interventoría al contrato de obra 2021-2020 (CONSORCIO MYSV-OINCO) para el suministro e Implementación de señalización vial en la ciudad.

Objetivos Específicos Del Informe

- Relacionar el avance del Contrato de Interventoría SDM-2021-2013 con corte al 30 de abril de 2022, quien ejerce la interventoría del contrato de obra 2021-2020 en cada uno de los componentes definidos para la ejecución del proyecto de suministro e implementación de señalización vial en la ciudad.

- Relacionar el estado financiero del proyecto con corte de 30 de abril de 2022 relacionando los recursos asignados como vigencias futuras y su respectiva ejecución.

2. DATOS DEL CONTRATO SDM-2021-2013

A continuación, se muestran los datos principales del contrato y las modificaciones y ajustes realizadas en la ejecución del contrato con corte al 30 de abril de 2022:

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 1 Datos del Contrato

<table>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>SDM-2021-2013</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”-(LOTE 2) ZONA ORIENTE - NORTE</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">CDPs</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>FECHA</th><th>VALOR</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>1681</td><td>19/04/2021</td><td>$ 4.466.297.584,00</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>8</td><td>04/01/2022</td><td>$ 10.661.770.575,00</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>11</td><td>10/03/2021</td><td>$ 11.006.732.000,00</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL:</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">RPs</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>FECHA</th><th>VALOR</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>1922</td><td>28/07/2021</td><td>$616.030.555,00</td><td>2021</td></tr>
<tr><td>10</td><td>10/01/2021</td><td>$1.522.827.529,00</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>21</td><td>28/07/2021</td><td>$1.568.512.333,00</td><td>2023</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>TRES MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ($3.707.370.417), Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 4.081,60 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021).</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:</td><td>El plazo de ejecución del contrato es VEINTINUEVE (29) MESES. De acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato SDM-2021-2013</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIACIÓN:</td><td>17 de agosto de 2021</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>16 de enero de 2024</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>CONSORCIO SV BOGOTÁ</td></tr>
<tr><td>IDENTIFICACION:</td><td>NIT: 901.499.776</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA DE OBRA</td><td>CONSORCIO MYSV - OINCO
CONTRATO SDM-2021-2020</td></tr>
</table>

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Interventor corresponde adelantar las labores en la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): **LOTE 2- ORIENTE NORTE.**

El interventor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de la propuesta.

4. AVANCE DEL PROYECTO

Se realizará la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato de las obras conexas al contrato 2021-2020, el cual se desarrollará en las localidades de Santafé, la Candelaria y Chapinero y sobre el corredor de la Carrera 7, que se muestran de forma esquemática en la Ilustración1.

Las actividades relacionadas con el objeto del proceso serán ejecutadas en la ciudad Bogotá D.C., en los sitios definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación y donde se requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren a cargo de la Entidad.

No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 1 Anexo Nº 1 – Anexo Técnico Definitivo, durante la ejecución de los contratos la SDM podrá modificar, adicionar o eliminar parcial o totalmente alguna o algunas de las localidades que hacen parte de la zona. Así mismo, es responsabilidad del contratista la señalización de las vías limítrofes de la zona asignada.

Para todos los efectos la Secretaría Distrital de Movilidad se reserva el derecho de intervención, el cual debe ser aprobado por el Gerente del Proyecto (Director de Ingeniería de Tránsito) y el Subdirector Técnico de Señalización, con el correspondiente seguimiento por parte de la interventoría y el acompañamiento del supervisor designado por la Secretaría Distrital de Movilidad para el contrato de interventoría.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Ilustración 1: Localización del proyecto

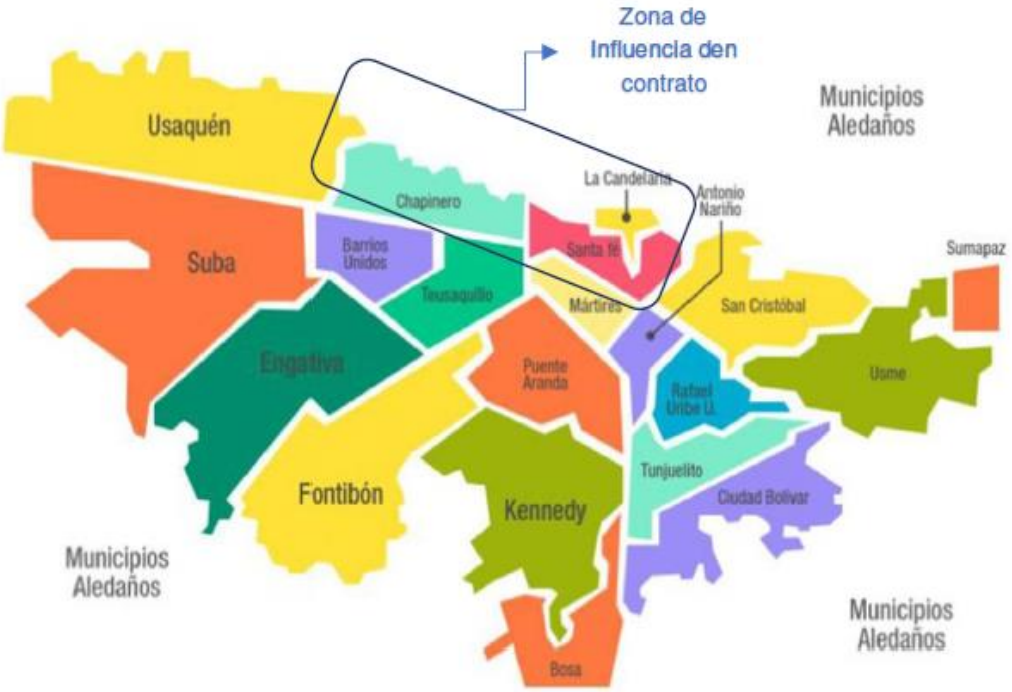

Fuente: ***https://tierracolombiana.org/localidades-de-bogota/***
Modificado por CONSORCIO SV BOGOTÁ.

Para la fecha de corte de este informe mensual, los trabajos adelantados por el Contratista y la interventoría se relacionan a continuación, indicando estado de inspecciones y diagnósticos preliminares de conformidad con lo consagrado en los anexos técnicos SDM-LP-033-2021 y SDM-CMA-039-2021, correspondientes a los contratos de obra e interventoría, respectivamente, donde se definen las etapas para la ejecución de los diferentes proyectos de señalización vial.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Tabla No. 2 – Diseños asignados para implementación con el contrato 2021-2020 (Zona Oriente – Norte) CTO Interventoría 2021-2013

N	ASIGNACIÓN	DIRECCION	CLASIFICACIÓN	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA		ESTADO
				Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado	
1	CPS_676_MV_01_04_V29	CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 82	Prioritario	$ 31.112.554,73	100,00%	Implementado
2	EX_03_001_1841_17_V0	CL 4 HASTA LA DG 7 S ENTRE KR 3 Y KR 11B E	Normal	$ 554.096.029,00	97,84%	En implementación
3	EX_03_070_1881_12_V2	KR 2 E Y KR 8 E DESDE CL 2 HASTA CL 3B	Normal	$ 63.849.149,00	94,44%	En implementación
4	EX_03_066_1881_12_V2	CL 9C Y DG 3 A DESDE KR 3 HASTA KR 8A	Normal	$ 20.399.086,00	21,34%	En implementación
5	EX_03_065_1881_12	CL6 Y CL6D DESDE LA KR 3E HASTA LA KR 6A E	Normal	$ 146.049.542,00	88,95%	En implementación
6	EX_03_071_1881_12	CL 1F Y CL 3 DESDE KR 1 HASTA KR 2 E	Normal	$ 71.797.981,00	75,44%	En implementación
7	EX_03_085_1881_12	CALLE 33B HASTA LA CALLE 26BIS ENTRE KR 5 Y KR 1	Normal	$ 435.585.229,00	95,82%	En implementación
8	EX_02_356_946_10_V6	KR 18 ENTRE CL 94 Y CL 93, CL 93B ENTRE KR 18 Y KR 15	Prioritario	$ 113.012.020,93	100,00%	Implementado
9	EX_17_034_1881_12	CALLE 12 HASTA LA CALLE 22 ENTRE LA CARRERA 3A Y LA CARRERA 5E	Normal	$ 102.167.401,49	92,88%	En implementación
10	EX_02_033_1556_10_V20	ENTRE LAS KR 14 Y KR 13 A Y CL 92 Y CL 88	Prioritario	$ 98.858.894,60	100,00%	Implementado
11	MV_01_033_1560_10	AUTOPISTA NORTE ENTRE CALLE 166 Y CL 245	Prioritario	$ 444.618.152,82	91,37%	En implementación
12	EX_03_041_670_11_V3	DG 40A A CL 33 ENTRE AK 7 Y AK 14	Normal	$ 85.964.220,00	78,70%	En implementación
13	EX_03_078_1881_12_V4	KR 13 Y KR 5 DESDE CL 36 HASTA CL 26 B	Normal	$ 46.554.418,95	72,83%	En implementación
16	EX_17_036_1881_12	CL 6A BIS HASTA CL 1C ENTRE KR 1A Y KR 7	Normal	$ 107.480.435,22	56,83%	En implementación
17	EX_03_076_1881_12	CALLE 19 HASTA LA CALLE 26 ENTRE KR 10 Y KR 3	Normal	$ 129.389.661,00	83,94%	En implementación
18	EX_17_001_1841_17	KR 3 ESTE Y KR 7 ESTE DESDE CL 9B HASTA CL 10	Normal	$ 6.247.397,08	53,42%	En implementación
19	MV_02_280_941_09	kr 5 entre cl 26A HASTA CL 27	Normal	$ 109.707.606,11	98,99%	En implementación
20	CP - Kra 6 " 1-43	Kra 6 " 1-43	Normal	$ 920.412,00	100,00%	Implementado
21	CP_ak 7 CON Cll 94	suministro- implementación del pasacalle que se muestra en el Esquema 1. Sobre la calle 94 entre Carrera 7 y carrera 7A. Sentido Occidente-Oriente	CP	$ 836.637,00	100,00%	Implementado
22	CP_ak 7 CON Cll 92	suministro - implementación del pasacalle que se muestra en el Esquema 1. Sobre la calle 92 entre Carrera 7 y carrera 7A. Sentido Occidente-Oriente	CP	$ 1.216.927,00	100,00%	Implementado
23	CP CALLE 83 ENTRE KRA 13 Y 15	CALLE 83 ENTRE KRA 13 Y 15	CP	$ 101.365,00	100,00%	Implementado
24	CP RETIRO DE TACHONES	KR 7 CON CL 92	CP	$ 52.793,00	100,00%	Implementado
25	CPS-676-MV01-04-28	KR 7 CON CL 92	CP	$ 8.471.392,95	100,00%	Implementado
26	CP - KR 7A ESTE 2C 0513-12-2021	KR 7A ESTE 2C 0513-12-2021	CP	$ 582.376,00	100,00%	Implementado
27	CP - Dg 44_Kr 3 Este y Tv 1 Este	Dg 44_Kr 3 Este y Tv 1 Este	CP	$ 2.839.686,00	100,00%	Implementado
28	CP - IDIGER- TV 2A_ 1 F	IDIGER- TV 2A_ SANTA FE 20 DIC	CP	$ 1.511.845,00	100,00%	Implementado
29	CP SDM-SS-73925-2020	Carrera 5 entre Calle 24 y Calle 26. - SR-29	CP	$ 873.564,00	100,00%	Implementado
30	CP EX 02-033-1556-10-20	Carrera 13 entre Calle 93 y Calle 93A.	CP	$ 7.369.973,89	100,00%	Implementado

Continua abajo…

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

N	ASIGNACIÓN	DIRECCION	CLASIFICACIÓN	AVANCE DEL EJECUCIÓN DE OBRA		ESTADO
				Presupuesto ejecutado	Avance Ejecutado	
31	MV_02_335_946_10_V12	Vía a La calera	Normal	$ 580.459,00	100,00%	Esta asigación fue retirada por la SDM
32	EX_02_203_1881_12_V2	LA AV 100 Y CLL 98 - CL 98 ENTRE TV 21 Y TV 22 - CLL 98 ENTRE TV 22 Y TV 23 - TV 23 ENTRE CL 98 Y CL 97 - CL 97 ENTRE TV 23 Y AK 19 - TV 21 ENTRE CL 98 Y CL 97 9	Normal	$ 106.052.355,85	97,82%	En implementación
33	EX_02_356_946_10_V7	CL 95 ENTRE KR 17 Y KR 15 CALLE 97 ENTRE KR 17 Y KR 15 KR 16 ENTRE CALLE 95 Y CALLE 97	Normal	$ 22.075.460,48	100,00%	En implementación
34	CPS_676_MV_01_04_V30	CARRERA 7 ENTRE CALLE 85 Y CALLE 32	Normal	$ 49.035.914,00	61,65%	En implementación
35	CP Transversal 3 entre Calles 56 y 53	Transversal 3 entre Calles 56 y 53	CP	$ 2.928.676,00	100,00%	Implementado
36	CP Km 9 vía Bogotá Choachí	Km 9 vía Bogotá Choachí 27-01-2022	CP	$ 1.988.045,00	100,00%	Implementado
37	CP Km 4 vía Bogotá Choachí	Km 4 vía Bogotá Choachí	CP	$ 1.988.045,00	100,00%	Implementado
38	CP EX_ 02_335_946	Av Circunvalar con calle 87, sentido Sur-Norte - Chevron	CP	$ 316.342,00	100,00%	Implementado
39	CP EX _ 02_180_1881	Calle 74 # 1- 86 - No pase	CP	$ 1.185.025,00	100,00%	Implementado
40	CP EX_02_180_1881	Calle 81 con carrera 6 SR-01	CP	$ 311.461,00	100,00%	Implementado
41	CP EX_02_180_1881	Carrera 5 # 79-35 - SR-28	CP	$ 381.342,00	100,00%	Implementado
42	EX_02_102_1556_10_V2	LA CL 48 HASTA CL 62 Y ENTRE LA AK 14 Y KR 13.	Normal	$ 33.879.888,00	65,74%	En implementación
43	EX_02_166_1249_11_V1	CL 44 HASTA LA CL 40B ENTRE KR 13 Y AK 7	Normal	$ 50.749.777,00	94,60%	En implementación
44	EX_02_171_1249_11	LA AK 7 Y KR 3 Y ENTRE LA DG 92 CL 93.	Normal	$ 30.048.291,00	66,68%	En implementación
45	EX_02_195_1881_12_V6	CL 64 HASTA LA CL 53 ENTRE KR 13 Y AK 7	Normal	$ 167.048.536,00	95,31%	En implementación
46	EX_02_227_1794_10_V1	LA DG 40A HASTA CL 44 Y ENTRE LA AK 14 Y KR 13.	Normal	$ 47.797.436,00	75,40%	En implementación
47	EX_02_240_575_11_V7	Kr 8a entre Cll 95 y Cl 97a (solo este sector)	Normal	$ 80.554.812,00	87,10%	En implementación
48	SH_SV_IDU_420-2015_k7_CL13_CL26_V0_1_5	K7 entre Cl 13 y Cl 26	Prioritario	$ 0,00	0,00%	Con inspección pero no se implementa
49	EX_02_182_1881_12_V8-SDM 5	CALLE 62 ENTRE KR 3B Y KR 3	Normal	$ 0,00	0,00%	Sin inspección
50	EX_02_169_1249_11_V3	KR 2 Y TV 5E DESDE CL 60BIS A DG 55	Normal	$ 0,00	0,00%	inspeccionado
51	EX_02_197_1881_12_V6	KR 13 A LA AK 3 ENTRE CL 54 Y AC 45	Normal	$ 0,00	0,00%	inspeccionado
52	EX_02_202_1881_12_V1	AK 20 A AK 7 ENTRE AC72 Y CL 76	Normal	$ 76.027.018,00	69,31%	En implementación
53	EX_03_080_1881_12	CL 13 HASTA CL 19 ENTRE KR 10 Y KR 4	Normal	$ 0,00	0,00%	inspeccionado

Fuente: Consorcio SV BOGOTÁ – Informe No. 8 Interventoría

Tabla No. 3 Actividades de verificación y recibo a satisfacción de los trabajos de Señalización vertical y horizontal realizados por el Contrato de Obra SDM-2021-2020

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
MAR-ABR/2022	EX_17_034_1881_12	Para el presente período se realización implementación de señalización vertical.
MAR-ABR/2022	EX_03_041_670_11_V3	Para el presente período se realización implementación de señalización vertical.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
MAR-ABR/2022	EX_03_078_1881_12_V4	Para el presente período se realización implementación de señalización vertical.
MAR-ABR/2022	EX_03_085_1881_12	Para el presente período se realización implementación de señalización vertical.
MAR-ABR/2022	EX_17_036_1881_12	Para el presente período se realizó señalización horizontal: ZB EP
MAR-ABR/2022	EX_03_076_1881_12	Para el presente periodo se realizó pintura de dispositivos tipo bordillo no traspasable.
MAR-ABR/2022	MV_02_280_941_09	Para el presente período se realización implementación de señalización vertical.
MAR-ABR/2022	EX_02_203_1881_12_V2	Para el presente período se realización implementación de señalización vertical. .
MAR-ABR/2022	EX_02_356_946_10	Para el presente período se realización implementación de señalización vertical.
MAR-ABR/2022	CPS_676_MV_01_04_V2	Para el presente período se realizó señalización horizontal: LP FFZB SPT FDD PP SPT PCP FGD.
MAR-ABR/2022	EX_02_102_1556_10	Para el presente período se realizó señalización horizontal: PCP PSP47APAB SPT PCP1 PE FF FDD FDI EP BA2 LP FGD.
MAR-ABR/2022	EX_02_166_1249_11_V1	Para el presente período se realizó señalización horizontal: ACH BA2BA3 EP FDI FGI LA LE PCP PCP1 PE PPP PSI25 PSP47A PZE SPT TR VMP30.
MAR-ABR/2022	EX_02_195_1881_12_V6	Para el presente período se realizó señalización horizontal: ACH EPFDD FDI FF FGD FGI LA LC LCA LCN LIC LL LP LPA PCC PCP PCP1 PE PP PPARE PSOLO PSP47A PZE RCD RCI SPT TCH TR VMP20 VMP30.
MAR-ABR/2022	EX_02_227_1794_10	Para el presente período se realizó señalización horizontal: EP FFFGD FGI LCM LP PCP PCP1 PSOLO PSP47A PZE SPT VMP30
MAR-ABR/2022	MV_01_033_1560_10	Para el presente Periodo se realizó Instalación de tachas reflectivas.
MAR-ABR/2022	EX_17_001_1841_17	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: FF FGDFGI LP PAB PE PSOLO, PSP47A PZE SPT PE LP SPT, PSP47A FDD SPT FDG.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
MAR-ABR/2022	EX_02_171_1249_11	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: BA2 FFLAL LCM LP SPT VMP30
MAR-ABR/2022	EX_02_240_575_11_V7	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: EP FDDFDG FDI FF FGD FGI LCM LP PCP PCP1 PP PSP47A PZE SPT VMP20 VMP30 ZB
MAR-ABR/2022	EX_02_202_1881_12_V1	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: ACH BA2EP FDD FDI FF FGD LC LCA LP PAB PC PCP PP PSP47A PZE SPT VMP30 ZB.

Fuente: Informe Mensual No. 8 Contrato de Interventoría 2021-2013

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO – CERTIFICADOS DE REGISTROS PRESUPUESTALES – CRP

Adicionalmente, a continuación, se presenta el estado de avance de ejecución del Contrato SDM-2021-2013, con corte mensual a 30 de abril de 2022:

Tabla No. 4 Avance del Proyecto

ACTA DE PAGO N° 08
CONTROL PRESUPUESTAL MENSUAL Y ACUMULADO CUENTA No. 08
INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2021-2013

VR INICIAL CTO INTERVENTORÍA	$ 3.707.370.417
VR ADICIÓN	$ -
VR TOTAL	$ 3.707.370.417

ACTA No.	PERIODO A FACTURAR	VALOR 40% MENSUAL FIJO	% AVANCE OBRA DEL PERIODO	VALOR 50% AVANCE DE OBRA	% AVANCE DE CONSULTORÍA DEL PERIODO	VALOR 10% AVANCE CONSULTORÍA	VALOR A DESCONTAR A LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO	VALOR A FACTURAR	SALDO POR FACTURAR	CUENTA PAGADA / EN TRÁMITE
1	17/AGT./2021 - 16/SEP/2021	$ 51.136.144,00	0,35%	$ 6.487.898,00	0%	$ -	$ -	$ 57.624.042	$ 3.649.746.375	PAGADA
2	17/SEP/2021 - 16/OCT/2021	$ 51.136.144,00	1,21%	$ 22.429.591,00	0%	$ -	$ -	$ 73.565.735	$ 3.576.180.640	PAGADA
3	17/OCT/2021 - 16/NOV/2021	$ 51.136.144,00	2,81%	$ 52.088.554,00	0%	$ -	$ -	$ 103.224.698	$ 3.472.955.942	PAGADA
4	17/NOV/2021 - 16/DIC/2021	$ 51.136.144,00	2,57%	$ 47.639.710,00	0%	$ -	$ -	$ 98.775.854	$ 3.374.180.088	PAGADA
5	17/DIC/2021 - 16/ENE/2021	$ 51.136.144,00	3,04%	$ 56.352.030,00	0%	$ -	$ -	$ 107.488.174	$ 3.266.691.914	PAGADA
6	17/ENE/2022 - 16/FEB/2022	$ 51.136.144,00	3,76%	$ 69.698.564,00	0%	$ -	$ -	$ 120.834.708	$ 3.145.857.206	PAGADA
7	17/FEB/2022 - 16/MAR/2022	$ 51.136.144,00	0,00%	$ -	0%	$ -	$ -	$ 51.136.144	$ 3.094.721.062	PAGADA
8	17/MAR/2022 - 16/ABRIL/2022	$ 51.136.144,00	4,96%	$ 91.942.786,00	0%	$ -	$ -	$ 143.078.930	$ 2.951.642.132	TRÁMITE
	TOTALES VALOR CONTRATO	$ 409.089.152	18,70%	$ 346.639.133	0,00%	$ -	$ -	$ 755.728.285		

RESUMEN VALORES DEL CONTRATO DE OBRA INTEGRAL Y DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		VALOR EJECUTADO EN EL MES POR COMPONENTE	% EJECUTADO PARA EL PERIODO	ONENTES PARA EL COBRO DE INTERVEN	VALOR A COBRAR POR LA INTERVENTORÍA
VALOR COMPONENTE DE OBRA CONTRATO INTEGRAL No. 2021-2013	$ -	$ -	4,96%	50% AVANCE OBRA	$ 91.942.786,00
VALOR COMPONENTE CONSULTORÍA CONTRATO INTEGRAL No.	$ -			10% AVANCE CONSULTORÍA	$ -
VALOR DEL CONTRATO INTEGRAL (OBRA + CONSULTORÍA)	$ -			40% MENSUAL FIJO	$ 51.136.144,00
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2013	$ 3.707.370.417			POR INTERVENTORÍA CTO No. 2021-2013	$ 143.078.930,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2013	$ 3.707.370.417			VALORES A DESCONTAR	$ -
				VALOR TOTAL A COBRAR	$ 143.078.930,00

JOSE ALEJANDRO MORENO FOGLIA
Representante Legal
CONSORCIO SV BOGOTÁ

NELSON RICARDO BELTRAN MOJICA
VoBo. Director de la interventoría
CONSORCIO SV BOGOTÁ

Fuente: Elaboración Propia

adro contrato interventoría.

Fuente: Informe Mensual de Interventoría No. 8 CTO 2021-2013

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

En este numeral se relaciona el balance financiero de los recursos asignados al proyecto como vigencias futuras, aclarando que al 30 de abril de está pendiente el pago del período de Mar-Abr/2022, cuya presentación de cuenta se surten conforme con las directrices que remita la Subdirección Financiera de la SDM.

En razón de lo anterior, en la tabla siguiente se muestra la relación de recursos asignados.

Tabla No. 5 Recursos asignados como vigencias futuras

CDP	FECHA DE CDP	CODIGO	CONCEPTO	VIGENCIA CDP	CRP	FECHA	VALOR X VIGENCIA APROBADO	VALOR TOTAL
1681	19/04/2021	133011604490000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2021	1922	**28/07/2021**	$ 616.030.555	$ 616.030.555
8	**04/01/2022**	**O233011604490000007587**	**O232020200883111 Servicios de consultoría en gestión estratégica**	**2022**	**10**	**10/01/2022**	**$1.522.827.529**	**$1.522.827.529**
11	10/03/2021	133011604490000007587	1082001042 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2023	21	**28/07/2021**	$1.568.512.333	$1.568.512.333
								$3.707.370.417

Tabla No. 6 Cortes de Obra (Interventoría) Vs Recursos asignados

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP (INICIAL/ ACUMULADO)	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR CRP	RETEGARANTÍA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	No. DOC. CONTABLE	FECHA
Ago/2021 a Sep/2021 – Mes 1	**1922**	**2021**	$ 616.030.555	$ 57.624.042	$ 558.406.513	**N/A.**	**$ 4.668.031**	**$ 52.956.011**	**3000757039**	**25/10/2021**
Sep/2021 a Oct/2021 – Mes 2	**1922**	**2021**	$ 558.406.513	$ 73.565.735	$ 484.840.778	**N/A.**	**$ 5.959.444**	**$ 67.606.291**	**3000836519**	**24/11/2021**
Oct/2021 a Nov/2021 Mes 3	**1922**	**2021**	$ 484.840.778	$ 103.224.698	$ 381.616.080	**N/A.**	**$ 8.362.068**	**$ 94.862.630**	**3000973212**	**27/12/2021**
Nov/2021 a Dic/2021 Mes 4	**1922**	**2021**	**$ 381.616.080**	$ 98.775.854	$ 282.840.226	**N/A.**	**$ 15.618.206**	**$ 83.157.648**	**3000109566**	**22/02/2022**
Dic/2021 a Ene/2022 Mes 5	**1922**	**2021**	**$ 282.840.226**	$ 107.488.174	$ 175.352.052	**N/A.**	**$ 8.866.420**	**$ 98.621.754**	**3000137900**	**3/03/2022**
Ene/2022 a Feb/2022	**1922**	**2021**	**$ 175.352.052**	$ 120.834.708	$ 54.517.344	**N/A.**	**$ 9.967.340**	**$ 110.867.368**	**3000188997**	**22/03/2022**

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

MES EJEC.	CRP INICIAL	VIGENCIA	VALOR CRP (INICIAL/ ACUMULADO)	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR CRP	RETEGARANTÍA	DESCUENTOS EFECTUADOS	VALOR PAGADO	No. DOC. CONTABLE	FECHA
Mes 6										
Feb/2022 a Mar/2022 Mes 7	**1922**	**2021**	**$ 54.517.344**	$ 51.136.144	$ 3.381.200	**N/A.**	**$ 4.218.088**	**$ 46.918.056**	**3000290518**	**25/04/2022**
Mar/2022 a Abr/2022	**1922**	**2021**	**$ 3.381.200**	$ 3.381.200	$ 0	**N/A.**	**EN PROCESO**	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**
Mes 8	**10**	**2022**	**$ 1.522.827.529**	$ 139.697.730	$ 1.383.129.799	**N/A.**	**EN PROCESO**	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**	**EN TRÁMITE**

***La cuenta del mes de abril de 2022 ($143.078.930 incluye reserva 2021 y vigencia 2022) a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se muestran el análisis financiero a corte del 30 de abril de 2022 conforme con los Certificados de Registro Presupuestal de los recursos asignados:

Tabla No. 7 Estado del Contrato con corte al 30 de abril 2022

#	ITEMS	VALORES
1	Valor del Contrato	$3.707.370.417
2	Valor Ejecutado	$755.728.285***
3	Saldo por Ejecutar	$2.951.642.132
4	Valor pagado	$612.649.355***
5	Saldo CRP 1922	$0
6	Saldo CRP 10	$1.383.129.799
7	Saldo CRP 21	$1.568.512.333

***La cuenta del mes de abril de 2022 ($143.078.930 incluye reserva 2021 y vigencia 2022) a la fecha están en trámite de verificación y posterior pago, según los procedimientos establecidos en el área financiera de la Secretaría Distrital de Movilidad.

6. CONCLUSIONES

Con corte al 30 de abril de 2022, en el marco del Contrato SDM-2021-2020 se realizó implementación de los componentes vertical y horizontal y suministros, tal como se muestra a continuación:

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
MAR-ABR/2022	EX_17_034_1881_12	Para el presente período se realización implementación de señalización vertical.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
MAR-ABR/2022	EX_03_041_670_11_V3	Para el presente período se realización implementación de señalización vertical.
MAR-ABR/2022	EX_03_078_1881_12_V4	Para el presente período se realización implementación de señalización vertical.
MAR-ABR/2022	EX_03_085_1881_12	Para el presente período se realización implementación de señalización vertical.
MAR-ABR/2022	EX_17_036_1881_12	Para el presente período se realizó señalización horizontal: ZB EP
MAR-ABR/2022	EX_03_076_1881_12	Para el presente periodo se realizó pintura de dispositivos tipo bordillo no traspasable.
MAR-ABR/2022	MV_02_280_941_09	Para el presente período se realización implementación de señalización vertical.
MAR-ABR/2022	EX_02_203_1881_12_V2	Para el presente período se realización implementación de señalización vertical. .
MAR-ABR/2022	EX_02_356_946_10	Para el presente período se realización implementación de señalización vertical.
MAR-ABR/2022	CPS_676_MV_01_04_V2	Para el presente período se realizó señalización horizontal: LP FFZB SPT FDD PP SPT PCP FGD.
MAR-ABR/2022	EX_02_102_1556_10	Para el presente período se realizó señalización horizontal: PCP PSP47APAB SPT PCP1 PE FF FDD FDI EP BA2 LP FGD.
MAR-ABR/2022	EX_02_166_1249_11_V1	Para el presente período se realizó señalización horizontal: ACH BA2BA3 EP FDI FGI LA LE PCP PCP1 PE PPP PSI25 PSP47A PZE SPT TR VMP30.
MAR-ABR/2022	EX_02_195_1881_12_V6	Para el presente período se realizó señalización horizontal: ACH EPFDD FDI FF FGD FGI LA LC LCA LCN LIC LL LP LPA PCC PCP PCP1 PE PP PPARE PSOLO PSP47A PZE RCD RCI SPT TCH TR VMP20 VMP30.
MAR-ABR/2022	EX_02_227_1794_10	Para el presente período se realizó señalización horizontal: EP FFFGD FGI LCM LP PCP PCP1 PSOLO PSP47A PZE SPT VMP30
MAR-ABR/2022	MV_01_033_1560_10	Para el presente Periodo se realizó Instalación de tachas reflectivas.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

PERIODO	UBICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS
MAR-ABR/2022	EX_17_001_1841_17	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: FF FGDFGI LP PAB PE PSOLO, PSP47A PZE SPT PE LP SPT, PSP47A FDD SPT FDG.
MAR-ABR/2022	EX_02_171_1249_11	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: BA2 FFLAL LCM LP SPT VMP30
MAR-ABR/2022	EX_02_240_575_11_V7	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: EP FDDFDG FDI FF FGD FGI LCM LP PCP PCP1 PP PSP47A PZE SPT VMP20 VMP30 ZB
MAR-ABR/2022	EX_02_202_1881_12_V1	Para el presente periodo se realizó señalización horizontal: ACH BA2EP FDD FDI FF FGD LC LCA LP PAB PC PCP PP PSP47A PZE SPT VMP30 ZB.

Fuente: Informe Mensual No. 8 Contrato de Interventoría 2021-2013

Las actividades anteriormente relacionadas, bajo el seguimiento y control a través del contrato de interventoría 2021-2013.

Se continua con inspecciones de zonas escolares y señalización vial integral en las localidades de Candelaria, Santafé y Chapinero.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195
