

## RESUMEN MES DE OCTUBRE DE 2022

### CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2021-1602, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y SKG TECNOLOGÍA S.A.S.

#### 1 INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el resumen de actividades ejecutadas en el marco del contrato 2021-1602, el cual fue suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la firma SKG TECNOLOGIA S.A.S., cuyo objeto corresponde a “SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO”.

En función de las actividades desarrolladas en el presente documento se incluye el resumen del avance de la etapa 2 de operación para el mes de octubre de 2022.

#### 2 OBJETIVO DEL INFORME

Presentar un resumen ejecutivo del avance para el Contrato de Prestación de Servicios 2021-1602 con énfasis en el estado financiero según las vigencias futuras asignadas.

##### Objetivos específicos del Informe

- Sintetizar el avance de los diferentes componentes definidos contractualmente para la etapa 2 de la Solución Tecnológica para la Gestión en Vía de la Autoridad de Tránsito.
- Consolidar los registros del estado financiero del contrato 2021-1602, en lo referente a los recursos asignados como vigencias futuras y su ejecución.

#### 3 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 2021-1602

A continuación, se presentan los datos principales del contrato

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b>     | SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO |
| <b>CONTRATISTA</b> | SKG TECNOLOGÍA S.A.S.                                                   |

| PLAZO DE EJECUCIÓN:   | El plazo de ejecución del contrato es de TREINTA Y TRES (33) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la SDM y la expedición del registro presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |     |                            |      |                  |      |                   |      |                   |       |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|------|------------------|------|-------------------|------|-------------------|-------|-------------------|
|                       | Plazo de Ejecución<br><br>33 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Etapas de Implementación y Transición:</b> Dos (2) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.                        |     |                            |      |                  |      |                   |      |                   |       |                   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Etapas de operación:</b> Treinta y un (31) meses contados a partir de la finalización de la etapa de implementación y transición. |     |                            |      |                  |      |                   |      |                   |       |                   |
| FECHA DE INICIO:      | 22 de abril de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |     |                            |      |                  |      |                   |      |                   |       |                   |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 21 de enero de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |     |                            |      |                  |      |                   |      |                   |       |                   |
| VALOR:                | <p>El valor del presente contrato es por la suma de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$27.441.270.541) M/CTE., suma que incluye IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.</p> <table><tr><th>AÑO</th><th>PRESUPUESTO SEGÚN VIGENCIA</th></tr><tr><td>2021</td><td>\$ 4.756.434.000</td></tr><tr><td>2022</td><td>\$ 11.342.418.270</td></tr><tr><td>2023</td><td>\$ 11.342.418.271</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 27.441.270.541</td></tr></table> |                                                                                                                                      | AÑO | PRESUPUESTO SEGÚN VIGENCIA | 2021 | \$ 4.756.434.000 | 2022 | \$ 11.342.418.270 | 2023 | \$ 11.342.418.271 | TOTAL | \$ 27.441.270.541 |
| AÑO                   | PRESUPUESTO SEGÚN VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |     |                            |      |                  |      |                   |      |                   |       |                   |
| 2021                  | \$ 4.756.434.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |     |                            |      |                  |      |                   |      |                   |       |                   |
| 2022                  | \$ 11.342.418.270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |     |                            |      |                  |      |                   |      |                   |       |                   |
| 2023                  | \$ 11.342.418.271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |     |                            |      |                  |      |                   |      |                   |       |                   |
| TOTAL                 | \$ 27.441.270.541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |     |                            |      |                  |      |                   |      |                   |       |                   |
| VALOR ADICIÓN No. 1   | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |     |                            |      |                  |      |                   |      |                   |       |                   |
| PRORROGA No. 1        | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |     |                            |      |                  |      |                   |      |                   |       |                   |
| SUPERVISOR            | Martha Liliana Sánchez Aparicio (22 de abril a 31 de agosto/2021) –<br>(01 de mayo a 16 de mayo/2022)<br><br>Jaime Alejandro García Muñoz (01 septiembre a 05 de enero/2022)<br><br>Diana Lorena Urrego García (06 enero a 30 de abril/2022)<br><br>Jack David Hurtado Casquete (17 mayo/2022 a la fecha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |     |                            |      |                  |      |                   |      |                   |       |                   |
| INTERENTORÍA          | No Aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |     |                            |      |                  |      |                   |      |                   |       |                   |

Adicionalmente, de acuerdo con lo estipulado en el contrato SKG TECNOLOGIA SAS, constituyó la póliza de cumplimiento No. 128352 y de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 8327, a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, las cuales fueron expedidas por la compañía de seguros SEGUREXPO y las cuales cubren el Contrato No. 2021-1602.

#### 4 ALCANCE DEL CONTRATO 2021-1602

La solución tecnológica debe

- Permitir diligenciar los formularios de comparendos al tránsito e informes únicos de infracciones al transporte, la captura y envío de evidencias fotográficas de la comisión de presuntas infracciones para la imposición de órdenes de comparendo no notificados en vía al sistema de Detección Electrónica de Infracciones -DEI conforme la normatividad vigente,
- Recibir toda la información mencionada anteriormente en un sistema central que permita la gestión remota de los dispositivos en vía y la Integración con los sistemas de información de la Secretaría Distrital de Movilidad según los requerimientos y necesidades.

En este contexto la solución tecnológica debe incluir en términos generales lo siguiente:

- a. **Dispositivos electrónicos:** Dispositivos en calidad de servicio, provistos de software para el diligenciamiento de Órdenes de comparendo al tránsito, Informes únicos de infracciones al transporte y Captura de evidencias para la imposición de órdenes de comparendo no notificadas en vía.

Además, debe realizar consultas automáticas al RUNT, SIMUR, Exceptuados, Sistema de Información del Terminal de Transporte. Debe integrarse mediante webservices con los sistemas de información Contravencional, DEI, Grúas y patios, Aplicativos Centro de Gestión y enviar en línea la información diligenciada en vía al sistema central.

Durante la ejecución del contrato la Secretaría puede requerir nuevas consultas e integraciones a otros sistemas, el profesional de parametrización deberá encargarse de estas actividades.

El dispositivo debe incluir impresora que permita generar la tirilla como copia impresa del registro del proceso de imposición de comparendos. Estos dispositivos se entregarán a la autoridad de tránsito para la gestión en vía.

Dado que el dispositivo electrónico se usará de forma permanente por la autoridad de tránsito en vía se requiere que este cuente con un lápiz táctil y estuche para protección.

- b. **Sistema Central:** Plataforma en calidad de servicio (Software en dispositivos + Software para gestión y administración), deberá permitir el registro y consulta de toda la información generada en vía, la interacción con las diferentes bases de datos y la integración con los sistemas que determine la SDM. La plataforma debe incluir su arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación e interfaz de usuario.


El contratista deberá entregar de forma mensual todos los datos que se encuentran en la base de datos. Así mismo cada seis meses se deberá entregar en medio

magnético, provisto por el contratista, los formularios, imágenes y datos consolidados del semestre.

Los datos del sistema central deben estar disponibles por la vigencia del contrato y seis meses posterior a la finalización de este.

c. **Otros servicios:**

- Equipo de trabajo para desarrollo del proyecto.
- Comunicación móvil para dispositivos electrónicos.
- Soporte técnico 7 x 24.
- Transferencia de conocimiento y capacitación.

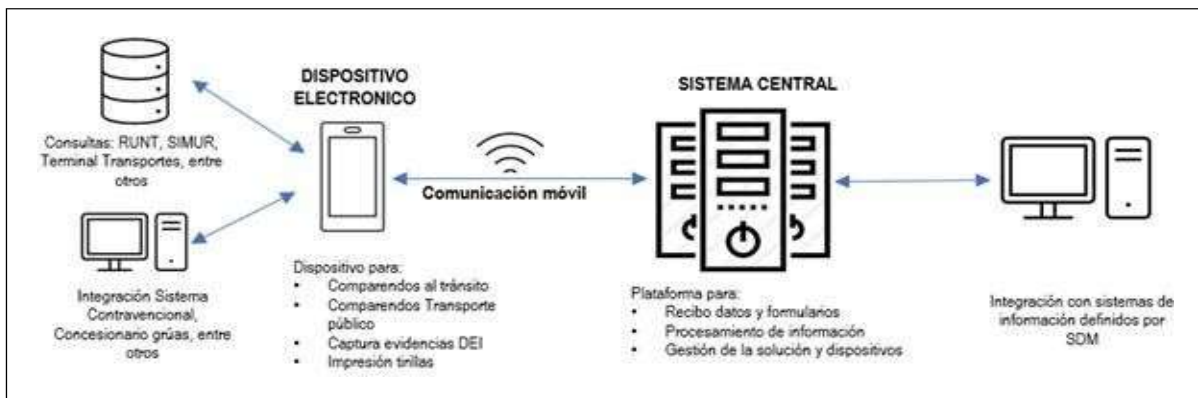

Fuente: elaboración propia

## **ETAPAS DE EJECUCIÓN**

La ejecución del contrato, se subdivide de la siguiente manera:

### **ETAPA 1 - IMPLEMENTACIÓN Y TRANSICIÓN**

Comprende un periodo de dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

En este lapso de tiempo funcionaron en forma paralela los servicios derivados del contrato 2019 – 1280 cuyo objeto es “SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN EN VÍA DE LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO”, y se realizaba el levantamiento de información y desarrollo de la solución tecnológica integral por parte del contrato 2021-1602, el cual fue resultado del proceso de contratación SDM-LP-088-2020. Mantener los dos contratos en ejecución fue esencial para poder garantizar la gestión de control en vía que ejerce la autoridad de tránsito. Dado que mientras con el contrato 2019 - 1280 se garantizaba la operación en vía, con el nuevo contrato (fruto de este proceso de contratación) se implementaba y probaba el funcionamiento futuro.

En este periodo, el contratista 2021-1602 adelantó, en general, las actividades de:

#### **Secretaría Distrital de Movilidad**

Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
www.movilidadbogota.gov.co  
Información: Línea 195

- Levantamiento de información
- Implementación de los requerimientos identificados.
- Integración de la solución tecnológica con los sistemas de información de la entidad.
- Pruebas de operación usando dispositivos electrónicos e Integración de los dispositivos electrónicos con el sistema central
- Pruebas funcionales al sistema central:
- Capacitación previa al inicio de la operación
- Informe mensual

## ETAPA 2 - OPERACIÓN

Comprende un periodo de treinta y un (31) meses, contados a partir de la terminación de la etapa de implementación y transición. En la etapa de operación inicia la aplicación de descuentos por incumplimientos en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) definidos para el contrato.

Durante la ejecución de la etapa de operación se deberá prestar el servicio a través de los siguientes ítems:

### Dispositivos electrónicos

Entrega de dispositivos a la autoridad de tránsito en calidad de servicio para diligenciamiento de Órdenes de comparendos, Informes únicos de infracciones al transporte y captura de evidencias fotográficas para la imposición de comparendos no notificados en vía. El dispositivo debe permitir generar la tirilla como copia impresa del registro del proceso de imposición de Comparendo. Los formularios diligenciados deben ser enviados en línea a la plataforma tecnológica.

### Servicio de comunicación móvil

Los dispositivos electrónicos deben contar con un servicio de comunicación móvil 7x24, con cobertura en toda la ciudad, tecnología 3G / 4G o la tecnología más reciente que esté disponible, la disponibilidad mínima esperada del servicio de comunicaciones es de 99.6%

### Sistema Central

El sistema debe recibir toda la información de los dispositivos electrónicos e integrarse con los sistemas de información de la Secretaría, se debe haber entregado a la Secretaría por parte del contratista los derechos de uso por el plazo del contrato. La plataforma debe entrar en operación cumpliendo los acuerdos de niveles de servicio establecidos, estando disponible el 99.9% del tiempo al mes.

### Consultas al RUNT

### Servicio de soporte

- Mesa de ayuda
- Mantenimientos preventivos
- Mantenimientos correctivos

Servicio de transferencia de conocimiento y capacitación

Equipo de trabajo

Reuniones de seguimiento

Informes mensuales

## 5 AVANCE DEL CONTRATO 2021-1602

De conformidad con lo requerido por la Entidad, en el periodo del informe se desarrollaron las siguientes actividades, propias del contrato:

### 5.1 ESTADO DE INFORMES DE ACTIVIDADES

A la fecha de elaboración del presente documento el contratista SKG TECNOLOGIA SAS ha presentado los siguientes informes:

| INFORME PACTADO                                 | PERIODO DEL INFORME                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 1 – ETAPA 1  | 22 DE ABRIL A 21 DE MAYO DE 2021                       |
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 2 – ETAPA 1  | 22 DE MAYO A 21 DE JUNIO DE 2021                       |
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 3 – ETAPA 2  | 22 DE JUNIO A 21 DE JULIO DE 2021                      |
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 4 – ETAPA 2  | 22 DE JULIO A 21 DE AGOSTO DE 2021                     |
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 5 – ETAPA 2  | 22 DE AGOSTO A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021                |
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 6 – ETAPA 2  | 22 DE SEPTIEMBRE A 21 DE OCTUBRE DE 2021               |
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 7 – ETAPA 2  | 22 DE OCTUBRE A 21 DE NOVIEMBRE DE 2021                |
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 8 – ETAPA 2  | 22 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 <sup>1</sup> |
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 9 – ETAPA 2  | 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2022                      |
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 10 – ETAPA 2 | 01 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2022                  |
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 11 – ETAPA 2 | 01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2022                      |
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 12 – ETAPA 2 | 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2022                      |
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 13 – ETAPA 2 | 01 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2022                        |
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 14 – ETAPA 2 | 01 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2022                      |
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 15 – ETAPA 2 | 01 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2022                      |
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 16 – ETAPA 2 | 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2022                    |
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 17 – ETAPA 2 | 01 DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022            |
| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO. 18 – ETAPA 2 | 01 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2022                  |

<sup>1</sup> Con la finalidad de ajustar el periodo en el que se desarrollan los informes y el seguimiento del contrato a los cortes y seguimientos de la entidad, el informe N°8 se ha ajustado hasta el día 31 de diciembre de 2022 (10 días más para este periodo), sin que esto implique ninguna modificación al desarrollo del contrato.

## 5.2 ESTADO EJECUCIÓN ACTIVIDADES

De acuerdo con el seguimiento de actividades y sus respectivos registros, cuya meta final es ejecutar la etapa 2 de la solución tecnológica para gestión en vía de la autoridad de tránsito, a la fecha el avance de las actividades ejecutadas, discriminado según requisitos técnicos generales, condiciones de los dispositivos, componentes del software de dispositivo, sistema central y conectividad, es el siguiente:

### Equipo de trabajo mínimo

Durante el período se contó con la participación del personal mínimo establecido para la etapa de operación.

### Estado de las Integraciones.

A continuación, se resume el estado de las integraciones al finalizar el catorceavo mes de ejecución contractual de la etapa 2, es decir, hasta el 31 de octubre de 2022:

| INTEGRACIÓN           | AVANCE                                                                       | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUNT                  | 100%                                                                         | Se realizan consultas desde las PDA de acuerdo con la necesidad de cada formulario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PLATAFORMA CPIT - DEI | 100% en desarrollo<br>50% en funcionalidad                                   | El reporte a la plataforma se realiza consolidando la ubicación de los agentes de tránsito en el CPIT (visualización de ubicación y número de PDA activas) Esta funcionalidad no está en operación, la entidad se encuentra realizando un análisis procedimental y técnico para la ejecución de la actividad de captura y envío de evidencias fotográficas de comisión de presuntas infracciones para la imposición de órdenes de comparendo no notificados en vía al sistema de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) de acuerdo con la normatividad vigente |
| SICON                 | 100% en desarrollo<br>100% en funcionalidad                                  | Las funcionales de esta integración se encuentran en operación, reportándose algunos errores en la recepción de la información de algunos formularios. Se continúan adelantando medidas correctivas para el cargue oportuno, así como, órdenes de comparendo duplicadas, y el correcto uso de los rangos asignados y que este se refleje en SICON.                                                                                                                                                                                                                  |
| SIMUR                 | 100% en desarrollo<br>0% en funcionalidad                                    | Esta funcionalidad no está en operación, la entidad se encuentra realizando un análisis procedimental y técnico para la ejecución de la actividad de captura y envío de evidencias fotográficas de comisión de presuntas infracciones para la imposición de órdenes de comparendo no notificados en vía al sistema de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) de acuerdo con la normatividad vigente.                                                                                                                                                           |
| APLICATIVO DE GRUAS   | 100% funcionalidad de solicitud APP<br>50% en funcionalidad entrada a patios | En el periodo se realizaron ajustes en la funcionalidad para optimizar el servicio de grúas, de esta manera, se está consumiendo el servicio de georreferenciación desde el servicio web de IDECA.<br>Por otra parte, se ajustó el servicio de entrada a patios respecto al último catalogo remitido por DATATOOLS, se encuentran pendientes las pruebas en el servicio de producción y salida a producción se considera pertinente.                                                                                                                                |

| INTEGRACIÓN                         | AVANCE | OBSERVACIONES                      |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|
| TERMINAL DE TRANSPORTE              | 100%   | URL verificada y en funcionamiento |
| MOBILITY                            | 100%   | URL verificada y en funcionamiento |
| BASE DE EXCEPTUADOS                 | 100%   | URL verificada y en funcionamiento |
| ANTECEDENTES DE LA POLICIA NACIONAL | 100%   | URL verificada y en funcionamiento |

### Dispositivo electrónico, software del dispositivo y sistema central

El servicio y operación de la solución tecnológica, en el mes del presente informe, se realizó a través del sistema central desarrollado por el contratista 2021-1602 y con uso de los dispositivos S60 BLOVEDREAM. Previo a la asignación de cada dispositivo electrónico, se realiza la respectiva capacitación en el uso del software y durante el funcionamiento del mismo se ha contado con el servicio de apoyo a través de mesa de ayuda.

Con corte al 31 de octubre de 2022 se han capacitado 712 agentes de tránsito y transporte adscritos a la seccional de tránsito y transporte (SETRA) de la Policía Nacional y 162 agentes civiles de tránsito y transporte (ACTT).

En cuanto a la asignación de las PDA, se asignaron 600 dispositivos electrónicos S60 para uso en vía a funcionarios de la SETRA, sin embargo, en el proceso de operación fueron devueltos 11 dispositivos que se encuentran pendientes por asignar a la fecha de corte del presente informe, para el caso de los agentes civiles, fueron asignados 150 dispositivos electrónicos S60, no obstante, a la fecha del presente informe han sido devueltos 1 dispositivos que se encuentran pendientes de ser asignados.

Este periodo se desarrolló y se desplegó la versión 4.3.9 del software del dispositivo de control, entre las mejoras implementadas en esta versión se tienen la confirmación de número de documento y placa del vehículo, así como los ajustes en los servicios de solicitud de grúas y entrada a patios, así como otras mejoras en el software.

De igual manera, en este periodo se continuó con el seguimiento a los procedimientos de imposición de OCN, IUIT y consultas al RUNT, a partir del análisis de lo anterior se establecieron acciones de mejora a posibles patrones no adecuados o con variaciones particulares, resultado de lo cual, se realizaron capacitaciones con los agentes civiles con énfasis en recomendaciones en uso, manejo de los equipos y el correcto desarrollo de los procedimientos en vía. Igualmente, se iniciaron los cambios de contraseñas de los agentes de tránsito buscando reforzar las medidas de seguridad informática en el uso de los dispositivos.

También, se debe señalar que en este periodo se continua con el ajuste en el desarrollo para la implementación en producción del aplicativo para la solicitud de grúas y el ingreso de los vehículos a patios y se continua con el monitoreo periódico de las funcionalidades.

## 6 CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Se realizaron dos capacitaciones durante el mes y periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 2022. Cada capacitación dura un poco más de 2 horas por sesión.

## 7 ESTADO FINANCIERO

Del valor total del Contrato No. 2021-1602, en la presente sección se realiza el balance financiero del contrato, con corte al 31 de octubre de 2022.

- Con respecto a los pagos en el periodo, una vez cumplidos todos los requisitos, se tramitó ante la Subdirección Financiera el pago para el período 1 al 3 de septiembre de 2022.
- Y para el periodo del 01 de octubre al 31 de octubre se realiza la consolidación de los registros para adelantar la verificación de la documentación respectiva y posterior trámite de pago ante la misma subdirección.

En la Tabla a continuación se resume el estado de los pagos realizados.

**Tabla. Pagos efectuados**

| CONCEPTO                  | PERIODO                                       | PROCESO PAGO | VALOR EJECUTADO          |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Corte N° 1                | Del 22 abril al 21 de mayo de 2021            | Cancelado    | \$ 73.389.856            |
| Corte N° 2                | Del 22 mayo al 21 de junio de 2021            | Cancelado    | \$ 75.851.661            |
| Corte N° 3                | Del 22 junio al 21 de julio de 2021           | Cancelado    | \$ 427.828.801           |
| Corte N° 4                | Del 22 julio al 21 de agosto de 2021          | Cancelado    | \$ 641.040.600           |
| Corte N° 5                | Del 22 agosto al 21 de septiembre de 2021     | Cancelado    | \$ 666.504.423           |
| Corte N° 6                | Del 22 septiembre al 21 de octubre de 2021    | Cancelado    | \$ 665.464.189           |
| Corte N° 7                | Del 22 de octubre al 21 de noviembre 2021     | Cancelado    | \$ 677.930.642           |
| Corte N° 8                | Del 22 de noviembre al 31 de diciembre 2021   | Cancelado    | \$ 904.497.321           |
| Corte N° 9                | Del 01 enero al 31 de enero de 2022           | Cancelado    | \$ 751.050.512           |
| Corte N° 10               | Del 01 de febrero al 28 de febrero 2022       | Cancelado    | \$ 731.121.445           |
| Corte N° 11               | Del 01 de marzo al 31 de marzo 2022           | Cancelado    | \$ 749.919.359           |
| Corte N° 12               | Del 01 de abril al 30 de abril 2022           | Cancelado    | \$ 740.407.751           |
| Corte N° 13               | Del 01 de mayo al 31 de mayo 2022             | Cancelado    | \$ 799.266.890           |
| Corte N° 14               | Del 01 de junio al 30 de junio 2022           | Cancelado    | \$ 816.828.502           |
| Corte N° 15               | Del 01 de julio al 31 de julio 2022           | Cancelado    | \$ 825.425.439           |
| Corte N° 16               | Del 01 de agosto al 31 de agosto 2022         | Cancelado    | \$ 943.859.453           |
| Corte N° 17               | Del 01 de septiembre al 30 de septiembre 2022 | Cancelado    | \$ 1.138.231.307         |
| Corte N° 18               | Del 01 de octubre al 30 de octubre 2022       | En tramite   | \$ 1.139.855.036         |
| <b>Pagos Autorizados</b>  |                                               |              | <b>\$ 12.768.473.187</b> |
| <b>Valor Contrato</b>     |                                               |              | <b>\$ 27.441.270.541</b> |
| <b>Saldo por Ejecutar</b> |                                               |              | <b>\$ 14.672.797.354</b> |

De conformidad con la ejecución presupuestal del contrato el Balance Financiero de la ejecución es el siguiente:

**ESTADO PRESUPUESTAL**

| concepto                         | valor             |
|----------------------------------|-------------------|
| Valor Del Contrato – Año 2021    | \$ 4.756.434.000  |
| Valor Del Contrato – Año 2022    | \$ 11.342.418.270 |
| Valor Del Contrato – Año 2023    | \$ 11.342.418.271 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A)     | \$ 27.441.270.541 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO (B) 1      | \$ 12.768.473.187 |
| VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS (C) | \$ 10.490.386.844 |
| SALDO (S = A- C)                 | \$ 16.950.883.697 |

Nota: <sup>1</sup> Se encuentra pendiente de pago el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de octubre de 2022.

## 8 CONCLUSIONES

Al finalizar el mes de octubre de 2022, se avanza de manera efectiva la ejecución al contrato, de igual manera, se continua con el perfeccionamiento de la solución tecnológica, haciendo énfasis en los aspectos técnicos identificados, resultado de la cual se realizó el despliegue de la versión 4.3.9 del software del dispositivo.

Durante el periodo objeto del presente documento, se brindaron todos los servicios de acuerdo con lo consignado en el presente documento, el contratista ha prestado soporte técnico para adelantar las acciones de ajuste o estabilización de la operación que se han requerido.

Con corte al mes de octubre de 2022 se ha ejecutado el 100% del valor contratado para el año 2021 y se ha ejecutado un 70.64% de los recursos previstos para la vigencia 2022.
